
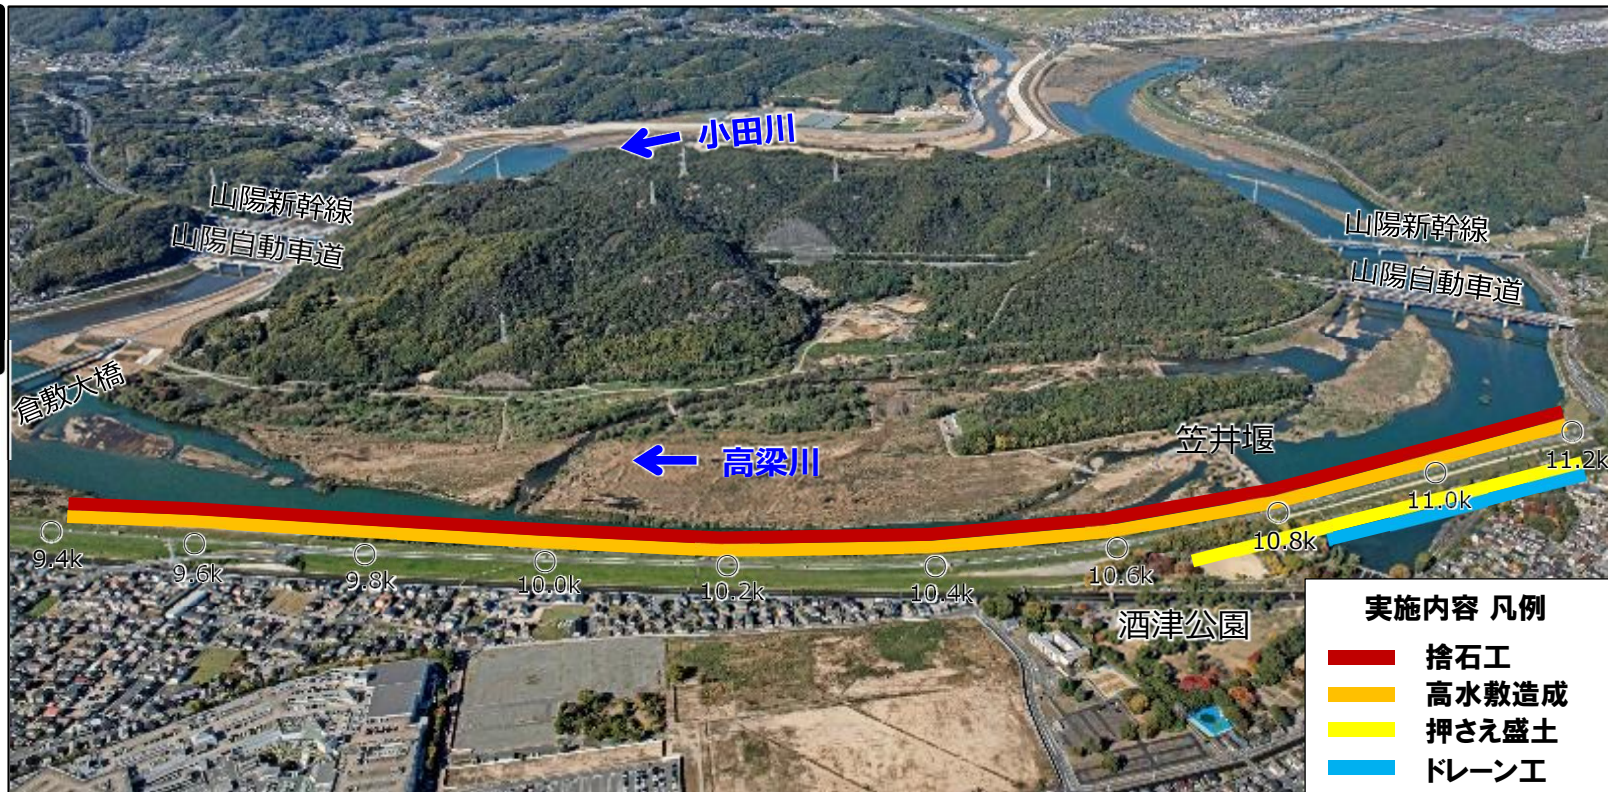


倉敷市街地の安全・安心、文化を次世代に繋ぐ 酒津地区堤防強化・笠井堰改築事業 進捗状況

令和8年3月末現在 進捗率

侵食対策(捨石工)	33%
(高水敷造成)	0%
浸透対策(押さえ盛土)	100%
(ドレーン工)	36%
笠井堰部分改築	設計中

実施内容イメージ図

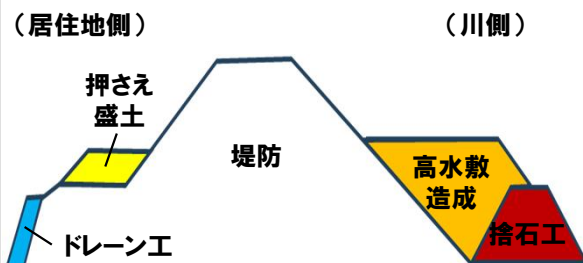

実施内容 凡例

- 捨石工
- 高水敷造成
- 押さえ盛土
- ドレーン工

実施内容			進捗状況 (完成・工事中 /計画)	進捗率	(距離標)									
					9.4k	9.6k	9.8k	10.0k	10.2k	10.4k	10.6k	10.8k	11.0k	11.2k
堤防強化	侵食対策 (川側)	捨石工	620m/ 1,900m	33%	[Progress bar showing stone placement work from 9.4k to 11.2k]									
		高水敷造成	0m/ 1,900m	0%	[Progress bar showing high water table construction from 9.4k to 11.2k]									
	浸透対策 (居住地側)	押さえ盛土	580m/580m	100%	[Progress bar showing retaining fill work from 9.4k to 11.2k, with '対策不要区間' (no countermeasure required area) from 9.4k to 10.8k]									
		ドレーン工	180m/500m	36%	[Progress bar showing drainage work from 9.4k to 11.2k, with '対策不要区間' (no countermeasure required area) from 9.4k to 10.8k]									
笠井堰部分改築			設計中											

※工事中は、工事契約した内容を基に計上しています(繰越、国債含む)
※延長や進捗率は、今後の精査等により変更する場合があります

凡例 ■ 完成 ■ 工事中(準備中含む) ■ 未施工

倉敷市街地の安全・安心、文化を次世代に繋ぐ 酒津地区堤防強化・笠井堰改築事業 進捗状況

侵食対策(上流側)



侵食対策(下流側)



浸透対策

