

# 広島県内の自治体からの要請に対応した道路啓開・河川土砂撤去等の取組み状況

平成30年8月7日 8:00現在

## ⑨ 坂町坂西：河川土砂撤去支援



### ⑨ 坂町坂西 内容：土砂撤去支援

|      |  |
|------|--|
| 位置   | 総頭川（そうずがわ）                                   |
| 着手   | 7月26日  |
| 進捗状況 | 72%  |
| 作業内容 | 土砂撤去   |
| その他  | 土砂撤去 L=600m<br>作業時間：8:00～18:00<br>20:00～5:00 |

## ④ 東広島市高屋町：道路啓開支援



### ④ 東広島市高屋町 内容：道路啓開支援

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 位置   | 市道 檢山小谷線                      |
| 着手   | 7月23日                         |
| 進捗状況 | 75%                           |
| 作業内容 | 土砂撤去                          |
| その他  | 全体延長L=450m<br>作業時間：7:00～18:00 |

## ⑧ 福山市郷分町：道路啓開支援



### ⑧ 福山市郷分町 内容：道路啓開支援

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 位置   | 市道 郷分30号線                 |
| 着手   | 7月26日～8月2日                |
| 進捗状況 | 100%                      |
| 作業内容 | 排水路整備                     |
| その他  | L=120m<br>作業時間：8:00～17:00 |

## ① 坂町小屋浦：全体マネジメント 道路啓開支援



### ① 坂町小屋浦 内容：道路啓開支援 全体マネジメント

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 位置   | 坂町小屋浦（町道）                       |
| 着手   | 7月20日                           |
| 進捗状況 | 81%                             |
| 作業内容 | 土砂撤去、全体マネジメント                   |
| その他  | 全体延長L=1,200m<br>作業時間：6:30～19:00 |

## ⑦ 呉市天応町：河川土砂撤去支援



### ⑦ 呉市天応町 内容：土砂撤去支援

|      |  |
|------|--|
| 位置   | 背戸川（せとのかわ）                                       |
| 着手   | 7月23日  |
| 進捗状況 | 38%  |
| 作業内容 | 進入路啓開・土砂撤去                                       |
| その他  | 土砂撤去 L=600m<br>(進入路啓開 L=350m)<br>作業時間：8:00～17:00 |

## ② 呉市川尻町：道路啓開支援



### ② 呉市川尻町 内容：道路啓開支援

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 位置   | 市道 川尻本線1号線                    |
| 着手   | 7月24日～7月28日                   |
| 進捗状況 | 100%                          |
| 作業内容 | 路面正整、安全施設設置                   |
| その他  | 全体延長L=280m<br>作業時間：8:00～17:00 |

## ③ 呉市安浦町：道路啓開支援



### ③ 呉市安浦町 内容：道路啓開支援

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 位置   | 市道 中畑下垣内線                     |
| 着手   | 7月21日～7月24日                   |
| 進捗状況 | 100%                          |
| 作業内容 | 土砂撤去                          |
| その他  | 全体延長L=200m<br>作業時間：8:00～17:00 |

## ⑤ 三原市木原町：道路啓開支援



### ⑤ 三原市木原町 内容：道路啓開支援


|      |                           |
|------|---------------------------|
| 位置   | 市道 木原29号線                 |
| 着手   | 7月20日～7月31日               |
| 進捗状況 | 100%                      |
| 作業内容 | 大型土嚢設置                    |
| その他  | L=300m<br>作業時間：8:00～17:00 |

## ⑥ 尾道市美ノ郷町：土工用防護柵設置支援



### ⑥ 尾道市美ノ郷町 内容：道路啓開支援

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 位置   | 市道 美ノ郷公園線                 |
| 着手   | 7月23日                     |
| 進捗状況 | 72%                       |
| 作業内容 | 土工用防護柵設置                  |
| その他  | L=138m<br>作業時間：8:00～17:00 |

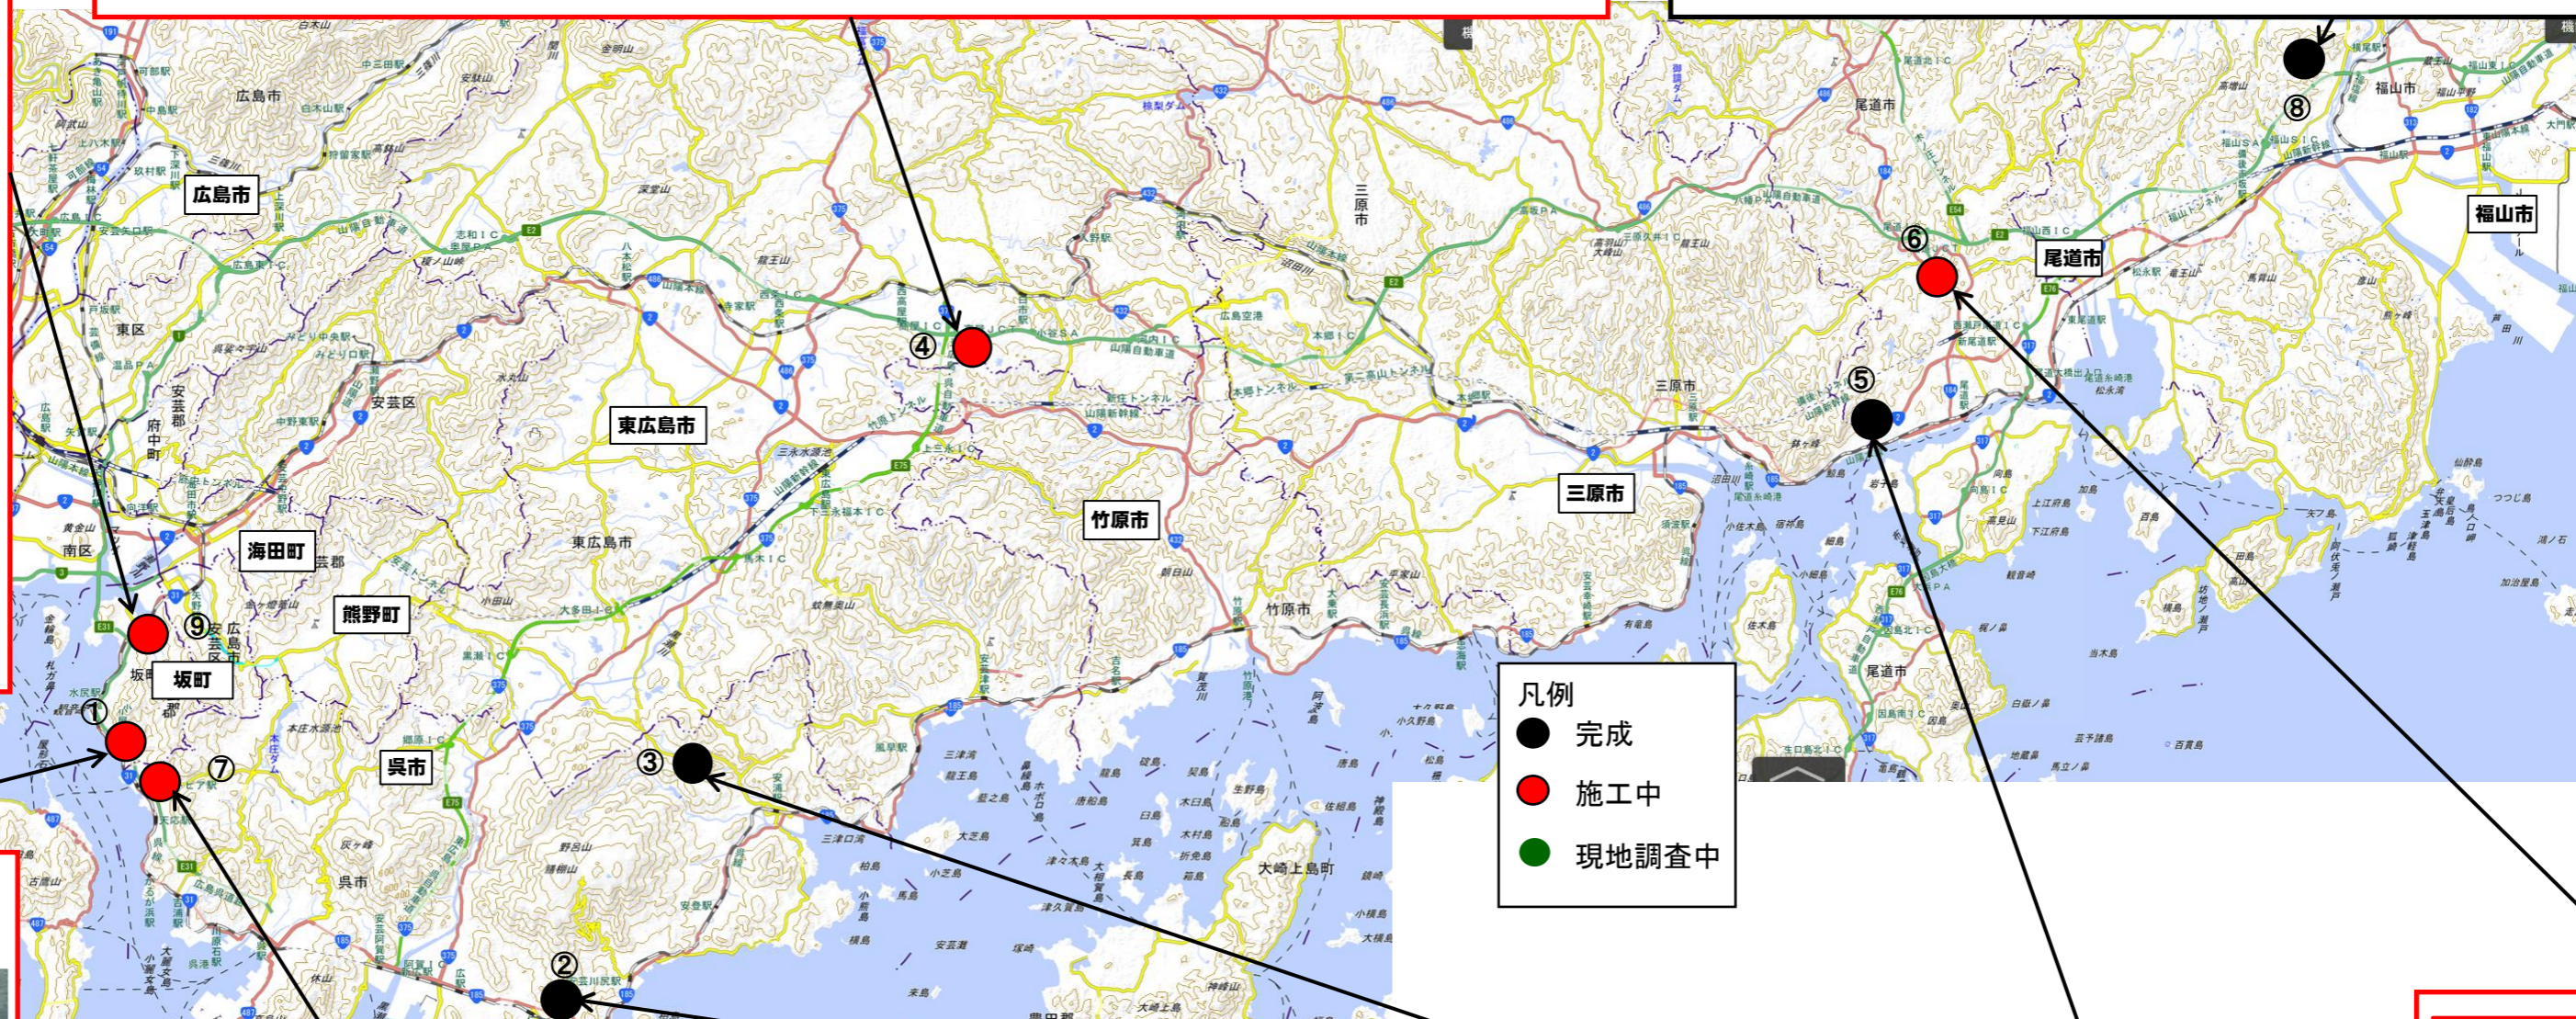

凡例  
● 完成  
● 施工中  
● 現地調査中
