

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年10月29日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤施設の整備が完了しました。



砂防堰堤全景（下流側より）



砂防堰堤全景（上流側より）

特定緊急砂防事業実施状況


令和3年9月30日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

管理用道路の施工を進めています。



砂防堰堤全景（下流側より）

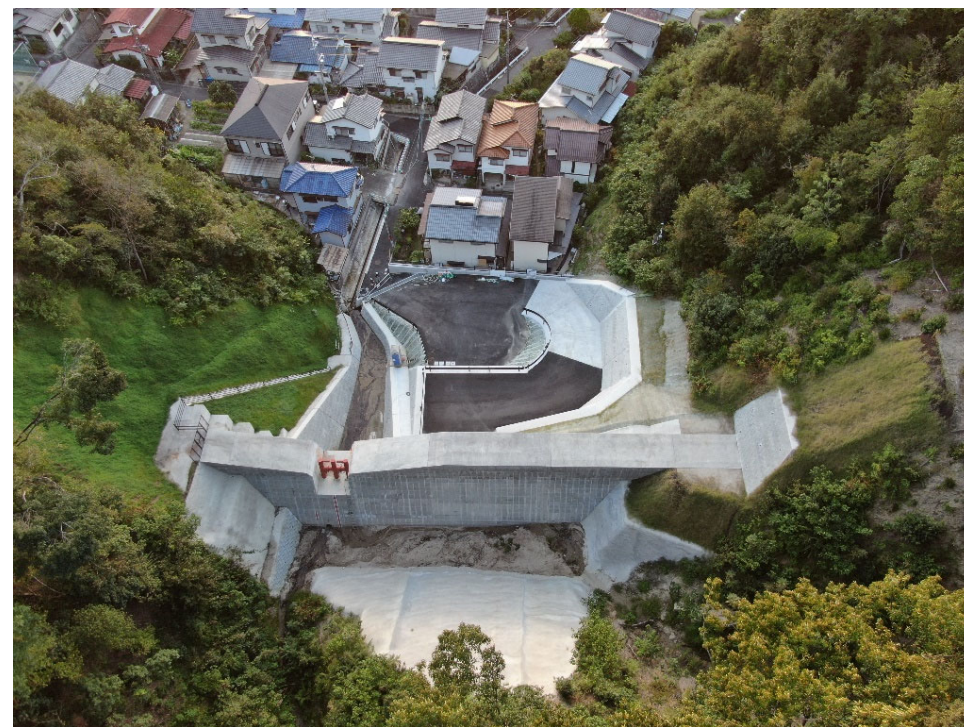

砂防堰堤全景（上流側より）

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年8月31日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

管理用道路の施工を進めています。



砂防堰堤全景（下流側より）



砂防堰堤全景（上流側より）

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年8月4日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

管理用道路の施工を進めています。



砂防堰堤全景



管理用道路施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年6月21日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

管理用道路の施工を進めています。



砂防堰堤全景



管理用道路施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年4月27日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

前庭保護工及び管理用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年3月17日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

前庭保護工及び砂防堰堤法面部の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年2月24日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

前庭保護工及び砂防堰堤法面部の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年2月9日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

前庭保護工及び砂防堰堤左岸側法面部の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年12月18日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

前庭保護工及び砂防堰堤左岸側法面部の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年11月10日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

前庭保護工及び砂防堰堤左岸側法面部の施工を進めています。



掘削作業状況①



掘削作業状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年8月4日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

梅雨前線の影響により7月は断続的な大雨となりましたが、堆砂などの影響はありませんでした。
今後、付帯設備（前庭保護工など）の施工を予定しています。



現地状況（下流側より）



現地状況（右岸側より）

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年6月22日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体の埋め戻しなどを進めています。



施工状況（下流側より）



施工状況（右岸側より）

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年6月3日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体の埋め戻しなどを進めています。



埋め戻し施工状況（下流側）



埋め戻し施工状況（右岸側）

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年5月11日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を完了しました。
引き続き埋め戻しなどを進めていきます。

位置図



下流右岸側より



(上流側)

右岸側より

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年4月15日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月31日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月26日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月3日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月20日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月3日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年1月10日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月18日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

掘削作業を完了し、砂防堰堤本体（右岸側）からコンクリート打設を開始しました。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月11日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事のための掘削作業を進めています。



砂防堰堤の掘削状況①



砂防堰堤の掘削状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月18日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事のための掘削作業を進めています。



砂防堰堤の右岸掘削状況



砂防堰堤の左岸掘削状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月28日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事のための掘削作業を進めています。



砂防堰堤の掘削状況



土砂搬出状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月2日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事のための掘削作業を実施しています。



砂防堰堤の掘削状況①



砂防堰堤の掘削状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年8月7日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事のための樹木伐採が完了しました。
引き続き、掘削作業に向けた準備を進めています。



伐採木搬出状況



伐採完了

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年7月29日現在

道路拡幅を行ったことにより建設機械の搬入が可能となったため、砂防堰堤工事のための樹木伐採に着手しました。

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)



道路拡幅状況



伐採実施状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年7月9日現在

砂防工事を行うため道路の拡幅工事を進めています。

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

