


# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年11月30日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

堰堤本体、前庭保護工が完成しました。

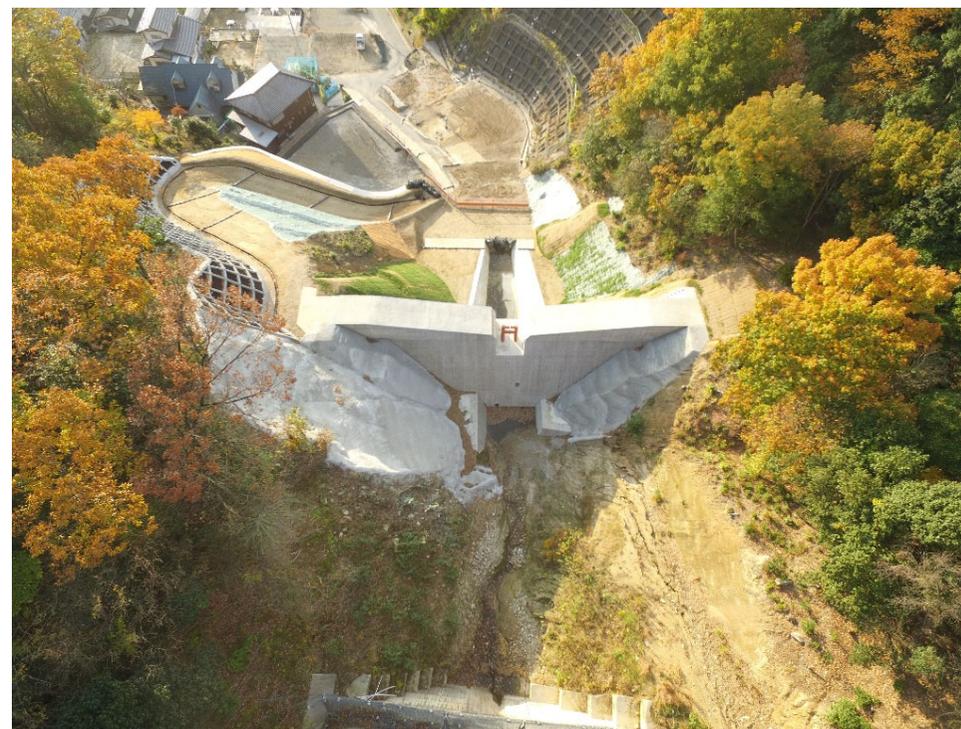


砂防堰堤全景

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年10月29日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

管理用道路の施工を進めています。

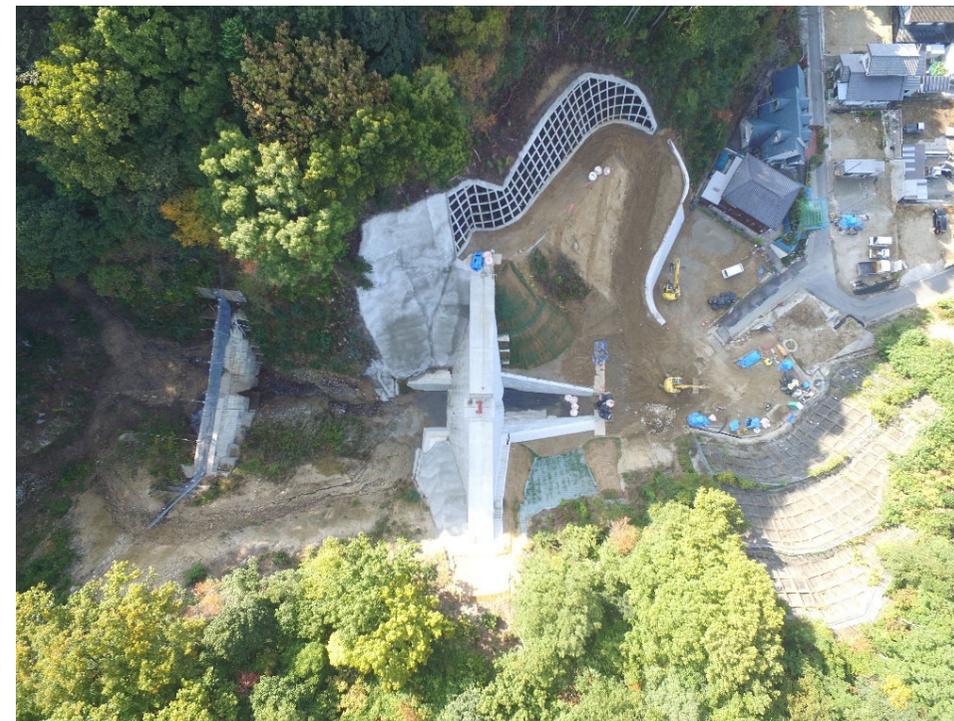

砂防堰堤全景

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年9月30日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

管理用道路の施工を進めています。



# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年8月31日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

管理用道路の施工を進めています。



砂防堰堤全景（下流側より）



砂防堰堤全景（上流側より）

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年8月4日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

前庭保護工・階段工の施工を進めています。



砂防堰堤全景



前庭保護工・階段工施工状況

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年6月21日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

前庭保護工・階段工の施工を進めています。



砂防堰堤全景



前庭保護工・階段工施工状況

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年4月27日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

前庭保護工の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年3月17日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

前庭保護工及び砂防堰堤法面部の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和3年2月24日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

前庭保護工及び砂防堰堤法面部の施工を進めています。



施工状況①




施工状況②

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和2年8月4日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

梅雨前線の影響により7月は断続的な大雨となりましたが、堆砂などの影響はありませんでした。今後、付帯設備（前庭保護工など）の施工を予定しています。

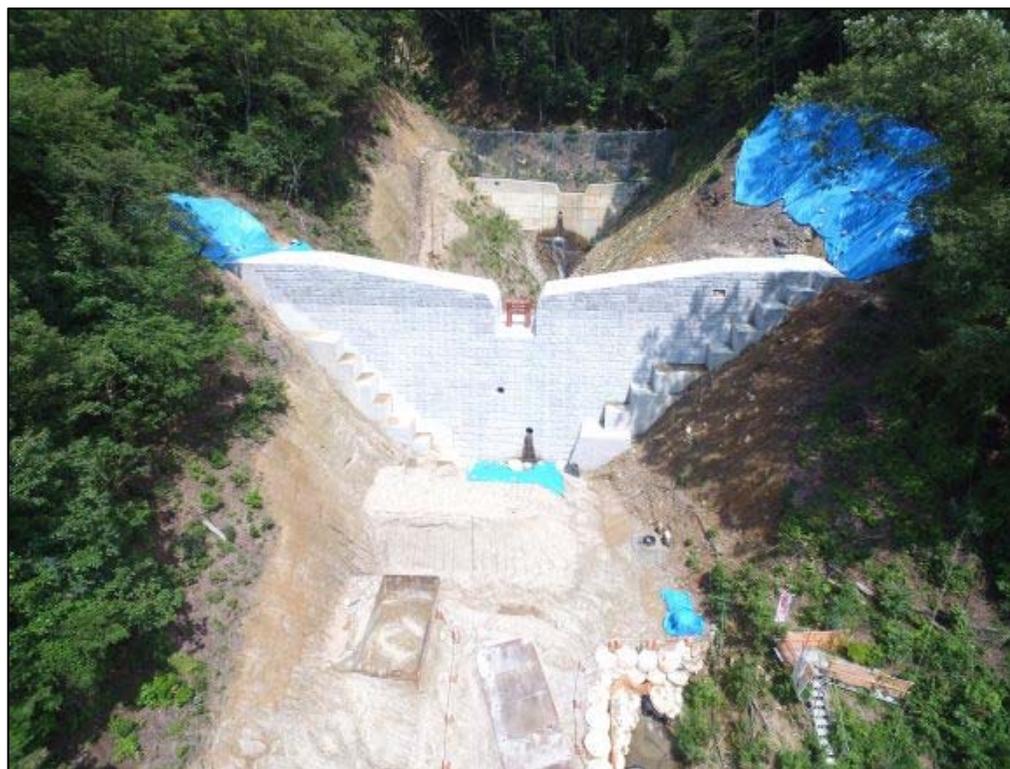

現地状況（下流側より）



現地状況（左岸上流側より）

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和2年6月22日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体の上流側の埋め戻しを行いました。  
今後、付帯設備（前庭保護工など）の施工を予定しています。



現地状況（下流側より）



現地状況（左岸上流側より）

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和2年6月3日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体の埋め戻しなどを進めています。



埋め戻し施工状況（下流側）



埋め戻し施工状況（左岸側）

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和2年5月11日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体の埋め戻しなどを進めています。



下流側より



左岸上流側より

# 特定緊急砂防事業実施状況


令和2年4月15日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を完了しました。引き続き埋め戻しなどを進めていきます。



下流左岸より(本堤)

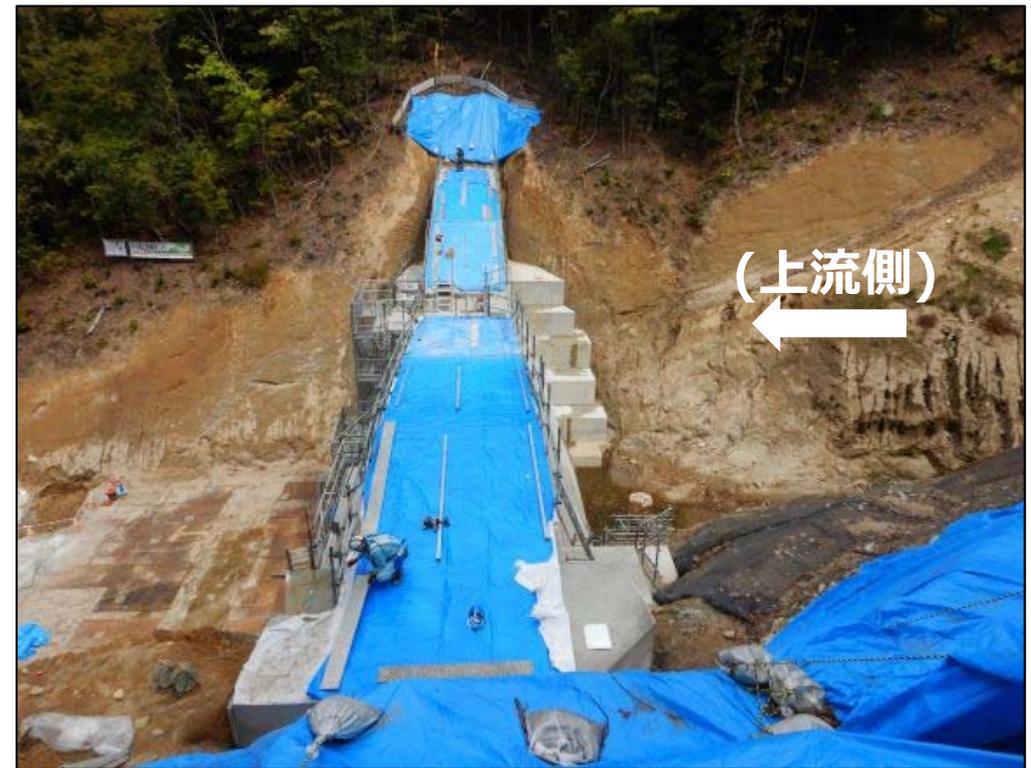

左岸より (養生状況)

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月31日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月26日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月3日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月20日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月3日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年1月10日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月9日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月15日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

掘削作業を完了し、  
砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月28日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

掘削作業を完了し、  
砂防堰堤本体のコンクリート打設の準備をしています。



施工状況①



施工状況②





砂防堰堤工事のための樹木伐採を実施しています。

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)



樹木伐採状況①



樹木伐採状況②

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年7月29日現在

砂防堰堤工事のための作業ヤード整備に着手しました。

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)



作業ヤード整備状況①



作業ヤード整備状況②

工事に先立ち現地状況を把握するための測量を行いました。

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

