

■復旧作業状況 (9/10 17:00時点)





【施工状況】

- 現在、計測機械設置し、山の変位を観測中（継続）
なお、依然として変位は継続している状態
- 9月9日時点 : 1.9mm/日 ※9/ 9 0時~9/10 0時 累計値
- 過去最大 (8/23) : 331.3mm/日 ※8/23 0時~8/24 0時 累計値
- 荷重軽減のための頭部排土作業継続中
- 地すべり線を確認するためのボーリング調査を実施中
- その他、法面対策等を実施中

9月10日
13:00時点 空撮

【施工完了】

- 進入路整備 : 8/21~8/22
- 大型土のう : 8/24~8/30 計612袋
- 水抜きボーリング : 8/20~9/2 5箇所 計16本
- 抑止矢板 : 8/20~9/7 L=28m

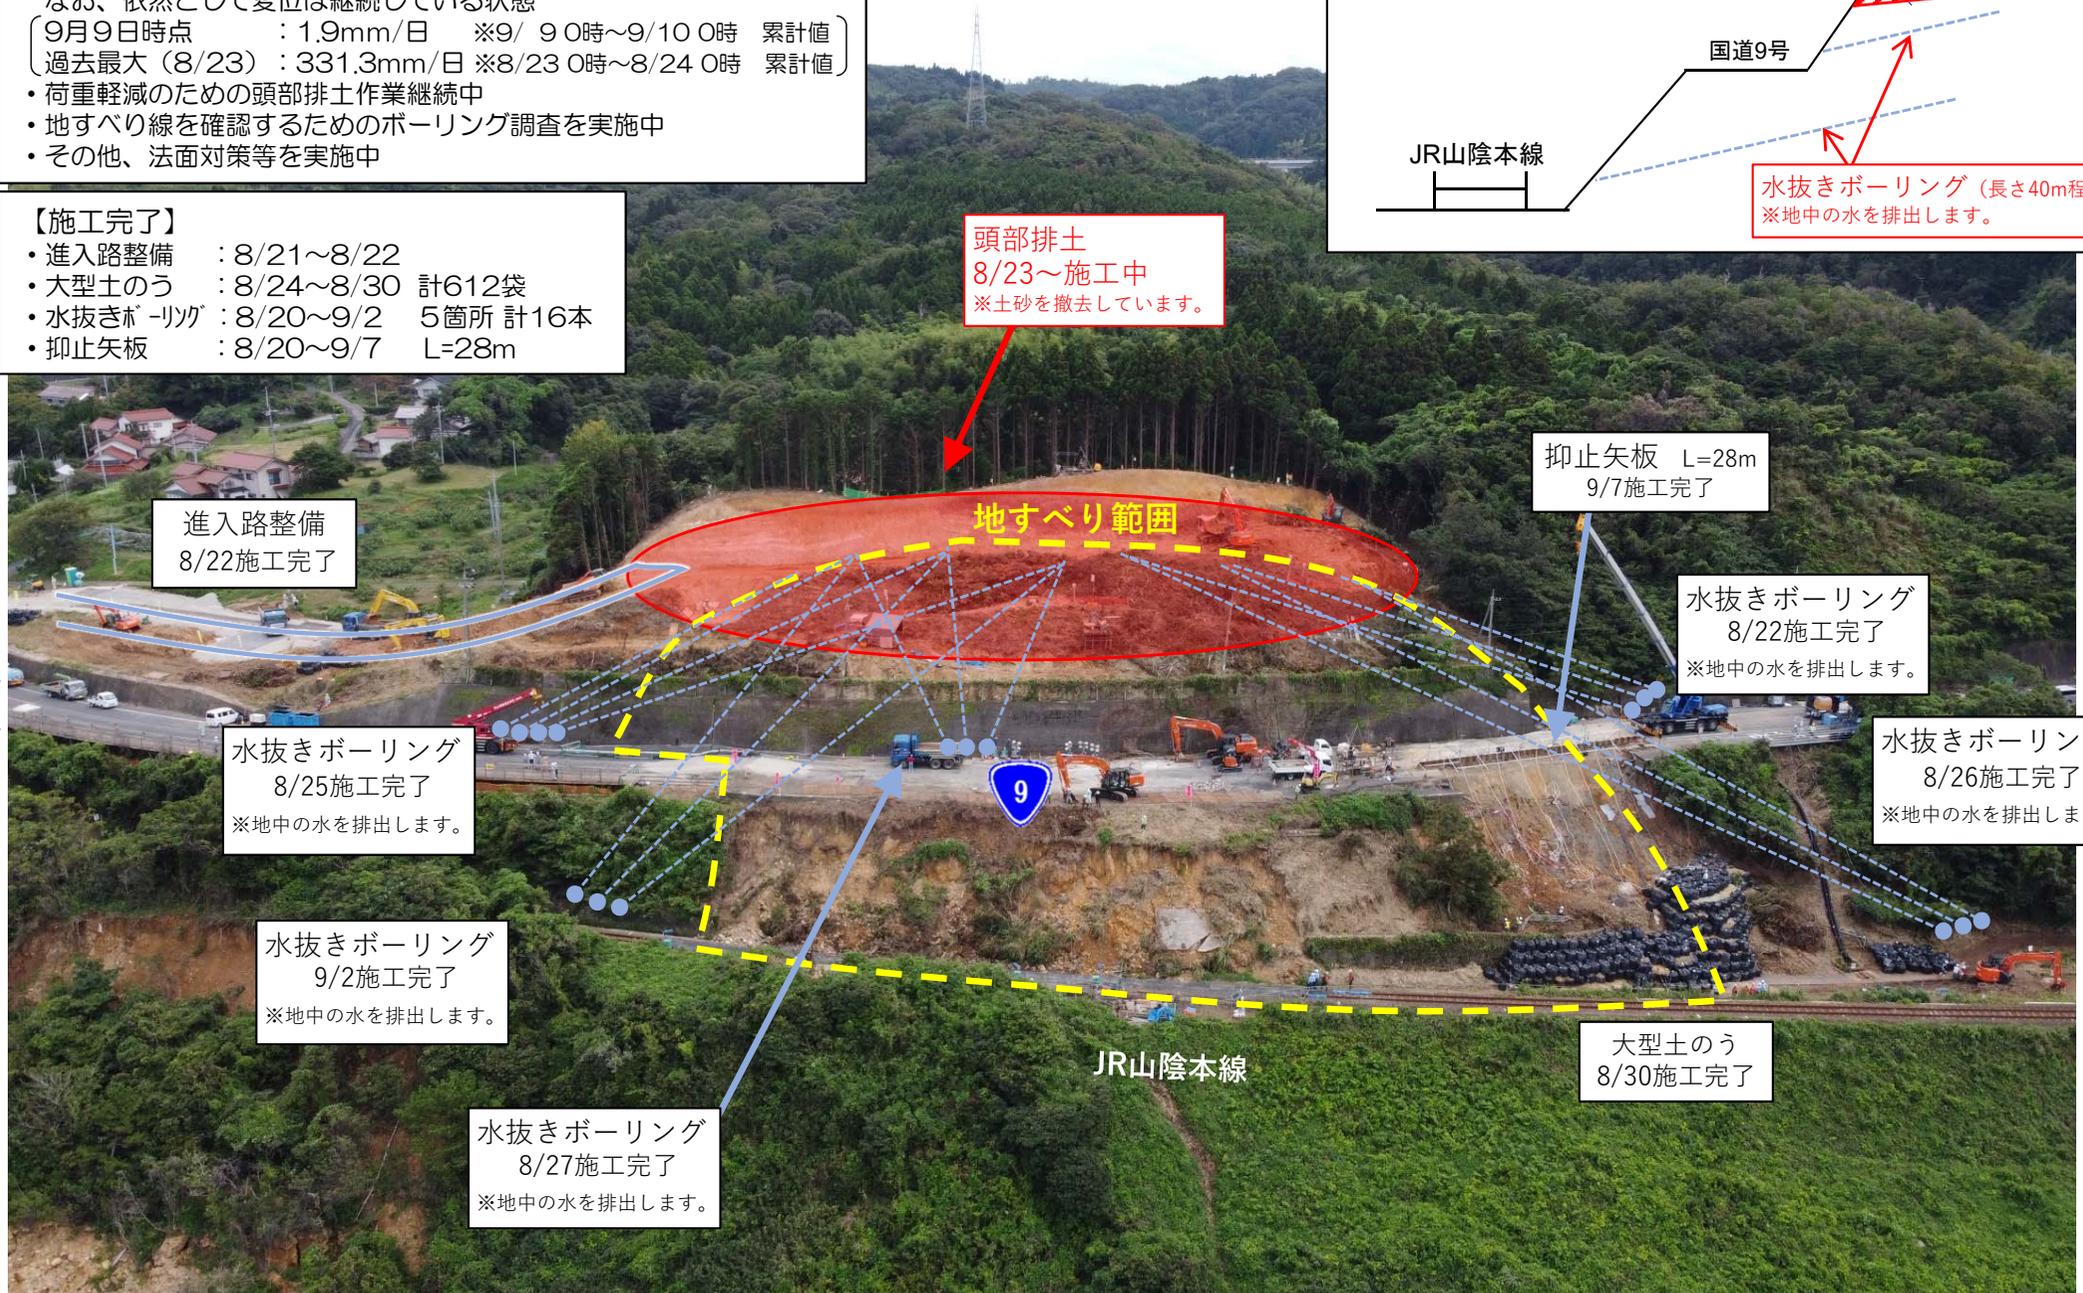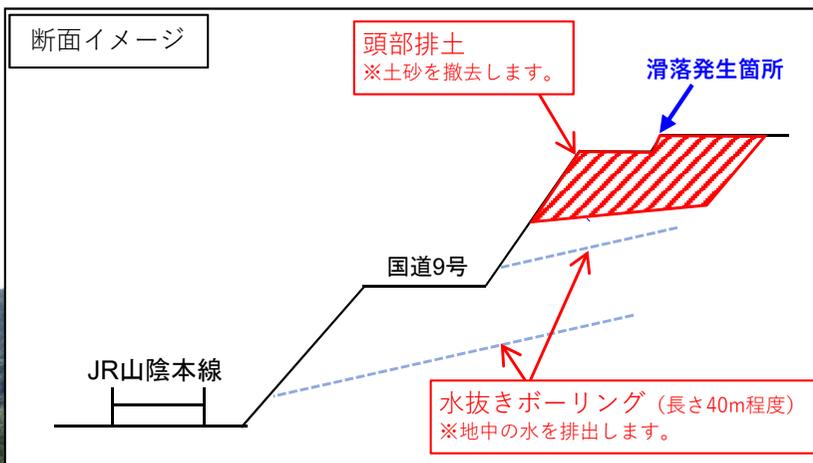

至松江

至浜田

■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況（起点側）

8/21 8:00時点



9/10 13:00時点



■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況（終点側）

