

■復旧作業状況（10/5 13:00時点）

【施工状況】



- ・現在、計測機械を設置し、山の変位を観測中（継続）
- 〔 10月4日時点 ： 0.01mm/日 ※10/4 13時～10/5 13時 累計値 〕
- 〔 過去最大（8/29）：331.3mm/日 ※8/23 0時～8/24 0時 累計値 〕
- ・防護柵設置中 L=136m
- ・仮設歩道設置中

【施工完了】

- ・進入路整備 ： 8/21～8/22
- ・大型土のう ： 8/24～8/30 計612袋
- ・水抜きボーリング ： 8/20～9/29 計25本
- ・抑止矢板 ： 8/20～9/7 L=28m
- ・モルタル吹付 ： 9/10～9/21
- ・頭部排土 ： 8/23～9/24
- ・鉄筋挿入 ： 9/21～9/29 計70本
- ・法面処理 ： 9/28～10/3



断面イメージ

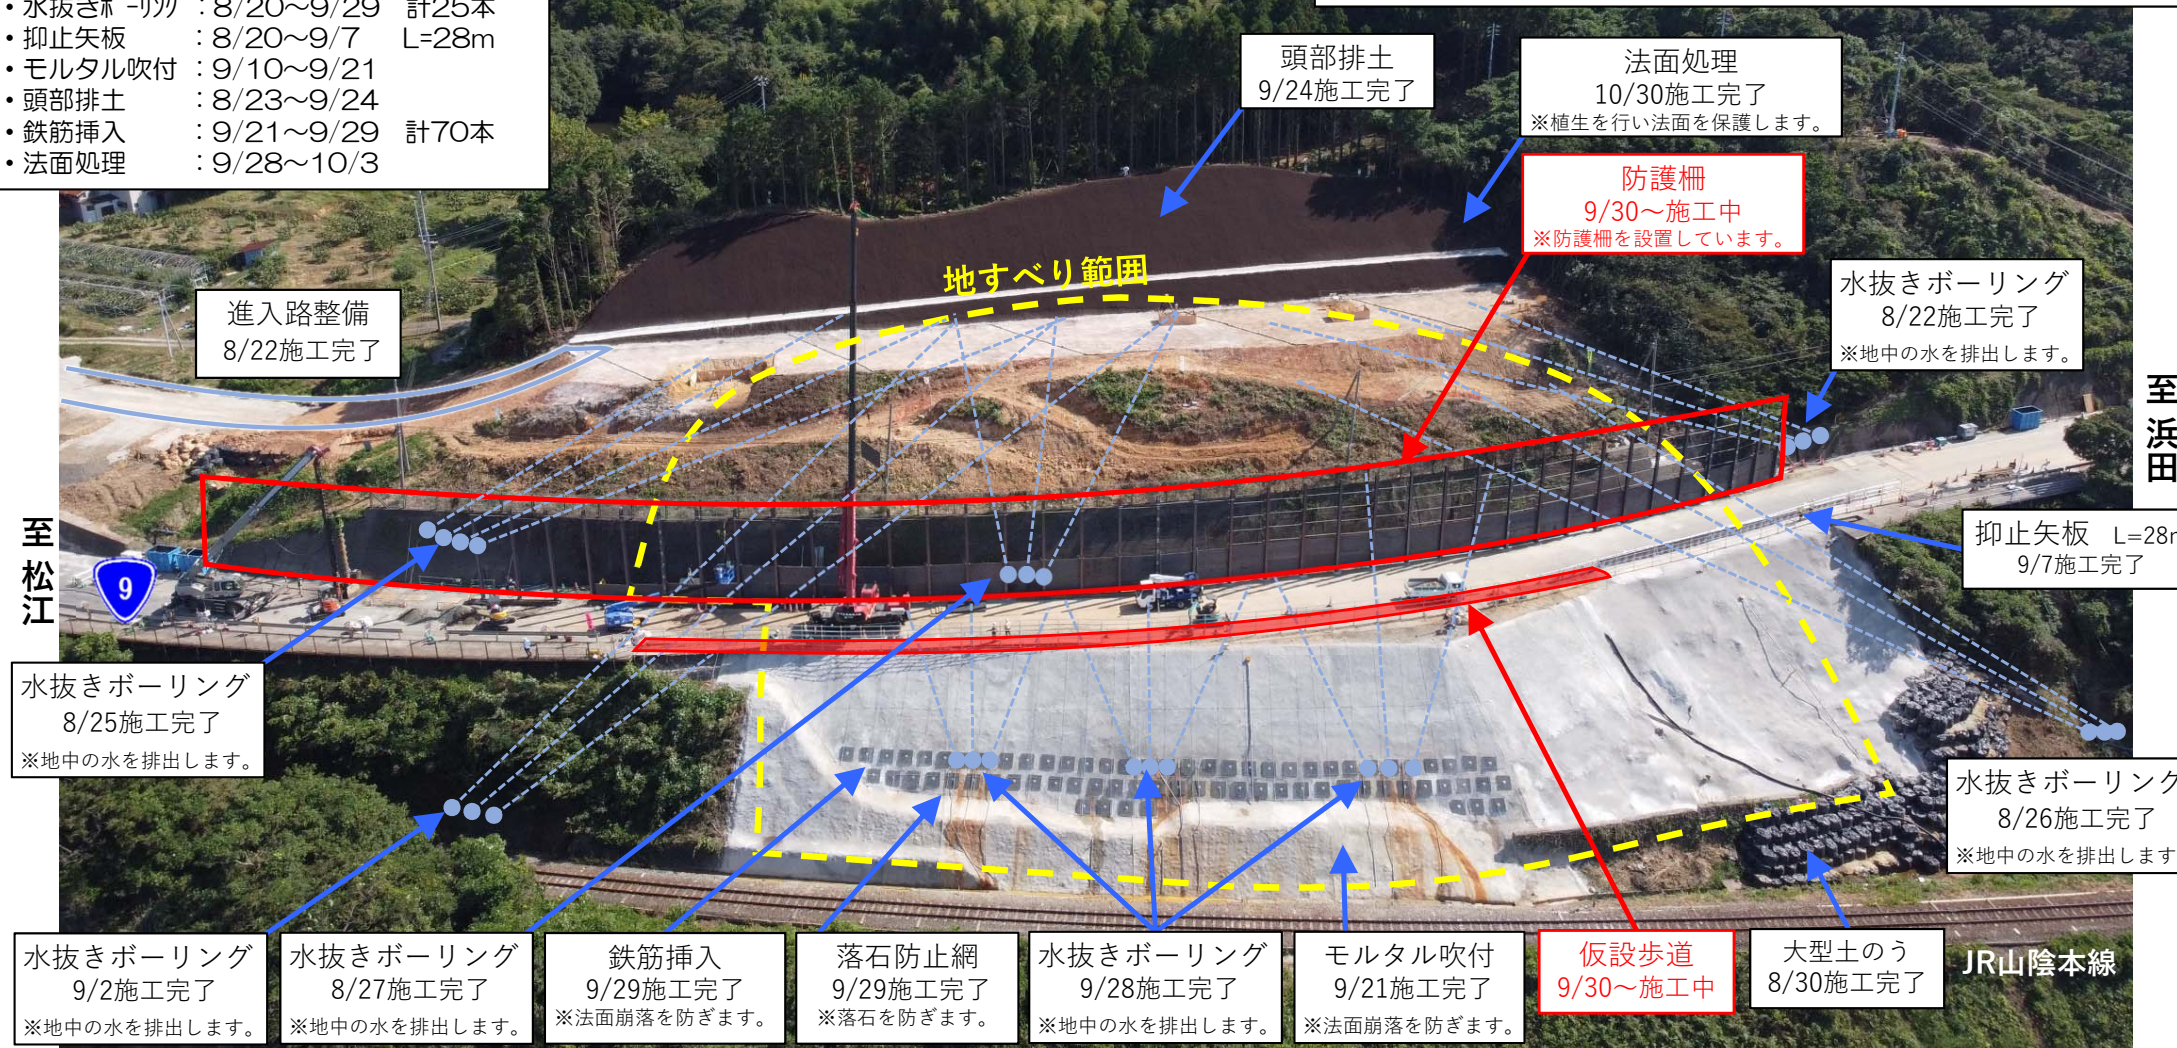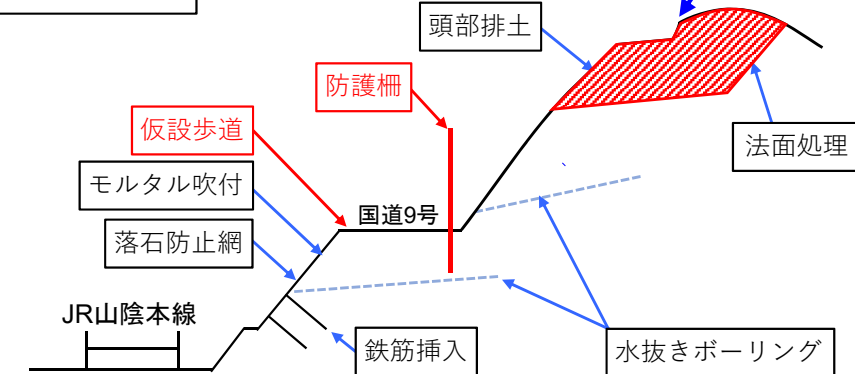

至浜田

至松江

JR山陰本線

■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況（起点側）

8/21 8:00時点



10/5 13:00時点



■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況（終点側）

