

■復旧作業状況 (10/12 17:00時点)



【施工状況】

- 現在、計測機械を設置し、山の変位を観測中（継続）
- 10月12日時点 : 0.01mm/日 ※10/11 12時～10/12 12時 累計値
- 過去最大 (8/29) : 331.3mm/日 ※8/23 0時～8/24 0時 累計値
- 区画線、安全施設等整備中
- 仮設歩道設置中

10月12日 13:30 撮影

【施工完了】

- 進入路整備 : 8/21～8/22
- 大型土のう : 8/24～8/30 計612袋
- 水抜きボーリング : 8/20～9/29 計25本
- 抑止矢板 : 8/20～9/7 L=28m
- モルタル吹付 : 9/10～9/21
- 頭部排土 : 8/23～9/24
- 鉄筋挿入 : 9/21～9/29 計70本
- 転落防止柵 : 9/30～10/2
- 法面処理 : 9/28～10/3
- 防護柵設置中 : 9/30～10/8 L=136m
- 舗装復旧 : 10/11

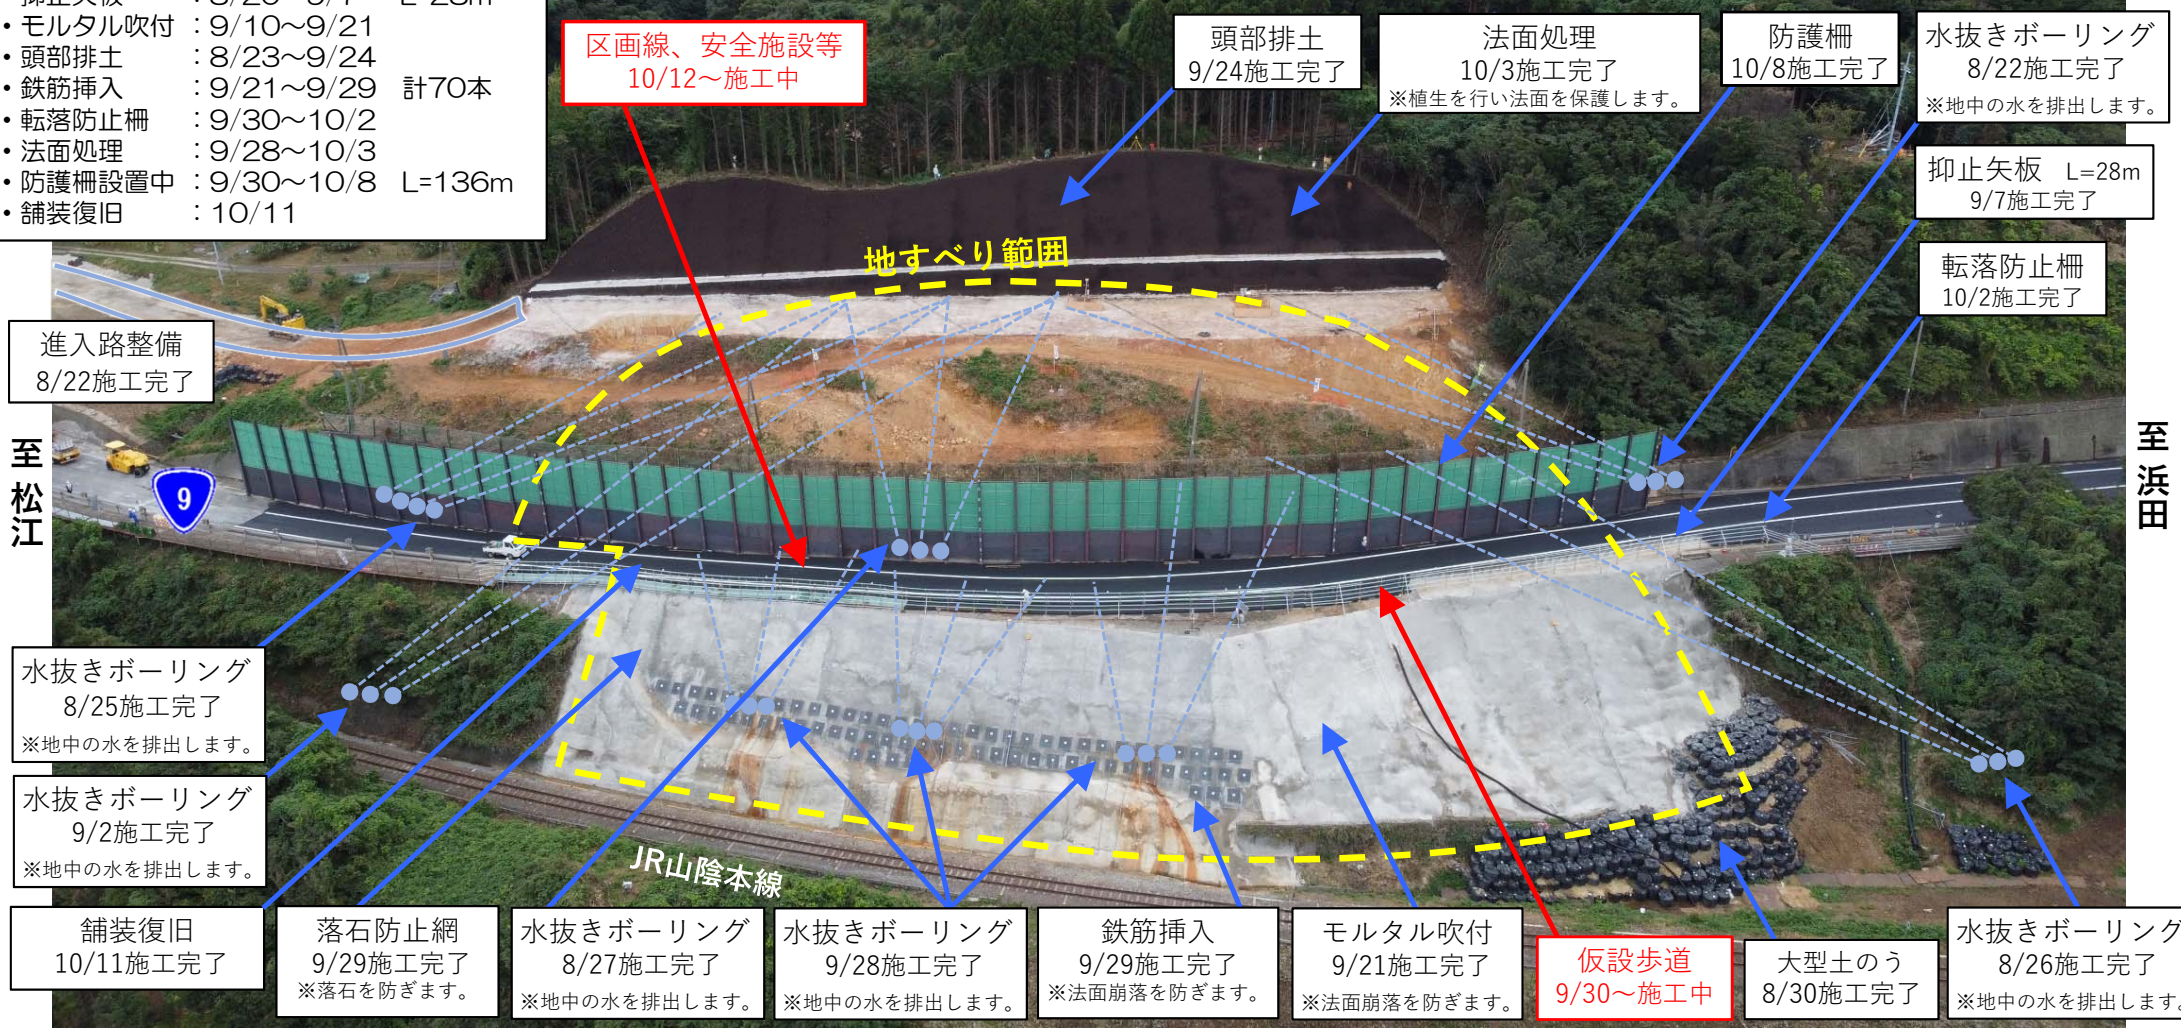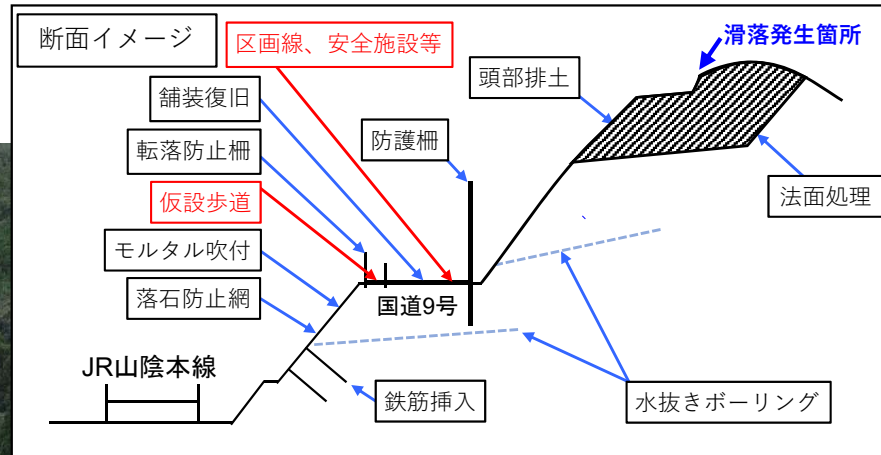

■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況（起点側）

8/21 8:00時点



■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況（終点側）

