

# ■本復旧工事状況 (5/13 13:00時点)

R4.5.11撮影

赤文字：工事実施中  
緑文字：工事完了又は概成  
青文字：今後の工事予定

集水井 N=1基  
4/22～ 工事開始  
5/13現在 進捗率10%

至 松江

頭部排土+掘削 (全体V=12,000m<sup>3</sup>)  
1/18～ 工事開始  
3/28 V=12,000m<sup>3</sup>  
頭部排土+掘削 (完了)

グラウンドアンカー N=58本  
3/28～ 工事開始  
5/13現在 進捗率10%

擁壁撤去 V=500m<sup>3</sup>  
1/18～ 工事開始  
3/28 V=500m<sup>3</sup>擁壁撤去 (完了)


横ボーリング N=12本

JR山陰本線

グラウンドアンカー N=52本

至 浜田

A-A断面

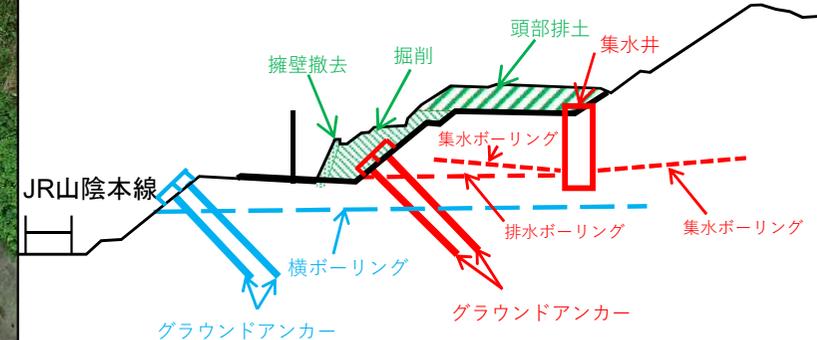

# ■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況

●本復旧工事着手前

12/22 13:00時点



●本復旧工事施工状況

5/13 13:00時点

