

■本復旧工事状況 (10/18 時点)

R4.10.14撮影

赤文字：工事実施中
緑文字：工事完了又は概成

集水井 N=1基
4/22～ 工事開始
7/7 N=1基 (完了)

横ボーリング N=12本
10/5～ 工事開始
10/18時点 進捗率 約90%

JR山陰本線

至 松江

頭部排土+掘削 (全体V=12,000m³)
1/18～ 工事開始
3/28 V=12,000m³
頭部排土+掘削 (完了)

グラウンドアンカー N=58本
3/28～ 工事開始
6/13 全数施工 (完了)

擁壁撤去 V=500m³
1/18～ 工事開始
3/28 V=500m³擁壁撤去 (完了)


グラウンドアンカー N=52本
6/14～ 工事開始
9/30 全数施工 (完了)

歩道・車道等
復旧

資材搬入用
モノレール

至 浜田

A-A断面

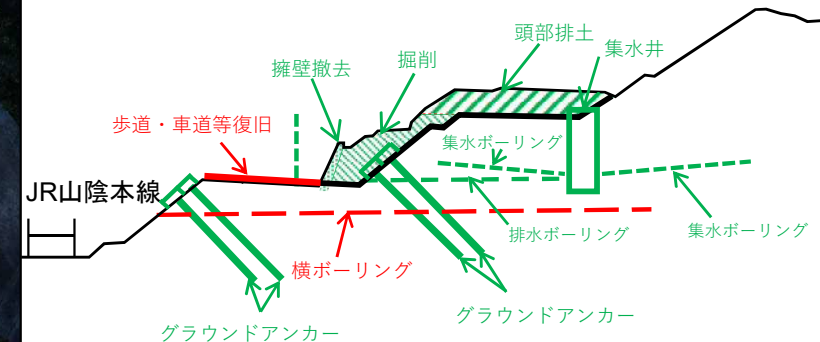

■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況


●本復旧工事着手前

12/22 13:00時点



●本復旧工事施工状況

10/18 13:00時点

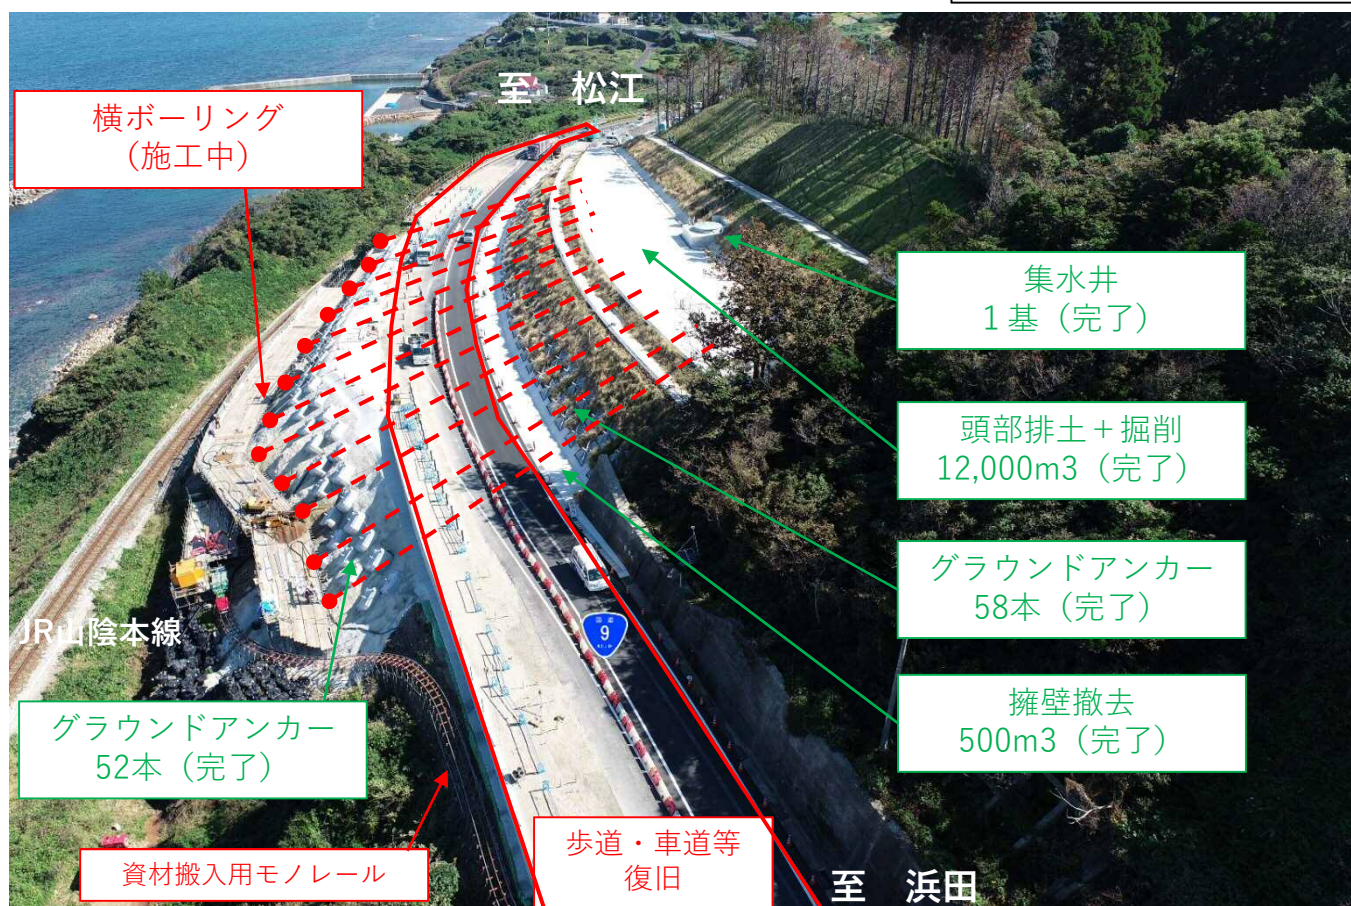

■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況

●本復旧工事施工状況

10/18 13:00時点

