

## お知らせ

記者発表資料  
配布日時

平成30年7月11日(水)  
9:00

■同時発表先:

合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

### 【災害対策情報】

国管理河川 太田川水系 根谷川右岸 4k200付近  
三篠川右岸4k200付近および5k600付近の  
堤防の**緊急対策（侵食対策）の進捗状況【第5報】**

平成30年7月6日～7日に発生した根谷川、三篠川の堤防の  
侵食箇所（上記3箇所）において、太田川河川事務所が実施中の  
**『緊急対策工事』の進捗状況（7月11日（水） 9時現在）**につ  
いてお知らせします。

なお、緊急対策の完了は、現時点で7月16日を予定しています。  
緊急対策工事の概要は別紙を参照してください。

#### 【問い合わせ先】

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所

TEL (082) - 222-9245 (災害対策支部直通)

副所長(河川) おおくぼ まさ ひこ  
大久保 雅 彦



### <対策工事の時系列>

7月6日(金)	22:00	現地で対策工事に着手
7月7日(土)	09:00	対策工事を継続して実施中 袋詰め玉石 38個投入(8:00時点)
7月8日(日)	09:00	対策工事を継続して実施中 袋詰め玉石 175個投入済(8:00時点)
7月9日(月)	10:00	対策工事を継続して実施中
7月10日(火)	9:00	仮設工事を実施中
7月11日(水)	9:00	仮設工事を実施中 大型土のう 190個設置(8:00時点)



国土を整え、全力で備える


国土交通省  
中国地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism  
Chugoku Regional Development Bureau

## 現地対策写真



## 対策工法図面

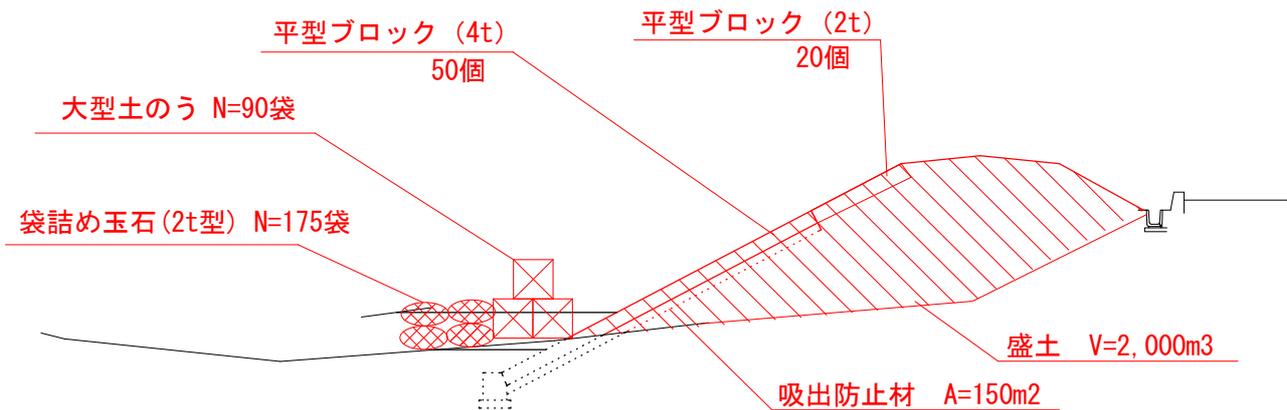



### < 対策工事の時系列 >


7月8日（日）	6：00	現地で対策工事に着手
7月9日（月）	10：00	対策工事を継続して実施中 大型土のう 67個設置済（9：00時点）
7月10日（火）	9：00	対策工事を継続して実施中 袋詰め玉石 10袋製作 方塊ブロック 6個設置（9：00時点）
7月11日（水）	9：00	対策工事を継続して実施中 袋詰め玉石 55袋製作 方塊ブロック 88個設置 築堤盛土 200m <sup>3</sup> （8：00時点）

## 現地対策写真

太田川水系三篠川右岸 4k200 付近（広島市安佐北区上深川地先）




## 対策工法図面

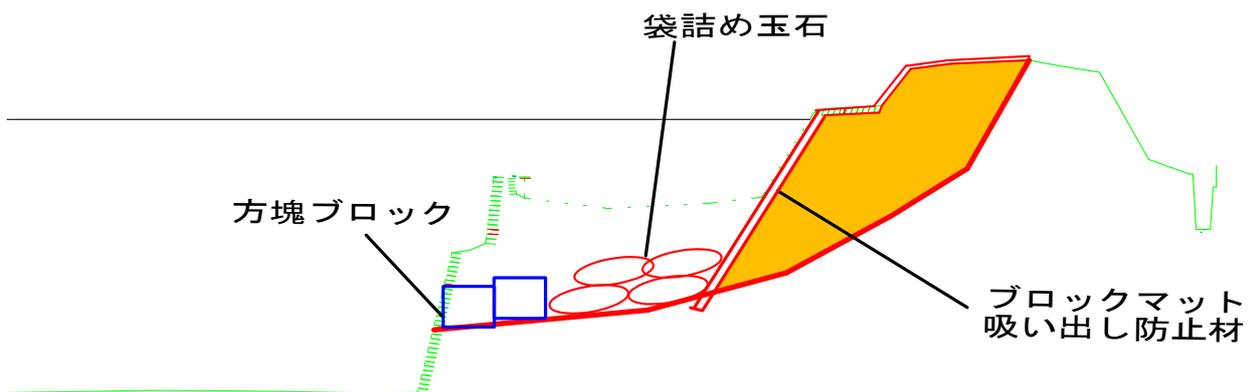

## 【位置図】

太田川水系三篠川右岸 5k600 付近（広島市安佐北区上深川地先）

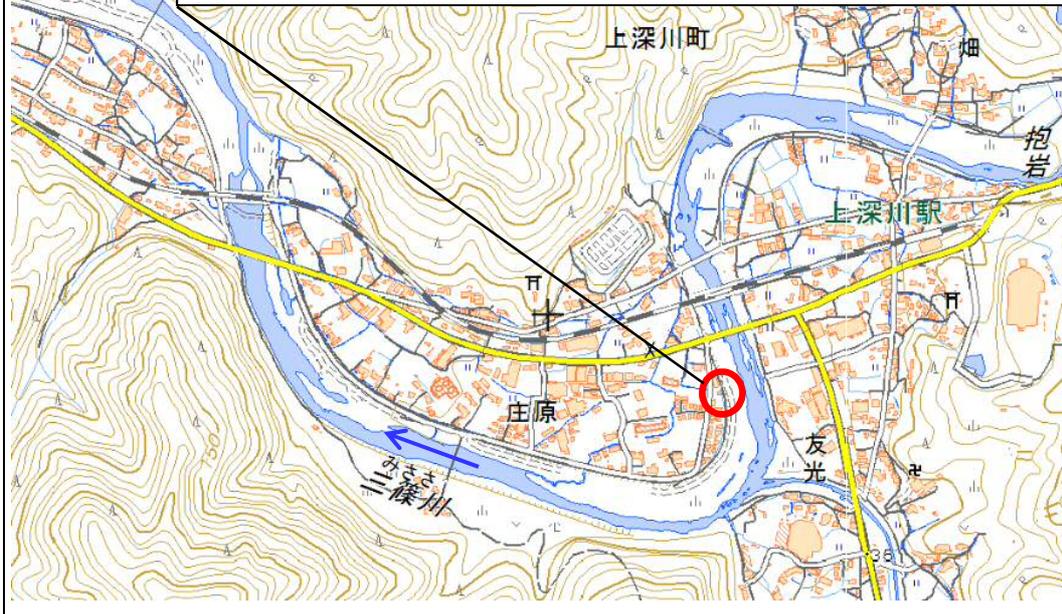

## ＜対策工事の時系列＞

7月8日（日）	6：00	現地で対策工事に着手
7月9日（月）	10：00	対策工事を継続して実施中 大型土のう 72個設置済（9：00時点）
7月10日（火）	9：00	対策工事を継続して実施中 支障物移転 完了 袋詰め玉石 10袋製作（9：00時点）
7月11日（水）	9：00	対策工事を継続して実施中 袋詰め玉石 55袋製作 築堤盛土 50m <sup>3</sup> （8：00時点）

## 現地対策写真

太田川水系三篠川右岸 5k600 付近（広島市安佐北区上深川地先）



## 対策工法図面

