


広島市安佐北区口田南3丁目

2018年7月18日(水) 17時00分現在

I-1-9-33溪流

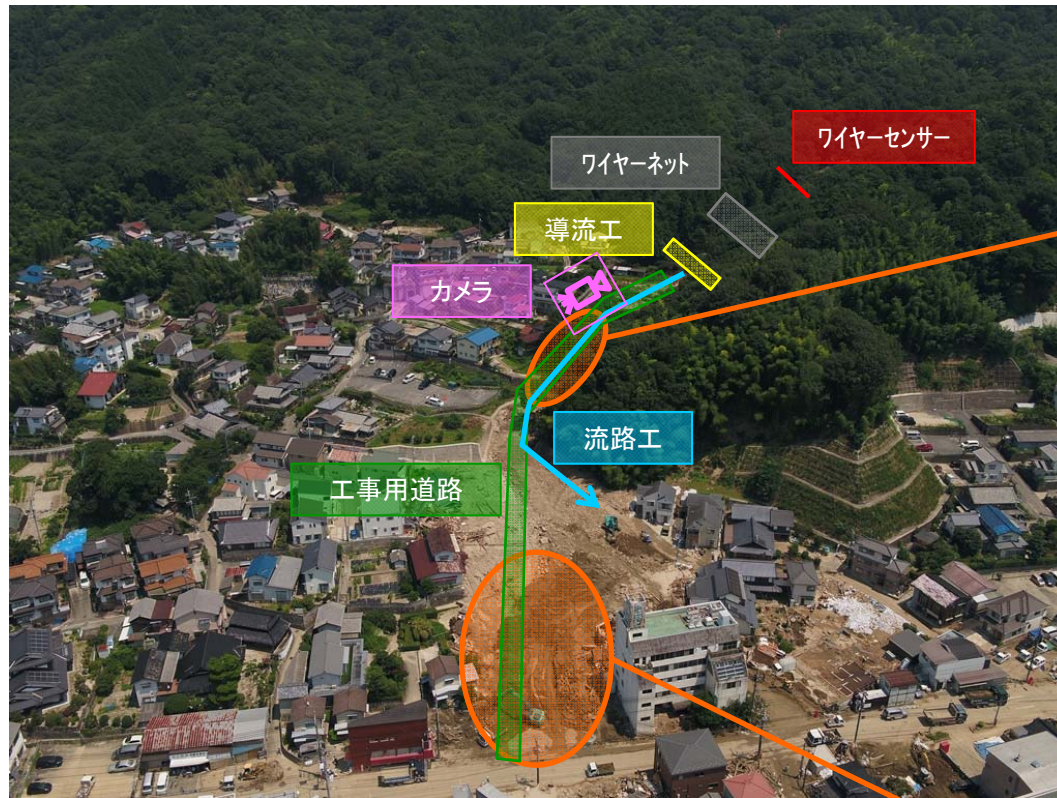

工事用道路の促進(流路工と兼用)



キャリアダンプによる大型土のうの運搬状況



工事用道路入口の堆積物撤去の促進

広島市安佐北区口田南5丁目

2018年7月18日(水) 17時00分現在

準-1-9-6204溪流



導流工(大型土のう)に着手



農道の道路啓開が完了
(導流工への進入が可能)



流路工計画地内の堆積物撤去が完了
(流路工の着手が可能)

I -1-9-226-1溪流



第2堰堤背面の掘削が完了
(流路断面の確保)



流路工が完成
(堰堤下流の洗掘防止)



第1堰堤背面の掘削が完了
(流路断面の確保)

広島市東区福田1丁目

2018年7月18日(水) 17時00分現在

I -1-9-486溪流



工事用道路(上流部)の促進



工事用道路(下流部)の促進
