

復旧作業状況 (9/21 17:00時点)



9月21日
13:30時点 空撮


【施工状況】

- 現在、計測機械設置し、山の変位を観測中（継続）
- 9月17日時点 : 0.01mm/日 ※9/20 1時~9/21 1時 累計値
- 過去最大 (8/23) : 331.3mm/日 ※8/23 0時~8/24 0時 累計値
- 頭部排土作業中
- 地すべり線を確認するためのボーリング調査を実施中
- その他、法面対策等を実施中

【施工完了】

- 進入路整備 : 8/21~8/22
- 大型土のう : 8/24~8/30 計612袋
- 水抜きボーリング : 8/20~9/2 5箇所 計16本
- 抑止矢板 : 8/20~9/7 L=28m
- モルタル吹付 : 9/10~9/20

断面イメージ

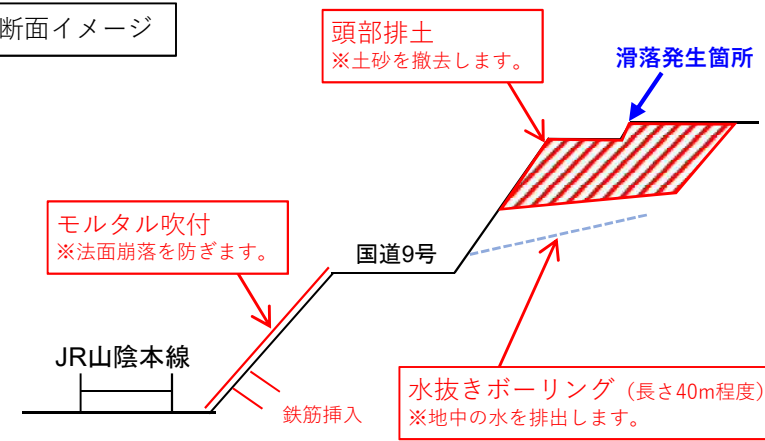

頭部排土
8/23~施工中
※土砂を撤去しています。



至松江

至浜田

■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況（起点側）

8/21 8:00時点



至 浜田

地すべり箇所

JR山陰本線

至 松江

9/21 13:30時点



頭部排土施工中

至 浜田

鉄筋挿入
施工中

JR山陰本線

至 松江

■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況（終点側）

