

# 復旧作業状況 (9/24 11:00時点)




## 【施工状況】

- 現在、計測機械設置し、山の変位を観測中（継続）
- （9月24日時点 : 0.0mm/日 ※9/23 0時~9/24 0時 累計値）
- （過去最大（8/23）: 331.3mm/日 ※8/23 0時~8/24 0時 累計値）
- ・頭部整形作業中
- ・地すべり線を確認するためのボーリング調査を実施中
- ・その他、法面対策等を実施中

## 【施工完了】

- ・進入路整備 : 8/21~8/22
- ・大型土のう : 8/24~8/30 計612袋
- ・水抜きボーリング : 8/20~9/2 5箇所 計16本
- ・抑止矢板 : 8/20~9/7 L=28m
- ・モルタル吹付 : 9/10~9/21

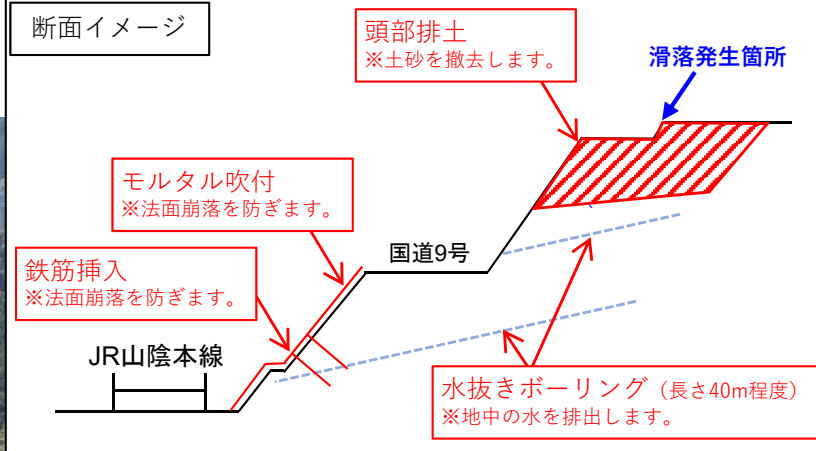

頭部排土  
8/23~施工中  
※土砂を撤去しています。

地すべり範囲

抑止矢板 L=28m  
9/7施工完了

水抜きボーリング  
8/22施工完了  
※地中の水を排出します。

至  
浜  
田

進入路整備  
8/22施工完了

水抜きボーリング  
8/25施工完了  
※地中の水を排出します。

水抜きボーリング  
9/2施工完了  
※地中の水を排出します。

水抜きボーリング  
8/27施工完了  
※地中の水を排出します。


モルタル吹付  
9/21施工完了  
※法面崩落を防ぎます。

鉄筋挿入  
9/22~施工中  
※法面崩落を防ぎます。

大型土のう  
8/30施工完了

水抜きボーリング  
8/26施工完了  
※地中の水を排出します。

至  
松  
江

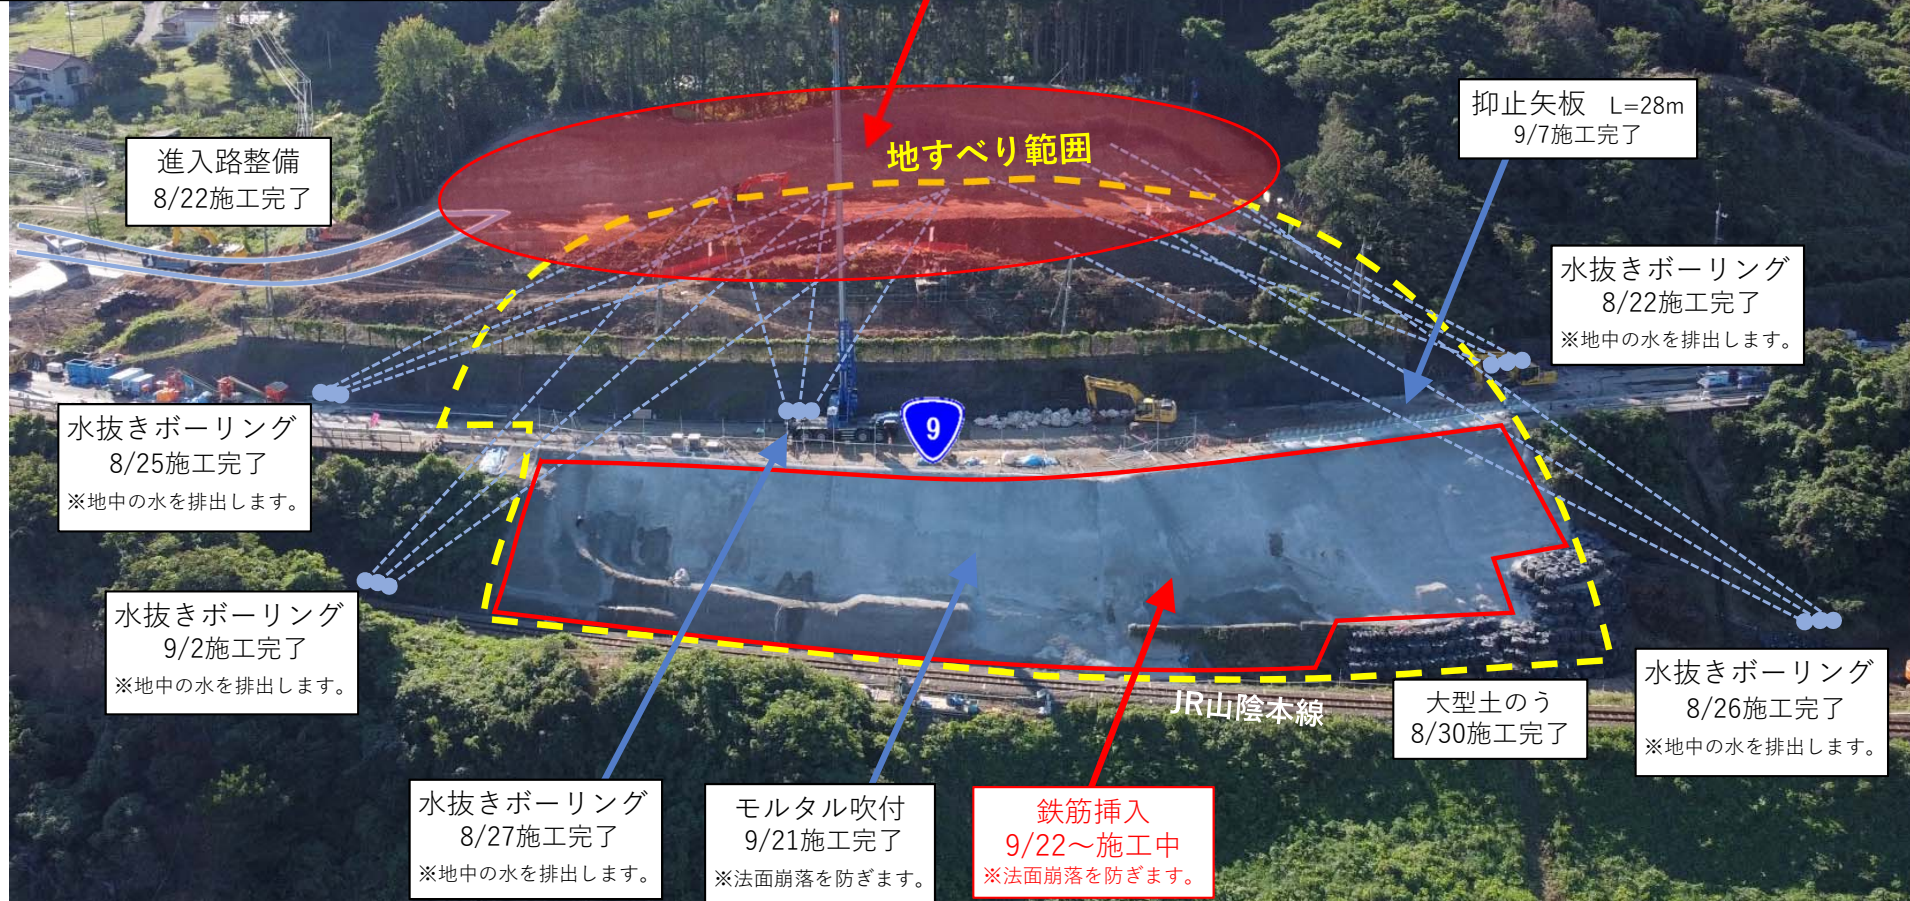

■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況（起点側）

8/21 8:00時点



9/21 8:45時点



■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況（終点側）

