

復旧作業状況 (10/8 12:00時点)



【施工状況】



- ・現在、計測機械を設置し、山の変位を観測中（継続）
- 〔 10月8日時点 : 0.01mm/日 ※10/7 12時~10/8 12時 累計値 〕
- 〔 過去最大 (8/29) : 331.3mm/日 ※8/23 0時~8/24 0時 累計値 〕
- ・防護柵設置中 L=136m
- ・仮設歩道設置中

10月7日 17:00 撮影

【施工完了】

- ・進入路整備 : 8/21~8/22
- ・大型土のう : 8/24~8/30 計612袋
- ・水抜きボーリング : 8/20~9/29 計25本
- ・抑止矢板 : 8/20~9/7 L=28m
- ・モルタル吹付 : 9/10~9/21
- ・頭部排土 : 8/23~9/24
- ・鉄筋挿入 : 9/21~9/29 計70本
- ・法面処理 : 9/28~10/3

断面イメージ

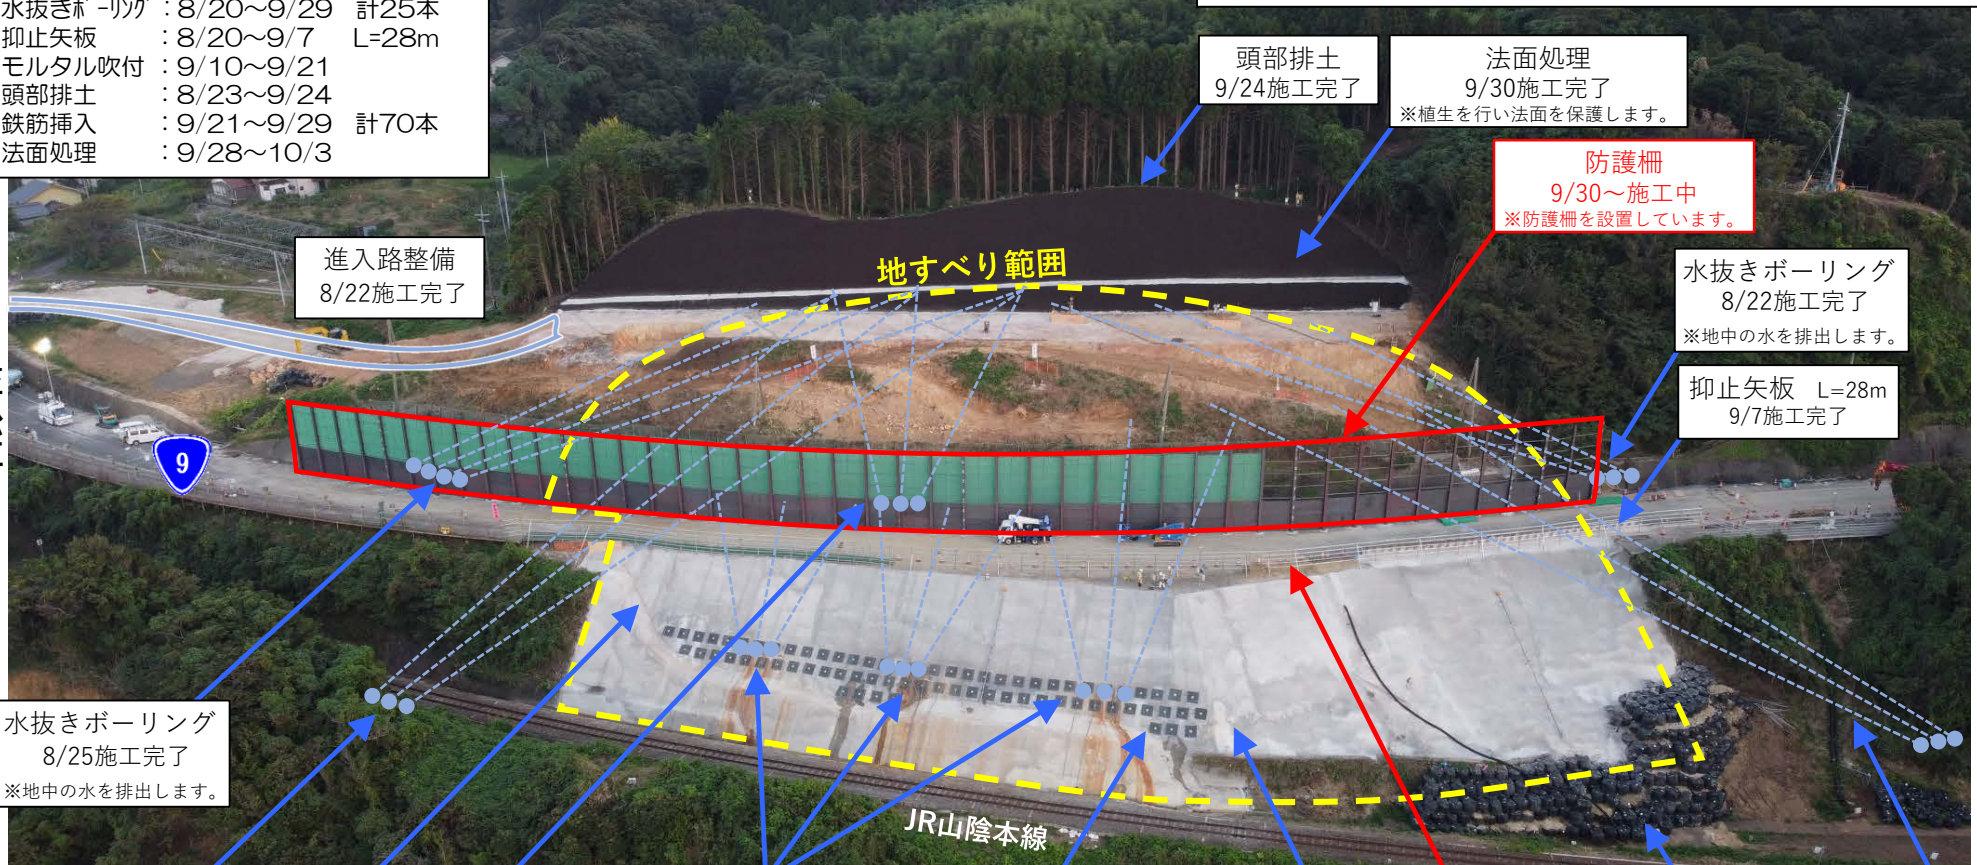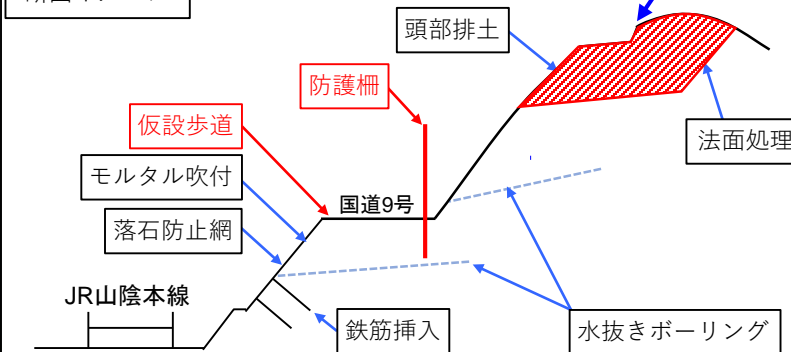

至松江

至浜田

地すべり範囲

JR山陰本線

仮設歩道 9/30~施工中

大型土のう 8/30施工完了

■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況（起点側）

8/21 8:00時点



至 浜田 10/7 17:00時点



■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況（終点側）

