

■本復旧工事状況 (9/6 時点)

R4.8.31撮影

赤文字：工事实施中
 緑文字：工事完了又は概成
 青文字：今後の工事予定

集水井 N=1基
 4/22～ 工事開始
 7/7 N=1基 (完了)

至 松江

頭部排土+掘削 (全体V=12,000m³)
 1/18～ 工事開始
 3/28 V=12,000m³
 頭部排土+掘削 (完了)

グラウンドアンカー N=58本
 3/28～ 工事開始
 6/13 全数施工 (完了)

擁壁撤去 V=500m³
 1/18～ 工事開始
 3/28 V=500m³擁壁撤去 (完了)

横ボーリング N=12本

JR山陰本線


車道等復旧

グラウンドアンカー N=52本
 6/14～ 工事開始
 9/6時点 進捗率 約70%

資材搬入用
 モノレール

至 浜田

A-A断面

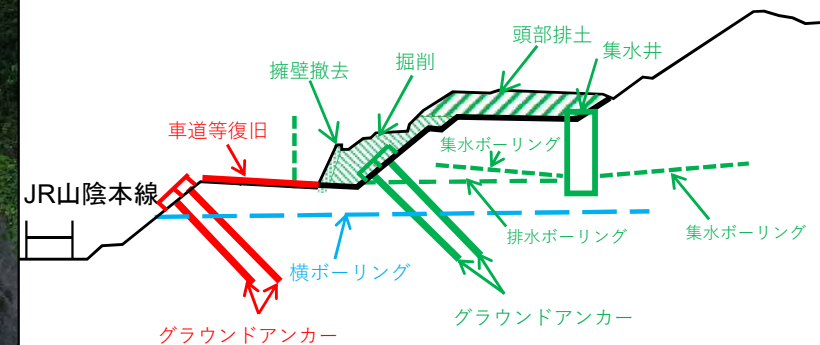

■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況


●本復旧工事着手前

12/22 13:00時点



●本復旧工事施工状況

9/6 13:00時点

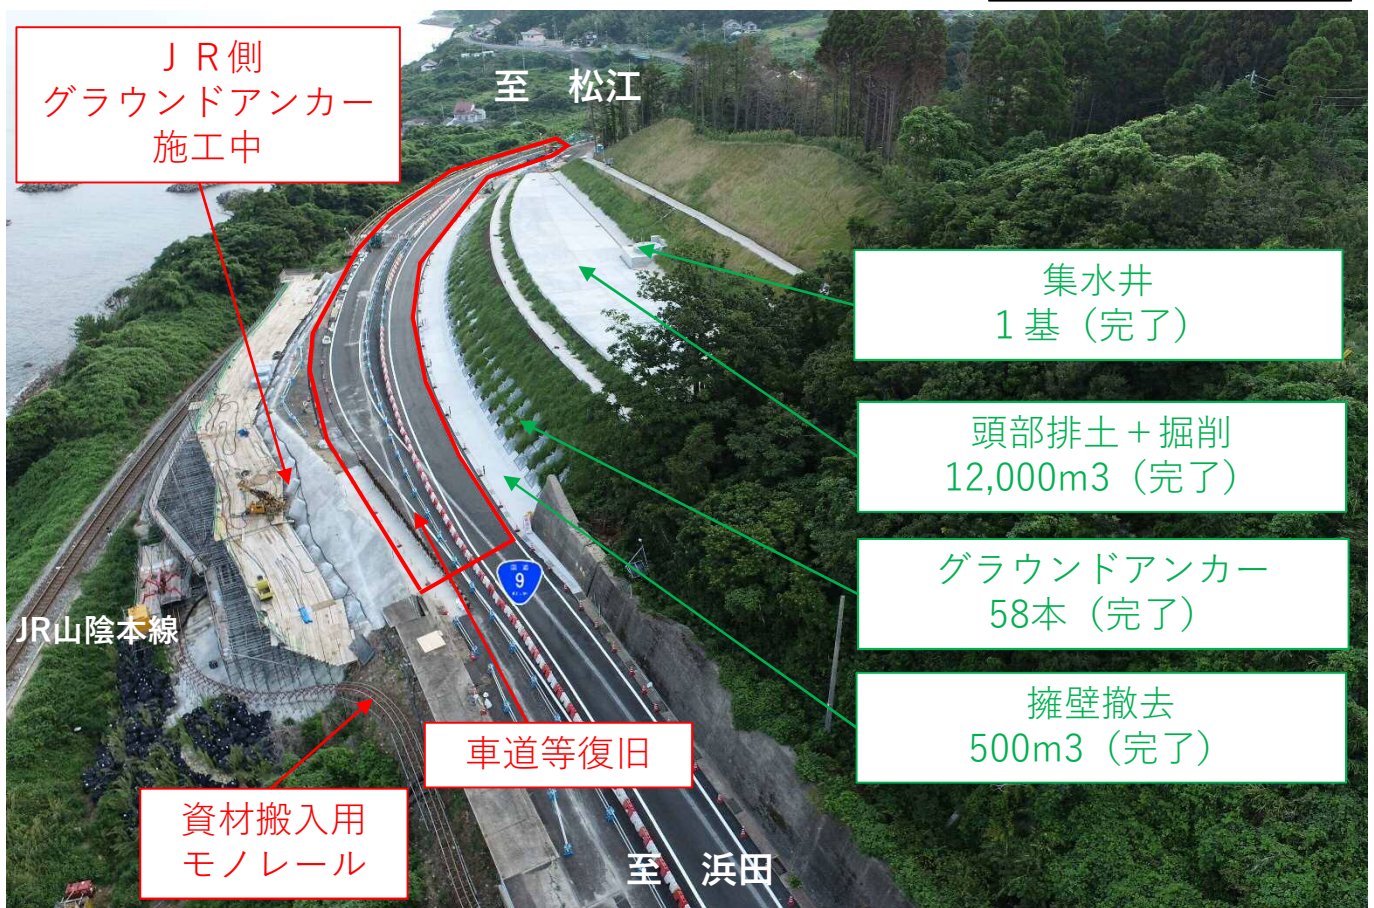

■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況

●本復旧工事施工状況

9/6 13:00時点

