


【小瀬川】事業進捗状況

令和7年12月末時点

- ・小瀬川（防鹿・小川津地区）において洪水対策のための築堤工事等を実施しています。
- ・事業が完了することで、洪水氾濫による家屋等の浸水被害を軽減します。



小川津地区堤防 完成時（令和7年3月末撮影）

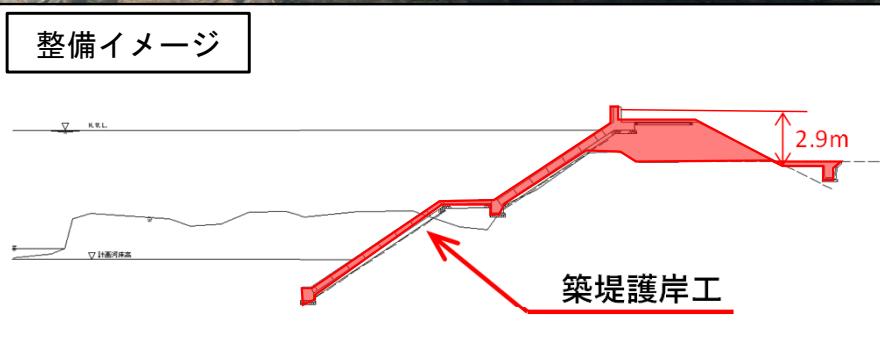

小川津（おがわづ）地区
堤防整備L=約280m
令和7年3月完成

小川津地区 工事進捗状況
工事完成 : 280m/280m [100%]

事業進捗率


(防鹿・小川津地区合計)

設計	100%
用地買収	約90%
工事	100%

【小瀬川河口部】高潮・耐震・浸透対策進捗状況(国道2号～中市堰①)

- ・小瀬川河口部において高潮対策工事が完成しました。
- ・工事が完成することで高潮被害に対する安全性が向上し、浸水被害を軽減します。

令和5年11月完成

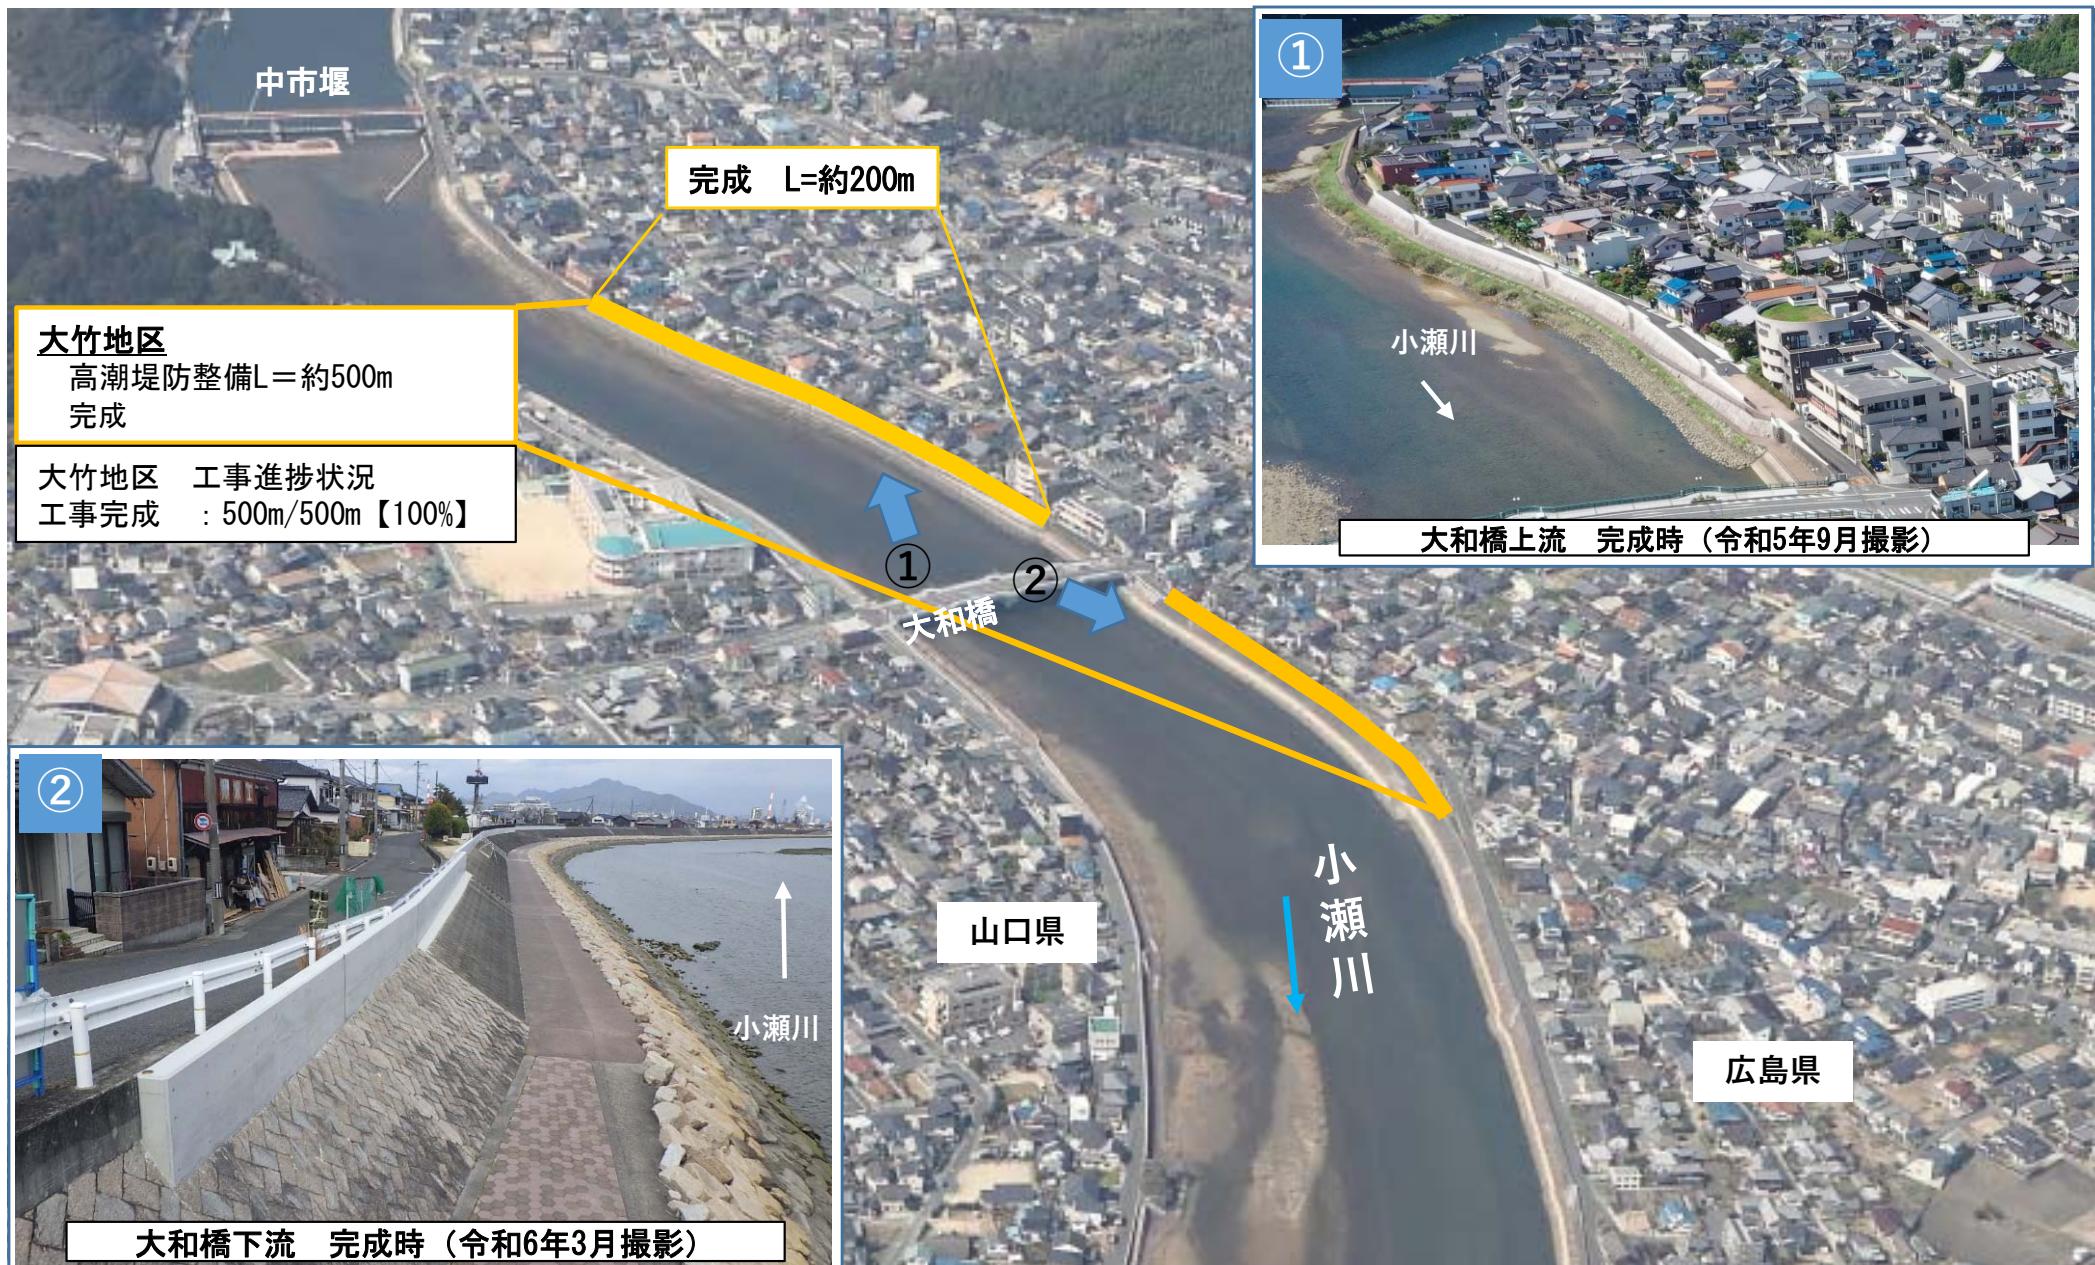

【小瀬川河口部】高潮・耐震・浸透対策進捗状況(国道2号～中市堰②)

令和7年12月末時点

- ・小瀬川河口部において高潮対策工事を実施します。
- ・工事が完成することで高潮被害に対する安全性が向上し、浸水被害を軽減します。

