

## お知らせ

記者発表資料  
配布日時

平成30年7月12日(木)  
10:00

■同時発表先：

合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

### 【災害対策情報】

国管理河川 太田川水系 根谷川右岸 4k200付近  
三篠川右岸4k200付近および5k600付近の  
堤防の**緊急対策（侵食対策）の進捗状況【第6報】**

平成30年7月6日～7日に発生した根谷川、三篠川の堤防の  
侵食箇所（上記3箇所）において、太田川河川事務所が実施中の  
**『緊急対策工事』の進捗状況（7月12日（木）10時現在）**につ  
いてお知らせします。

なお、緊急対策の完了は、現時点で7月16日を予定しています。  
緊急対策工事の概要は別紙を参照してください。

#### 【問い合わせ先】

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所

TEL (082) - 222-9245 (災害対策支部直通)

副所長(河川) おおくぼ まさ ひこ  
大久保 雅 彦



### <対策工事の時系列>

- 7月6日(金) 22:00 現地で対策工事に着手
- 7月7日～7月9日(月) 10:00 対策工事を継続して実施中
- 7月10日(火) 9:00 仮設工事を実施中
- 7月11日(水) 9:00 仮設工事を実施中  
大型土のう 190個設置(8:00時点)
- 7月12日(木) 10:00 仮設工事を実施中  
仮橋設置 (9:00時点)



国土を整え、全力で備える


国土交通省  
中国地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism  
Chugoku Regional Development Bureau

## 現地対策写真



## 対策工法図面

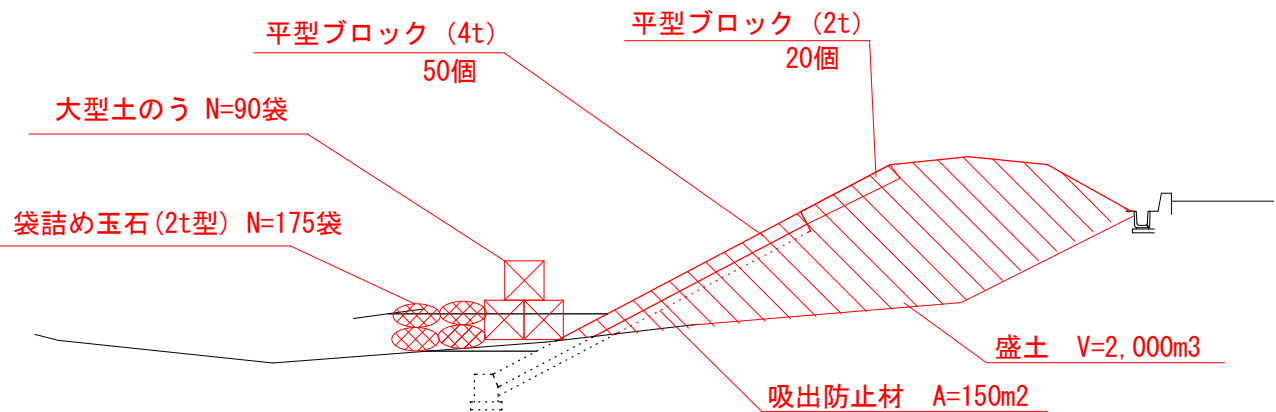



### <対策工事の時系列>


7月8日（日）	6：00	現地で対策工事に着手
7月9日（月）	10：00	対策工事を継続して実施中 大型土のう 67個設置済（9：00時点）
7月10日（火）	9：00	対策工事を継続して実施中 袋詰め玉石 10袋製作 方塊ブロック 6個設置（9：00時点）
7月11日（水）	9：00	対策工事を継続して実施中 袋詰め玉石 55袋製作 方塊ブロック 88個設置 築堤盛土 200m <sup>3</sup> （8：00時点）
7月12日（木）	10：00	対策工事を継続して実施中 袋詰め玉石 80袋製作 方塊ブロック 110個設置完了 築堤盛土 400m <sup>3</sup> （9：00時点）

## 現地対策写真

太田川水系三篠川右岸 4k200 付近 (広島市安佐北区上深川地先)




## 対策工法図面

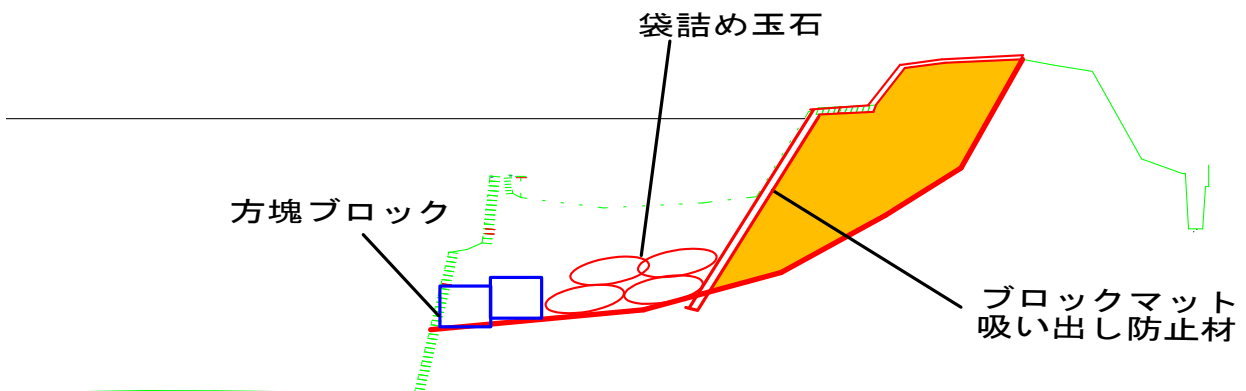

**【位置図】**

太田川水系三篠川右岸 5k600 付近（広島市安佐北区上深川地先）

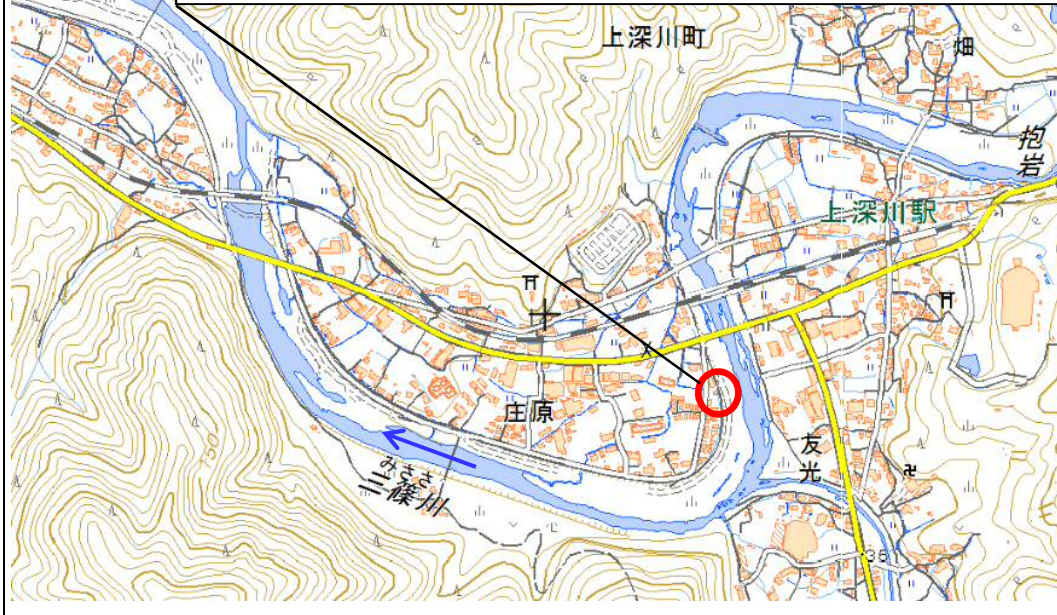

**＜対策工事の時系列＞**

- |          |       |  |
|----------|-------|--|
| 7月8日（日）  | 6：00  | 現地で対策工事に着手   |
| 7月9日（月）  | 10：00 | 対策工事を継続して実施中<br>大型土のう 72個設置済（9：00時点）   |
| 7月10日（火） | 9：00  | 対策工事を継続して実施中<br>支障物移転 完了<br>袋詰め玉石 10袋製作（9：00時点）                                |
| 7月11日（水） | 9：00  | 対策工事を継続して実施中<br>袋詰め玉石 55袋製作<br>築堤盛土 50m <sup>3</sup> （8：00時点）                  |
| 7月12日（木） | 10：00 | 対策工事を継続して実施中<br>袋詰め玉石 100袋製作<br>方塊ブロック 46個設置<br>築堤盛土 50m <sup>3</sup> （9：00時点） |

## 現地対策写真

太田川水系三篠川右岸 5k600 付近（広島市安佐北区上深川地先）



## 対策工法図面

