

広島県内の自治体からの要請に対応した道路啓開・河川土砂撤去等の取組み状況

5市1町からの要請を受け、9地区で実施


平成30年8月22日 8:00現在

④ 東広島市高屋町：道路啓開支援




市道 松山小谷線	
支援期間	7月23日～8月17日
進捗状況	完了
作業内容	土砂撤去
その他	全体延長L=450m 作業時間：7:00～18:00

⑥ 福山市郷分町：道路啓開支援




市道 郷分30号線	
支援期間	7月26日～8月2日
進捗状況	完了
作業内容	排水路整備
その他	L=120m 作業時間：8:00～17:00

**① 坂町小屋浦：全体マネジメント
道路啓開支援**




坂町小屋浦（町道）	
支援着手	7月20日
進捗状況	98%
作業内容	土砂撤去、全体マネジメント
その他	全体延長L=1,330m 作業時間：8:00～17:00

⑦ 呉市天応町：河川土砂撤去支援

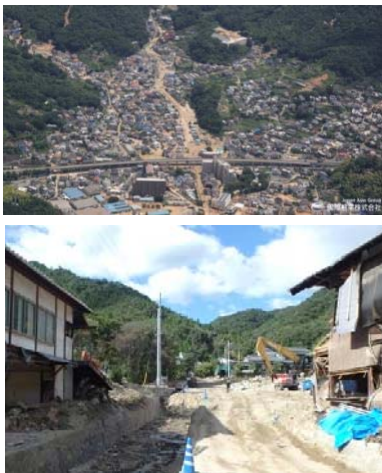


背戸川（せとのかわ）	
支援着手	7月23日
進捗状況	94%
作業内容	進入路啓開・土砂撤去
その他	土砂撤去 L=600m (進入路啓開 L=350m) 作業時間：8:00～17:00

② 呉市川尻町：道路啓開支援




市道 川尻本線1号線	
支援期間	7月24日～7月28日
進捗状況	完了
作業内容	路面正整、安全施設設置
その他	全体延長L=260m 作業時間：8:00～17:00

③ 呉市安浦町：道路啓開支援




市道 中畑下垣内線	
支援期間	7月21日～7月24日
進捗状況	完了
作業内容	土砂撤去
その他	全体延長L=200m 作業時間：8:00～17:00

⑤ 三原市木原町：道路啓開支援




市道 木原29号線	
支援期間	7月20日～7月31日
進捗状況	完了
作業内容	大型土嚢設置
その他	L=300m 作業時間：8:00～17:00

⑥ 尾道市美ノ郷町：土工用防護柵設置支援




市道 美ノ郷公園線	
支援期間	7月23日～8月9日
進捗状況	完了
作業内容	土工用防護柵設置
その他	L=138m 作業時間：8:00～17:00

⑧ 福山市郷分町：道路啓開支援



市道 郷分30号線	
支援期間	7月26日～8月2日
進捗状況	完了
作業内容	排水路整備
その他	L=120m 作業時間：8:00～17:00

⑨ 坂町坂西：河川土砂撤去支援



総頭川（そうずがわ）	
支援着手	7月26日
進捗状況	100%
作業内容	土砂撤去
その他	土砂撤去 L=600m 作業時間：8:00～18:00 20:00～5:00 (7/30-8/11)

東北TEC・九州TEC・中国TEC

中国TEC

東北TEC・関東TEC・中国TEC

中国TEC

中国TEC

中国TEC

中国TEC
