

広島県内の自治体からの要請に対応した道路啓開・河川土砂撤去等の取組み状況

5市1町からの要請を受け、9地区で実施

平成30年8月28日 8:00現在

⑨ 坂町坂西：河川土砂撤去支援



河川	総頭川（そうずがわ）
支援期間	7月26日～8月22日
進捗状況	完了
作業内容	土砂撤去
その他	土砂撤去 L=600m 作業時間：8:00～18:00 20:00～5:00（7/30-8/11）

東北TEC・九州TEC・中国TEC

④ 東広島市高屋町：道路啓開支援




市道	檢山小谷線
支援期間	7月23日～8月17日
進捗状況	完了
作業内容	土砂撤去
その他	全体延長L=450m 作業時間：7:00～18:00

⑧ 福山市郷分町：道路啓開支援



市道	郷分30号線
支援期間	7月26日～8月2日
進捗状況	完了
作業内容	排水路整備
その他	L=120m 作業時間：8:00～17:00

中国TEC

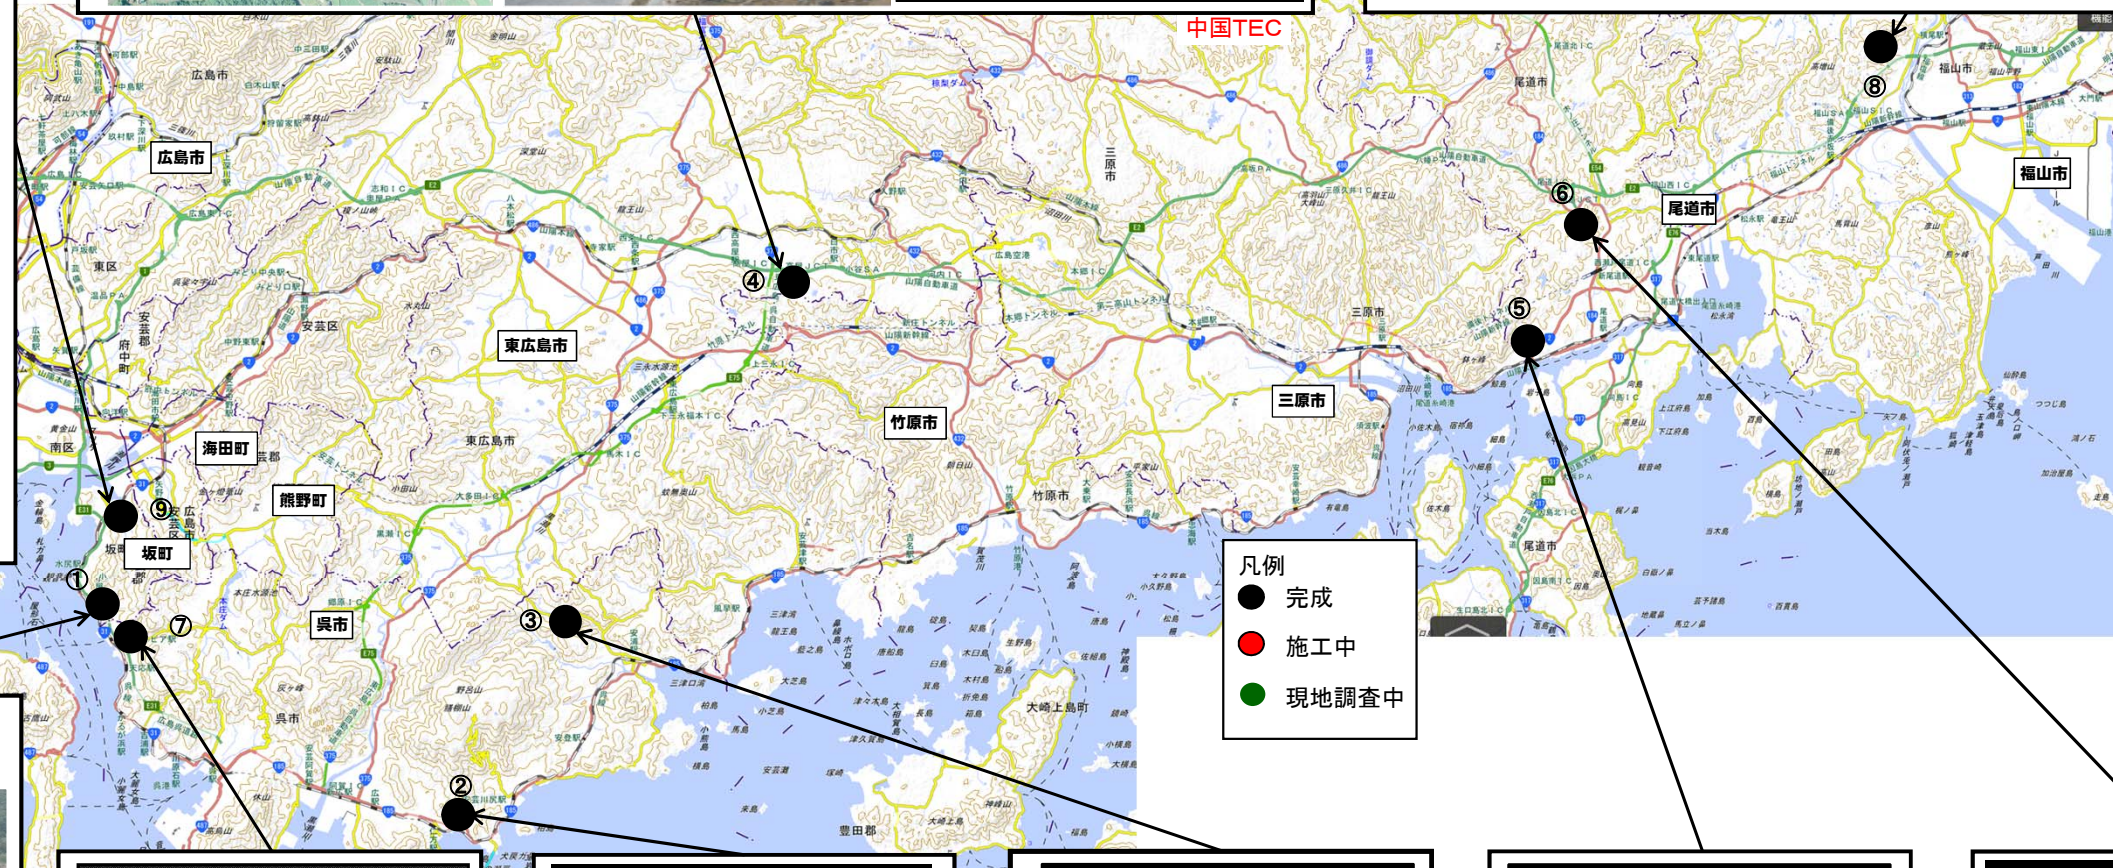

凡例	● 完成
	● 施工中
	● 現地調査中

① 坂町小屋浦：全体マネジメント道路啓開支援



町道	坂町小屋浦（町道）
支援着手	7月20日～8月25日
進捗状況	完了
作業内容	土砂撤去、全体マネジメント
その他	全体延長L=1,330m 作業時間：8:00～17:00

中国TEC

⑦ 呉市天応町：河川土砂撤去支援



河川	背戸川（せとのかわ）
支援着手	7月23日～8月27日
進捗状況	完了
作業内容	進入路啓開・土砂撤去
その他	土砂撤去 L=600m （進入路啓開 L=350m） 作業時間：8:00～17:00

東北TEC・関東TEC・中国TEC

② 呉市川尻町：道路啓開支援



市道	川尻本線1号線
支援期間	7月24日～7月28日
進捗状況	完了
作業内容	路面正整、安全施設設置
その他	全体延長L=260m 作業時間：8:00～17:00

中国TEC

③ 呉市安浦町：道路啓開支援



市道	中畑下垣内線
支援期間	7月21日～7月24日
進捗状況	完了
作業内容	土砂撤去
その他	全体延長L=200m 作業時間：8:00～17:00

中国TEC

⑤ 三原市木原町：道路啓開支援



市道	木原29号線
支援期間	7月20日～7月31日
進捗状況	完了
作業内容	大型土壌設置
その他	L=300m 作業時間：8:00～17:00

中国TEC

⑥ 尾道市美ノ郷町：土工用防護柵設置支援



市道	美ノ郷公園線
支援期間	7月23日～8月9日
進捗状況	完了
作業内容	土工用防護柵設置
その他	L=138m 作業時間：8:00～17:00

中国TEC
