


天神川水系河川整備計画の事業進捗の概要


- 前回点検以降、治水に関する河川整備として、河床掘削、堤防侵食防止対策、河岸侵食防止対策が進捗している。
- 今後の事業予定箇所においても関係市町からの要望も踏まえながら、計画的に事業を進めていきます。

事業の実施例 大雨が降ったときの川の水位を下げるため、樹木を伐採しました。

今後の事業予定区間等

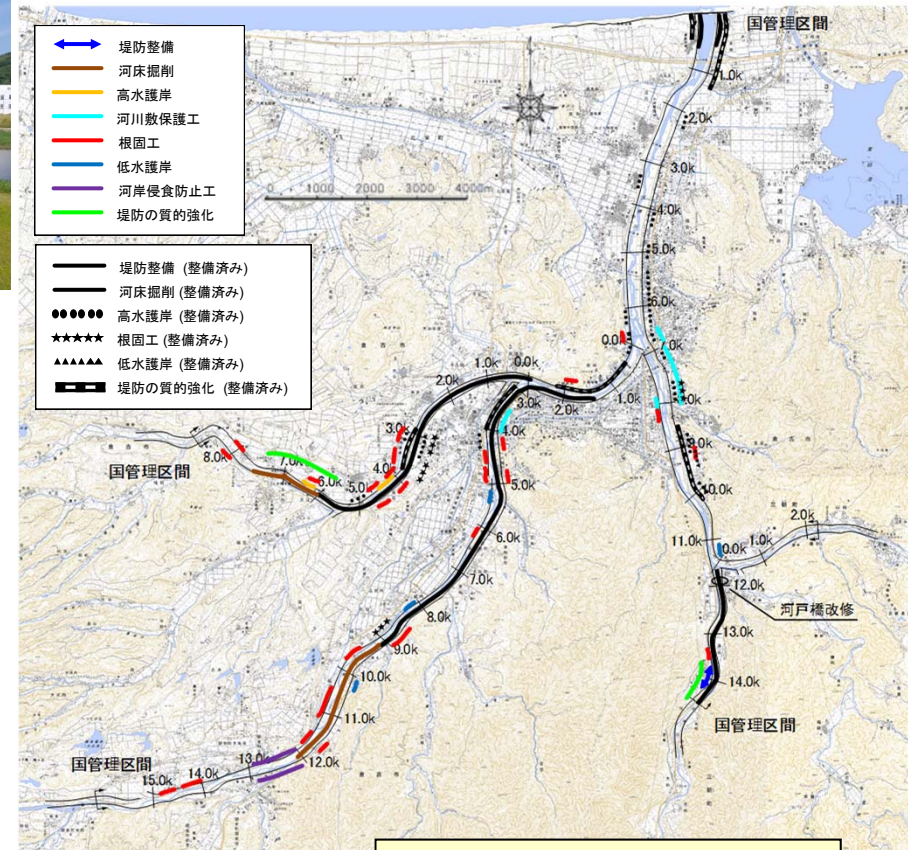

事業の整備率 近年は、整備率が比較的低い河岸侵食防止対策についても整備を進めており、河川整備事業は計画的に進捗しています。

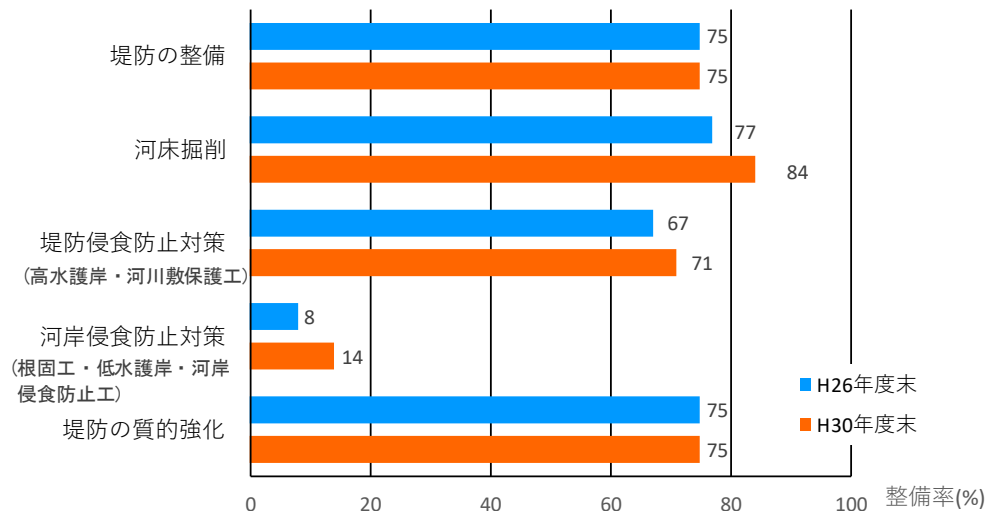

河川整備にあたっては、倉吉市や三朝町からの要望も踏まえながら、事業を進めていきます。




天神川水系河川整備計画の事業進捗の概要

■ 整備計画策定後の工事により、天神川本川においては13kより下流区間、小鴨川においては8kより下流区間、国府川においては6kより下流区間において整備計画目標流量に対し安全に流すことが可能になりました。
(引き続き、整備計画目標流量に対し流下能力が不足している箇所においても整備を進捗させていきます。)

各河川の流下能力



堤防の整備を行いました。

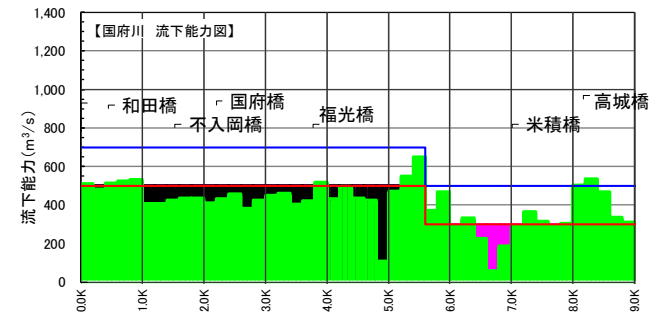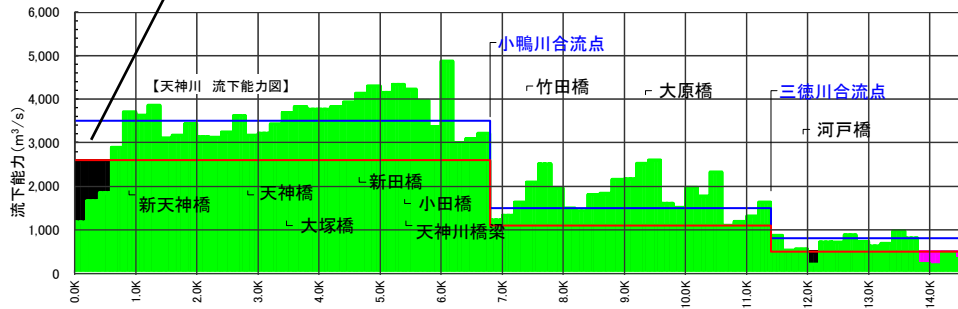

各河川の流下能力達成率



河床の掘削、樹木の伐採を行いました。

