

# 高梁川（清音地区・中原地区）災害復旧工事




～2018年7月豪雨災害による漏水の発生を受けて、直轄河川災害復旧事業および直轄河川災害関連緊急事業にて、漏水箇所の遮水工を実施しています～

工事では大変ごめいわくをおかけいたしております。  
工事の進み具合などを定期的にお知らせするため配布・掲示・回覧等にて地域の皆様に情報提供いたしております。



事業の流れ

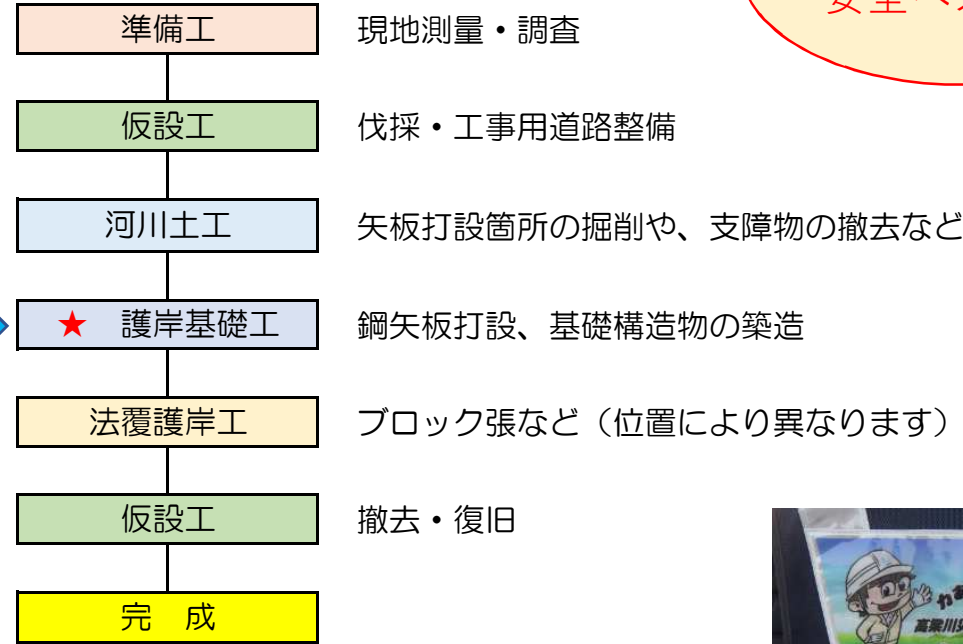

現時点

イラスト系  
安全ベスト集

各工区で、趣向を凝らしオリジナルの安全ベストを作成し、安全啓発向上や親しみやすい工事現場となるような工夫をしています



★工事に関するお問い合わせ★  
国土交通省 中国地方整備局  
岡山河川事務所  
高梁川災害復旧対策出張所  
☎086-465-1880  
担当：山下建設監督官  
または、現場職員へお気軽に！

鋼矢板打込み完了範囲の状況です

引き続きメイン工種である、鋼矢板の掘削圧入作業を行っています！



※模式図のため、実際の位置と多少異なる場合があります





# ドローンによる上空からの写真

撮影:平成31年2月15日

## 清音工区

工事起点から  
川辺橋付近

下流より上流を  
のぞむ



工事起点から  
川辺橋付近

上流より下流を  
のぞむ



川辺橋から

ポンプ場付近

下流より上流を  
のぞむ



川辺橋から

ポンプ場付近

上流より下流を  
のぞむ



## 中原工区

ポンプ場から  
工事終点付近

下流より上流を  
のぞむ



ポンプ場から  
工事終点付近

上流より下流を  
のぞむ







**2 月末時**

**各工区の進捗状況です！  
安全第一で作業しています  
今後とも、ご理解  
ご協力をお願いします！**

**今月は主に、各工区にて矢板打設用を  
本格施工しています。  
進捗率は全体ではなく、  
鋼矢板打設工での%を示しています**

**写真は各工区で  
使用している大型クレーンです  
70t級から100t級まであります**

清音地区
<b>その1工区 三宅建設(株)</b>
鋼矢板の進捗率： 約43% 284枚中 124枚まで打設済

施工状況：



清音地区
<b>その2工区 (株)ニシテクノ</b>
鋼矢板の進捗率： 約22% 470枚中 107枚まで打設済

施工状況：



清音地区
<b>その3工区 中央建設(株)</b>
鋼矢板の進捗率： 約73% 270枚中 197枚まで打設済

施工状況：



清音地区
<b>その4工区 蜂谷工業(株)</b>
鋼矢板の進捗率： 約78% 272枚中 213枚まで打設済

施工状況： 全景



清音地区
<b>その5工区 (株)荒木組</b>
鋼矢板の進捗率： 約63% 319枚中 200枚まで打設済

施工状況： 全景



清音地区
<b>中原その1 中村建設(株)</b>
鋼矢板の進捗率： 約49% 508枚中 249枚まで打設済

施工状況： 2班体制での施工



清音地区
<b>中原その2 天野産業(株)</b>
鋼矢板の進捗率： 約41% 528枚中 218枚まで打設済

施工状況： 2班体制での施工



清音地区
<b>中原その3 (株)奥野組</b>
鋼矢板の進捗率： 約49% 507枚中 250枚まで打設済

施工状況： 2班体制での施工



中原地区
<b>その4工区 (株)竹内組</b>
鋼矢板の進捗率： 約46% 421枚中 194枚まで打設済

施工状況：



中原地区
<b>その5工区 (株)笹山工業</b>
鋼矢板の進捗率： 約43% 448枚中 194枚まで打設済

施工状況：



中原地区
<b>その6工区 (株)大都建設</b>
鋼矢板の進捗率： 約41% 450枚中 187枚まで打設済

施工状況：

