

直轄砂防災害関連緊急事業の進捗状況について（第 4 報）

平成 21 年 7 月 21 日に山口県防府市で発生した土石流災害に対し、山口県知事の要請を受けて、国土交通省による直轄砂防災害関連緊急事業として採択されました。溪流内に堆積した不安定土砂の再移動等による二次災害防止及び再度災害防止を図ります。現時点の事業の進捗状況は以下のとおりです。

平成 21 年 9 月 14 日現在

箇所名	主な実施内容	工事進捗状況
剣 川 ・事業採択：7 月 31 日 ・地先：防府市大字下右田字勝坂 ・事業内容：砂防えん堤 1 基	8 月 1 日 現地測量着手 8 月 2 日 用地関係調査着手 8 月 3 日 進入路工事着手 砂防指定地協議着手 8 月 9 日 地元説明会開催 8 月 26 日 砂防指定地告示 9 月 14 日 ボーリング調査着手	進入路(延長 400m)概成
神里川 ・事業採択：7 月 31 日 ・地先：防府市大字高井字神里 ・事業内容：砂防えん堤 1 基	8 月 1 日 現地測量着手 8 月 2 日 用地関係調査着手 8 月 3 日 砂防指定地協議着手 8 月 6 日 進入路工事着手 8 月 12 日 水路付替完了※ 8 月 26 日 砂防指定地告示 9 月 11 日 進入路概成 9 月 14 日 ボーリング調査着手	進入路(延長 200m)概成 ※土石流で流れが変わった 水路を元の流れへ付替
上田南川 ・事業採択：7 月 31 日 ・地先：防府市大字真尾字上田 ・事業内容：砂防えん堤 1 基	8 月 1 日 現地測量着手 8 月 2 日 用地関係調査着手 8 月 3 日 砂防指定地協議着手 8 月 4 日 進入路工事着手 8 月 10 日 地元説明会開催 8 月 26 日 砂防指定地告示 9 月 8 日 ボーリング調査着手	進入路(延長 660m)概成 ボーリング調査完了
奈美川（松ヶ谷川） ・事業採択：8 月 7 日 ・地先：防府市大字奈美 ・事業内容：砂防えん堤 1 基	8 月 8 日 現地測量着手 8 月 10 日 用地関係調査着手 8 月 27 日 地元説明会開催 9 月 1 日 砂防指定地告示	(既設道路が通行可能であり 工事用の進入路は不要)
素 川 ・事業採択：8 月 7 日 ・地先：防府市大字大崎 ・事業内容：砂防えん堤 1 基	8 月 8 日 現地測量着手 8 月 10 日 用地関係調査着手 8 月 11 日 土砂撤去着手 8 月 20 日 鉄道高架橋付近の土 砂撤去完了 9 月 1 日 砂防指定地告示	鉄道高架橋付近(進入路・水路部)土砂撤去完了 進入路(延長 160m)概成

※国土交通省山口河川国道事務所による砂防工事の進捗状況については、随時、中国地方整備局ホームページにおいて発信します。

<http://www.cgr.mlit.go.jp/>

問 い 合 わ せ 先	
国土交通省山口河川国道事務所	現地復旧対策チーム 電話 0853-22-1785 (代)
チームリーダー	森川 数美 (内線 533)
サブリーダー	田辺 裕和 (内線 204)

山口県防府市での直轄砂防災害関連緊急事業の進捗状況

平成21年9月14日現在
(第4報)



つるぎがわ
▲剣川 進入路概成

H21.8.26撮影




かみさとがわ
▲神里川 進入路概成

H21.9.11撮影



すがわ
▲素川 進入路概成

H21.9.10撮影

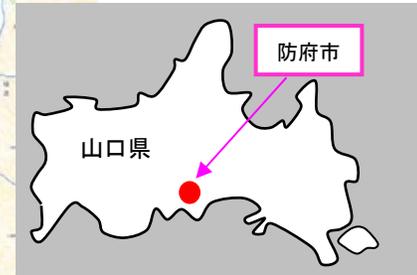

なみがわ
▲奈美川 地元説明会開催状況

H21.8.27撮影



うえだみなみがわ
▲上田南川 ボーリング調査状況

H21.9.9撮影
