

広島県内の自治体からの要請に対応した道路啓開・河川土砂撤去等の取組み状況

5市1町からの要請を受け、9地区で実施

平成30年8月16日 8:00現在

⑨ 坂町坂西：河川土砂撤去支援



⑨坂町坂西		内容：土砂撤去支援
位置	総領川（そうずがわ）	
着手	7月26日	
進捗状況	98%	
作業内容	土砂撤去	
その他	土砂撤去 L=600m 作業時間：8:00～18:00 20:00～5:00 (7/30-8/11)	

東北TEC・九州TEC・中国TEC

④ 東広島市高屋町：道路啓開支援




④東広島市高屋町		内容：道路啓開支援
位置	市道 松山小谷線	
着手	7月23日	
進捗状況	96%	
作業内容	土砂撤去	
その他	全体延長L=450m 作業時間：7:00～18:00	

⑧ 福山市郷分町：道路啓開支援



⑧福山市郷分町		内容：道路啓開支援
位置	市道 郷分30号線	
着手	7月26日～8月2日	
進捗状況	100%	
作業内容	排水路整備	
その他	L=120m 作業時間：8:00～17:00	

中国TEC

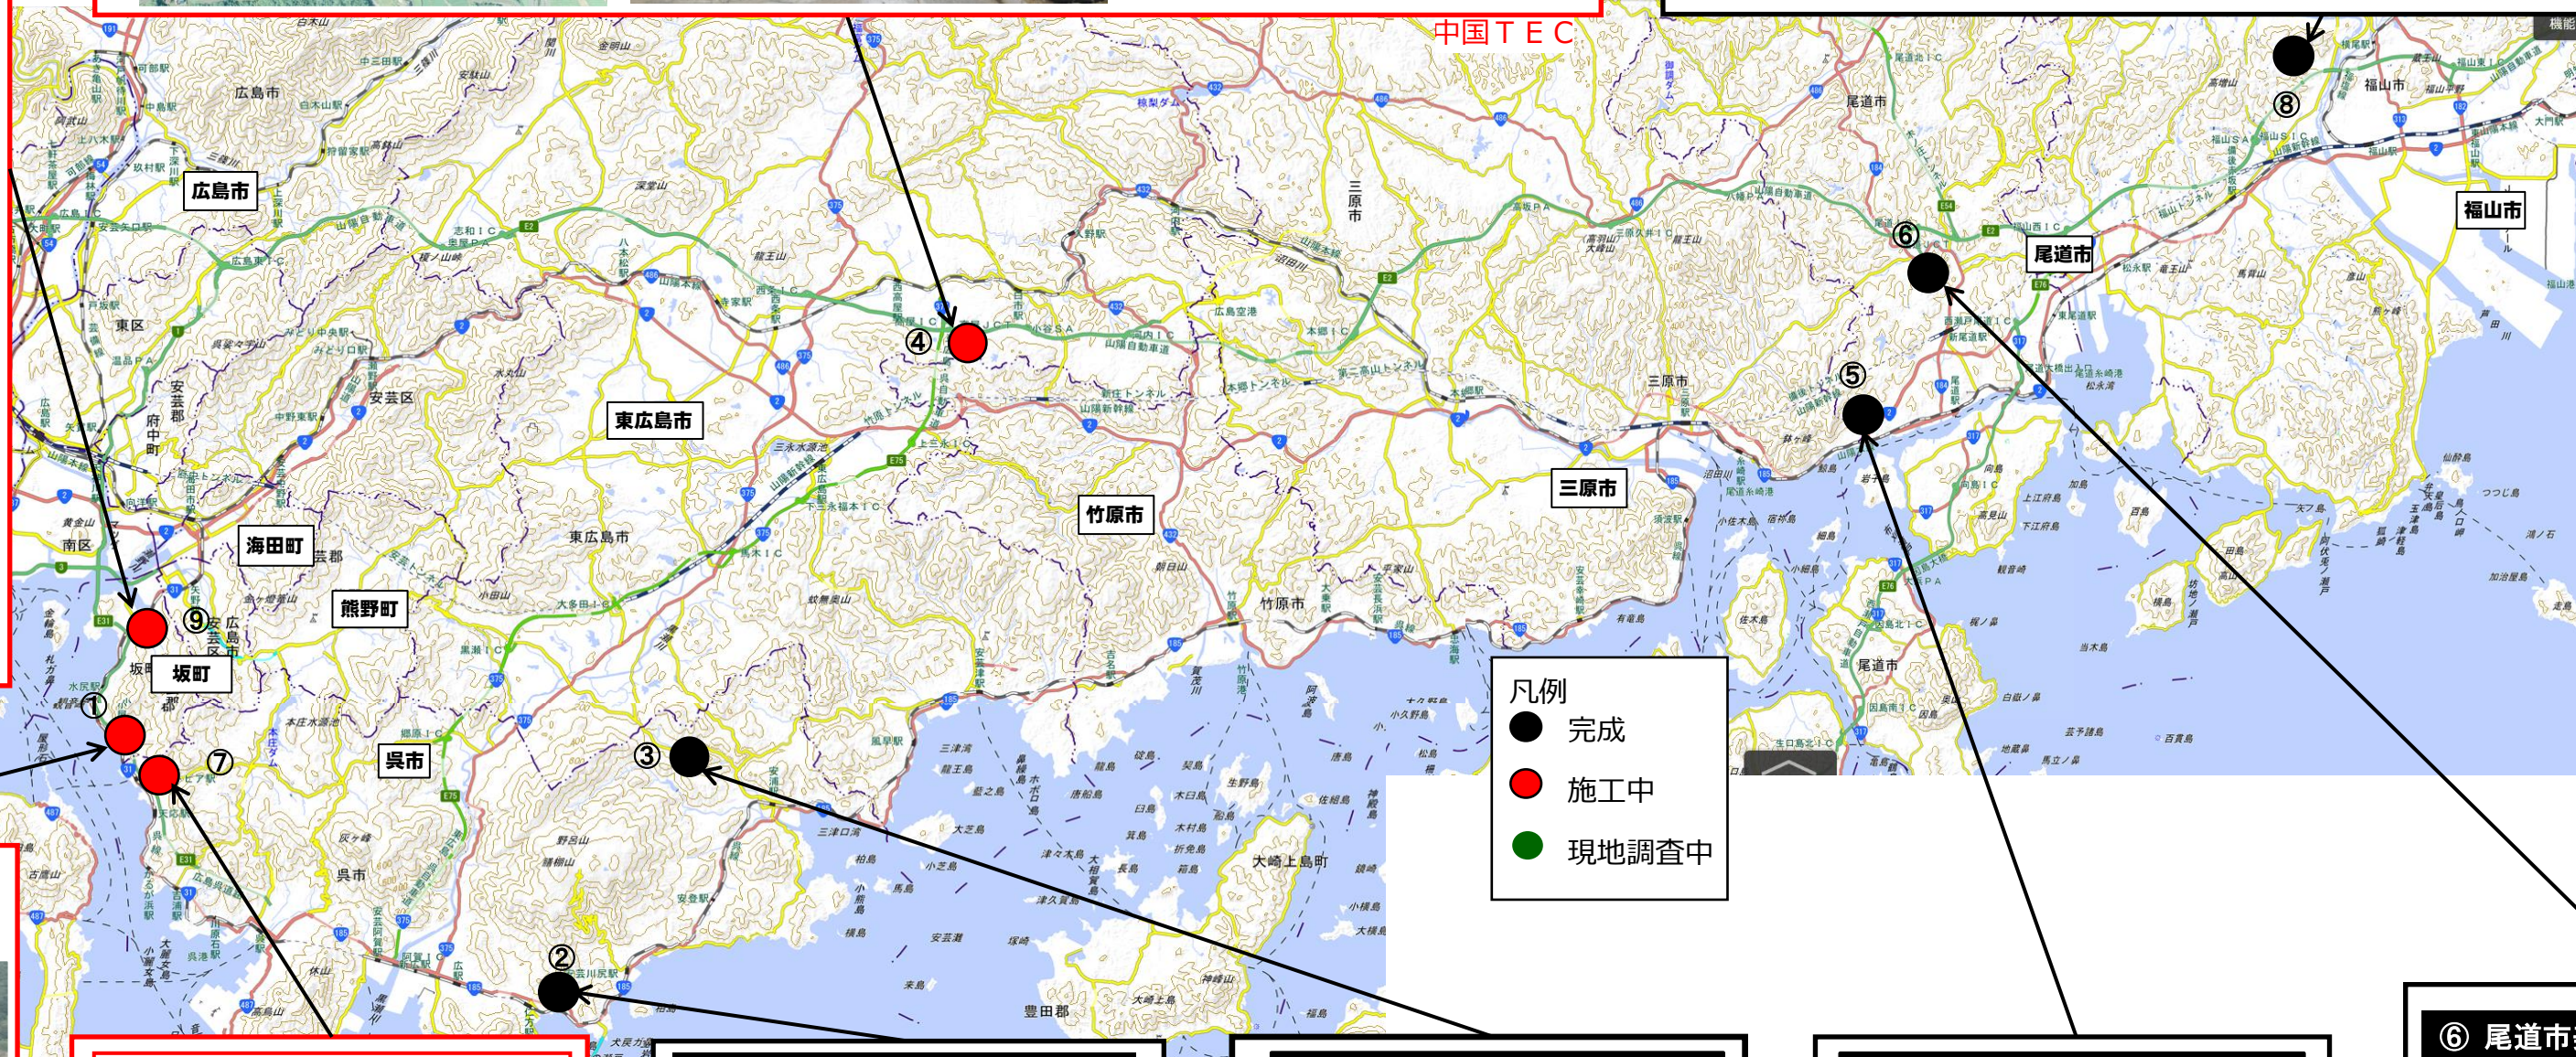

凡例	
●	完成
●	施工中
●	現地調査中

① 坂町小屋浦：全体マネジメント道路啓開支援



①坂町小屋浦		内容：道路啓開支援 全体マネジメント
位置	坂町小屋浦（町道）	
着手	7月20日	
進捗状況	95%	
作業内容	土砂撤去、全体マネジメント	
その他	全体延長L=1,330m 作業時間：8:00～17:00	

中国TEC

⑦ 呉市天応町：河川土砂撤去支援



⑦呉市天応町		内容：土砂撤去支援
位置	背戸川（せとのかわ）	
着手	7月23日	
進捗状況	71%	
作業内容	進入路啓開・土砂撤去	
その他	土砂撤去 L=600m (進入路啓開 L=350m) 作業時間：8:00～17:00	

東北TEC・関東TEC・中国TEC

② 呉市川尻町：道路啓開支援



②呉市川尻町		内容：道路啓開支援
位置	市道 川尻本線1号線	
着手	7月24日～7月28日	
進捗状況	100%	
作業内容	路面正整、安全施設設置	
その他	全体延長L=280m 作業時間：8:00～17:00	

中国TEC

③ 呉市安浦町：道路啓開支援



③呉市安浦町		内容：道路啓開支援
位置	市道 中畑下垣内線	
着手	7月21日～7月24日	
進捗状況	100%	
作業内容	土砂撤去	
その他	全体延長L=200m 作業時間：8:00～17:00	

中国TEC

⑤ 三原市木原町：道路啓開支援



⑤三原市木原町		内容：道路啓開支援
位置	市道 木原29号線	
着手	7月20日～7月31日	
進捗状況	100%	
作業内容	大型土嚢設置	
その他	L=300m 作業時間：8:00～17:00	

中国TEC

⑥ 尾道市美ノ郷町：土工用防護柵設置支援



⑥尾道市美ノ郷町		内容：道路啓開支援
位置	市道 美ノ郷公園線	
着手	7月23日～8月9日	
進捗状況	100%	
作業内容	土工用防護柵設置	
その他	L=138m 作業時間：8:00～17:00	

中国TEC
