

太田川河川事務所  
記者発表・配付資料

記者発表資料 配布日時	平成26年 8月27日 21:10 配付
----------------	-------------------------

- 同時発表先 : 合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、  
中国地方建設記者クラブ

## 「平成26年8月豪雨災害」による 土石流被害箇所の応急対策工事について (第6報)

8月20日に発生した「平成26年8月豪雨災害」による八木地区の被災箇所について、23日より応急対策のための「進入路整備工事」を進めているところですが、本日18時現在の進捗状況について、情報提供いたします。

### 応急対策工事 活動状況 【進捗率28%】

#### <実施内容>

- ・整備予定延長 L = 500m → 1,770m
  - ・整備完了延長 L = 490m (前日15時まで155m)
- ※整備予定延長は生活道路も含めた延長に変更しました。

#### <活動内容>

- ・土石流による堆積土砂の撤去。 8月23日より着手。
- ・大型土のう一部設置
- ・応急対策工事は、太田川河川事務所災害協定業者が施工を行っています。

※ 本資料は、8月27日18時 時点でとりまとめたものです。

※ 本資料による数値については、現時点での速報値であり今後修正される場合があります。

#### <問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局  
太田川河川事務所 082-222-9245 (災害対策支部直通)

#### 【担当・問い合わせ先】

副所長 <sup>えすみ</sup> 江角 信良 工務第二課長 <sup>まさき</sup> 正木 俊英


# 広島市安佐南区八木4丁目 土石流被害箇所への応急対策工事の対応状況

着手前



1

実施状況

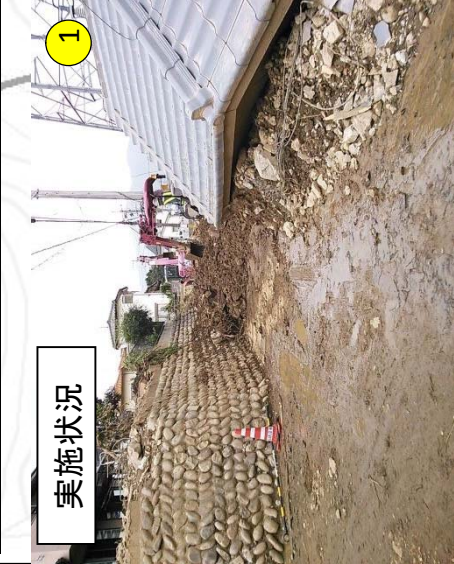

1

4



実施状況

応急対策内容: 土砂撤去 L=1,770m  
 着手日: 平成26年8月23日 13時00分  
 完成予定日: 未定  
 進捗率: 28% (実施延長 L=490m)  
 (平成26年8月27日 18:00 現在)

実施状況



3

実施状況



2



凡例

- 通行可能ルート
- 進入路整備予定\*
- 完了箇所(前日迄)
- 完了箇所(本日分)

\* 進入路整備箇所は状況により変更することがあります。
