



太田川河川事務所
記者発表・配付資料

記者発表資料 配布日時	平成26年 8月28日 21:00 配付
----------------	-------------------------

- 同時発表先： 合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、
中国地方建設記者クラブ

「平成26年8月豪雨災害」による 土石流被害箇所の応急対策工事について (第7報)

8月20日に発生した「平成26年8月豪雨災害」による八木地区の被災箇所について、23日より応急対策のための「進入路整備工事」を進めているところですが、本日18時現在の進捗状況について、情報提供いたします。

応急対策工事 活動状況 【進捗率30%】

<実施内容>

- ・整備予定延長 L = 1,770 m
- ・整備完了延長 L = 540 m (前日18時まで490 m)

※整備予定延長は生活道路も含めた延長に変更しました。

<活動内容>

- ・土石流による堆積土砂の撤去。 8月23日より着手。
- ・大型土のう一部設置
- ・応急対策工事は、太田川河川事務所災害協定業者が施工を行っています。

※ 本資料は、8月28日18時 時点でとりまとめたものです。

※ 本資料による数値については、現時点での速報値であり今後修正される場合があります。

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局

太田川河川事務所 082-222-9245 (災害対策支部直通)

【担当・問い合わせ先】

副所長 ^{えすみ} 江角 信良

工務第二課長 ^{まさき} 正木 俊英

ひろしま やぎ あさみなみ
土石流被害箇所への応急対策工事の対応状況（広島市安佐南区八木3～4丁目）

実施状況




実施状況



【平成26年8月28日 現在】
 応急対策内容 土砂撤去 L=1,770m
 着手日 平成26年8月23日 13時00分
 完成予定日 未定
 進捗率 30% (実施延長 L=540m)

大型土のう
 設置箇所

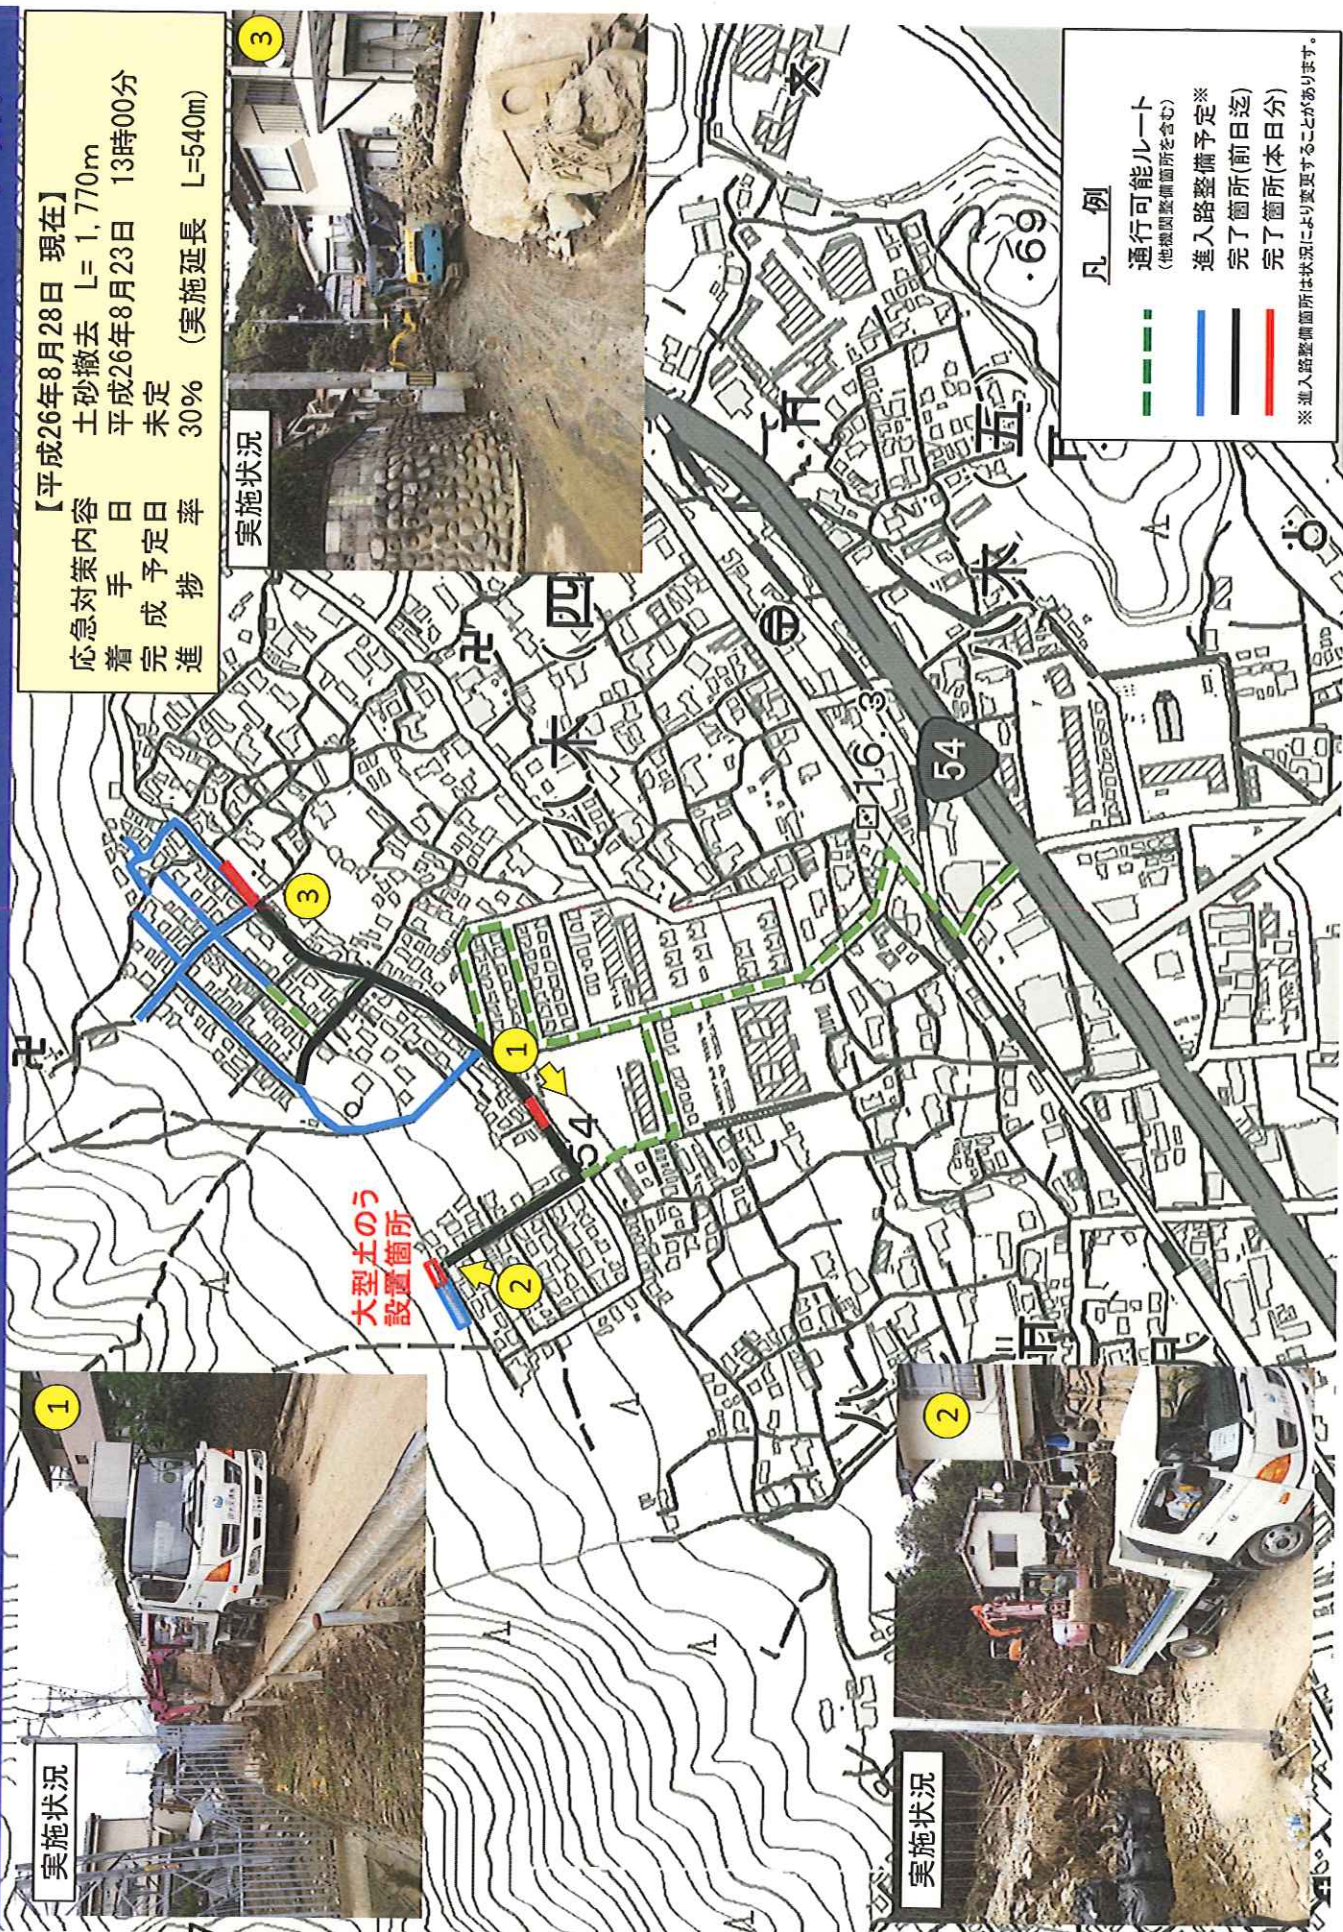

凡例

- 通行可能ルート
(他機関整備箇所を含む)
- 進入路整備予定※
- 完了箇所(前日迄)
- 完了箇所(本日分)

※進入路整備箇所は状況により変更することがあります。

実施状況

