

太田川河川事務所

記者発表・配付資料

記者発表資料  
配布日時

平成26年 8月30日  
19:00 配付

- 同時発表先 : 合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、  
中国地方建設記者クラブ

「平成26年8月豪雨災害」による  
土石流被害箇所の応急対策工事について  
可部東地区（第1報）

8月20日に発生した「平成26年8月豪雨災害」による「可部東地区」の被災箇所について、8月27日より応急対策工事を進めているところですが、本日18時現在の進捗状況について、情報提供いたします。

応急対策工事 活動状況

<実施内容>

- |       |       |     |               |
|-------|-------|-----|---------------|
| ・復旧内容 | 大型土のう | A箇所 | N = 150個      |
|       |       | B箇所 | N = 65個       |
|       |       | C箇所 | N = 400個      |
| ・復旧完了 | 大型土のう | A箇所 | N = 0個 (0%)   |
|       |       | B箇所 | N = 42個 (65%) |
|       |       | C箇所 | N = 0個 (0%)   |

<活動内容>

- ・土石流による流木撤去 8月27日より着手。
- ・大型土のう設置
- ・応急対策工事は、太田川河川事務所災害協定業者が施工を行っています。

※ 本資料は、8月30日18時 時点でとりまとめたものです。

※ 本資料による数値については、現時点での速報値であり今後修正される場合があります。

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局

太田川河川事務所 082-222-9245 (災害対策支部直通)

【担当・問い合わせ先】

副所長 えすみ 江角 信良

工務第二課長 まさき 正木 俊英

# 広島市安佐北区可部東6丁目 土石流被害箇所の応急対策工事の対応状況


【平成26年8月30日 現在】

応急対策内容:

- A箇所 未着手
- B箇所 大型土のう設置 N=65個
- C箇所 未着手

・B箇所

- 着手日:平成26年8月27日 14時00分
- 完成予定日:未定
- 進捗率:進入路整備 100%
- 大型土のう設置 A=42個 65%
- (平成26年8月30日現在)

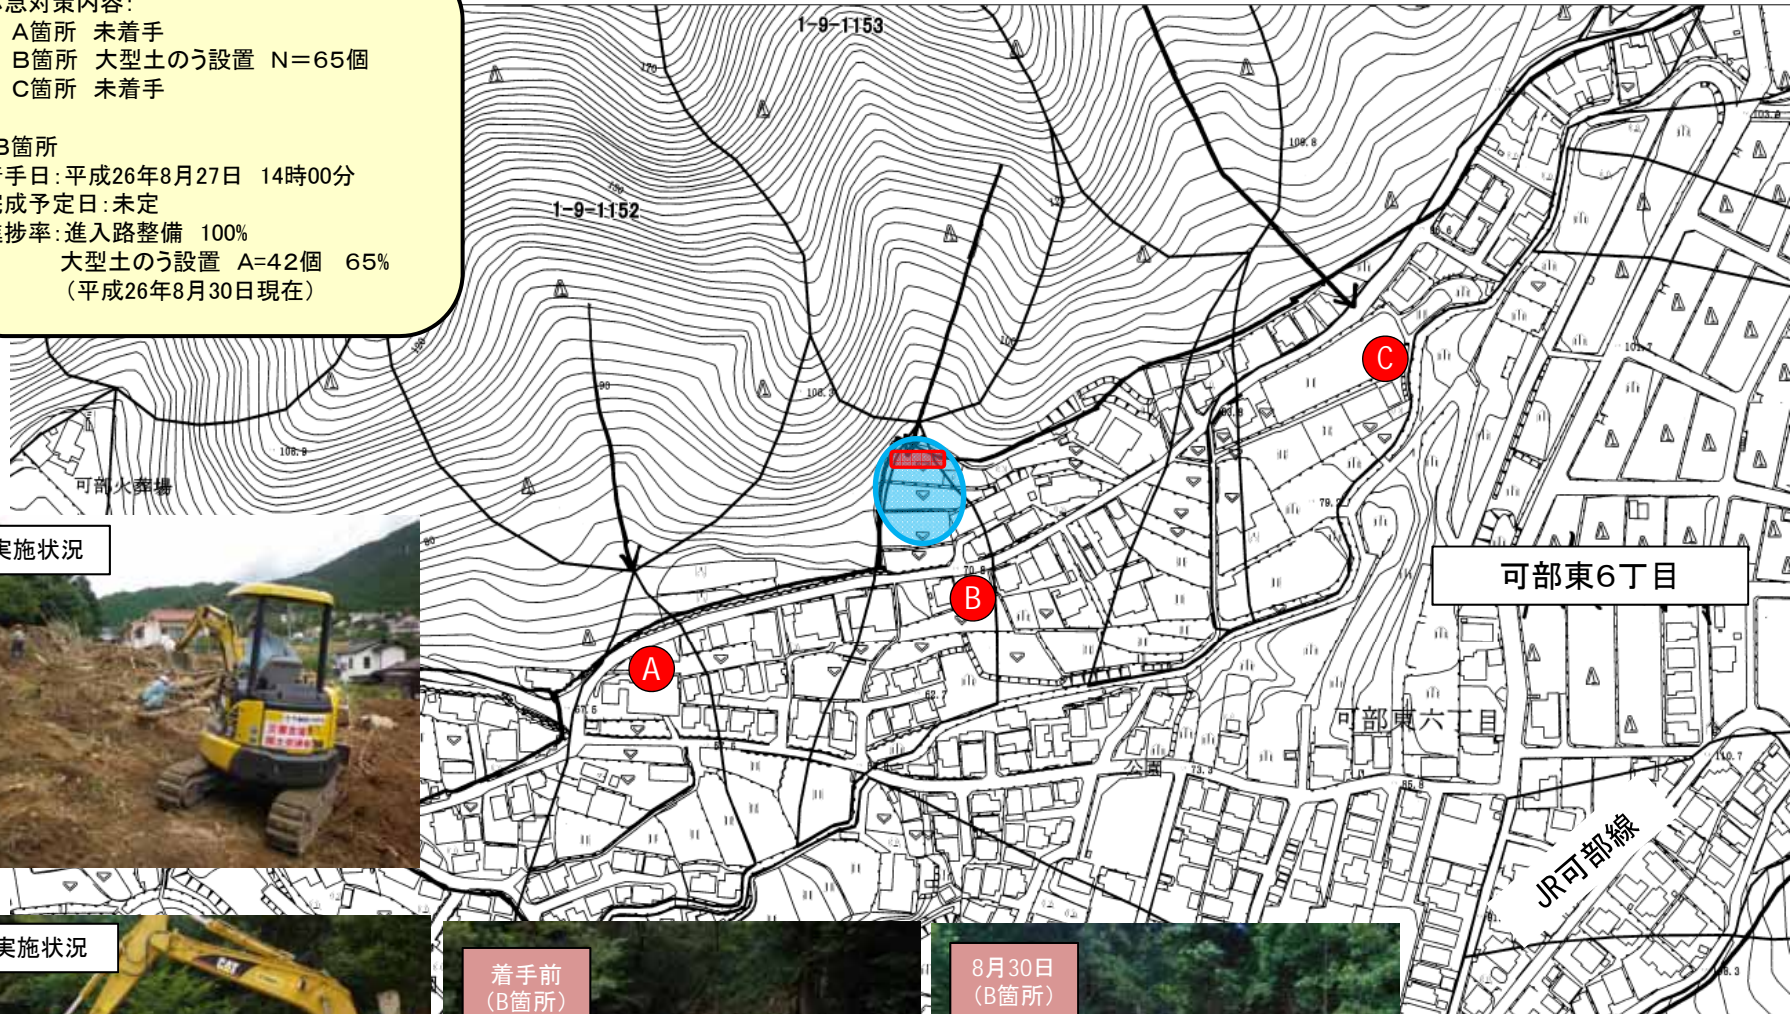

凡例

- 復旧予定範囲
- 完了箇所(前日迄)
- 完了箇所(本日分)

整備は現地状況により変更することがあります。
