



# 復旧作業 (10/17 17:00時点)



10月17日 17:00 撮影

## 【施工内容】

- ・進入路整備 : 8/21~8/22
- ・大型土のう : 8/24~8/30 計612袋
- ・水抜きボーリング : 8/20~9/29 計25本
- ・抑止矢板 : 8/20~9/7 L=28m
- ・モルタル吹付 : 9/10~9/21
- ・頭部排土 : 8/23~9/24
- ・鉄筋挿入 : 9/21~9/29 計70本
- ・転落防止柵 : 9/30~10/2
- ・法面処理 : 9/28~10/3
- ・防護柵設置中 : 9/30~10/8 L=136m
- ・舗装復旧 : 10/11
- ・仮設歩道 : 9/30~10/12
- ・区画線、安全施設等 : 10/12~10/17

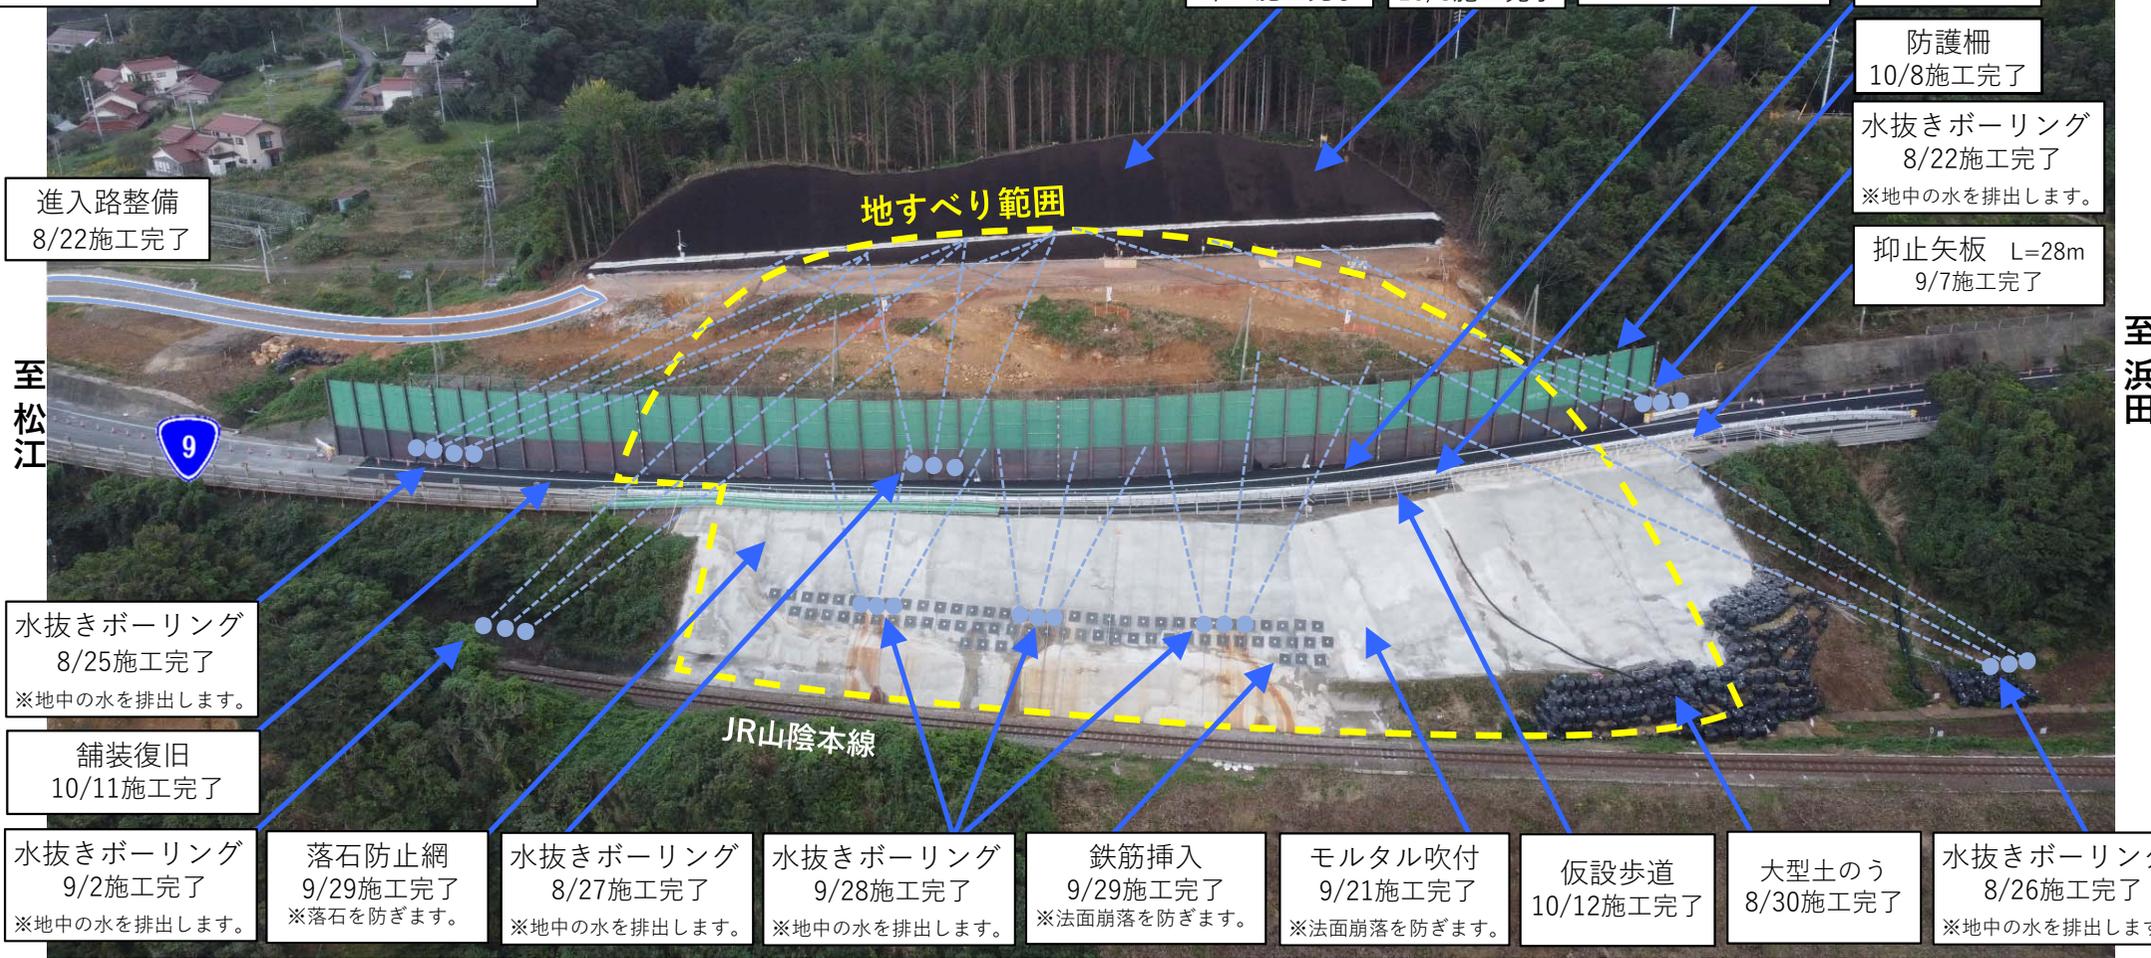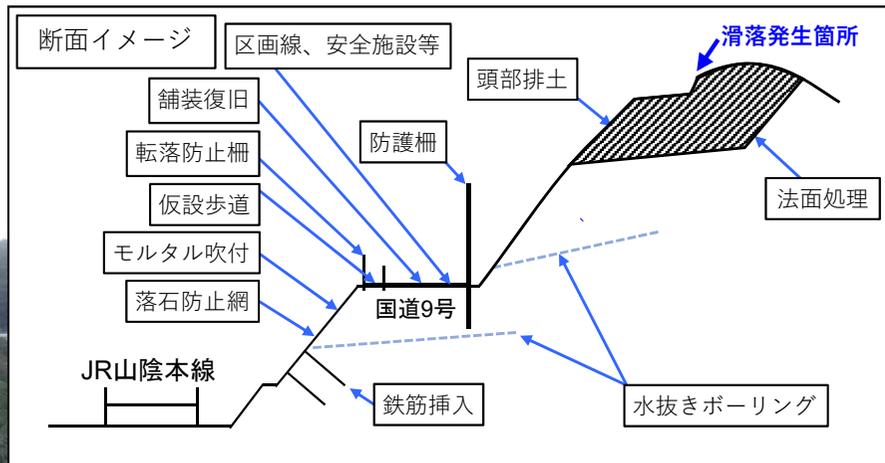

進入路整備  
8/22施工完了

水抜きボーリング  
8/25施工完了  
※地中の水を排出します。

舗装復旧  
10/11施工完了

水抜きボーリング  
9/2施工完了  
※地中の水を排出します。

落石防止柵  
9/29施工完了  
※落石を防ぎます。

水抜きボーリング  
8/27施工完了  
※地中の水を排出します。

水抜きボーリング  
9/28施工完了  
※地中の水を排出します。

鉄筋挿入  
9/29施工完了  
※法面崩落を防ぎます。

モルタル吹付  
9/21施工完了  
※法面崩落を防ぎます。

仮設歩道  
10/12施工完了

大型土のう  
8/30施工完了

水抜きボーリング  
8/26施工完了  
※地中の水を排出します。

頭部排土  
9/24施工完了

法面処理  
10/3施工完了

区画線、安全施設等  
10/17施工完了

転落防止柵  
10/2施工完了

防護柵  
10/8施工完了

水抜きボーリング  
8/22施工完了  
※地中の水を排出します。

抑止矢板 L=28m  
9/7施工完了

至  
浜田

至  
松江

地すべり範囲

JR山陰本線

国道9号

JR山陰本線

■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況（起点側）

8/21 8:00時点



10/17 17:00時点



■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況（終点側）

