


【三篠川(国管理区間)】平成30年7月豪雨対策進捗状況

令和6年8月末時点


- 平成30年7月豪雨により被災した護岸等については全て復旧済み。
- 平成30年7月豪雨と同規模の水位における浸水被害の軽減するため、
浸水被害が発生した堤防未整備の4箇所の堤防整備、及び堰改築、河道掘削等を実施中。
- 広島県管理区間の整備と併せた完成を目指す。

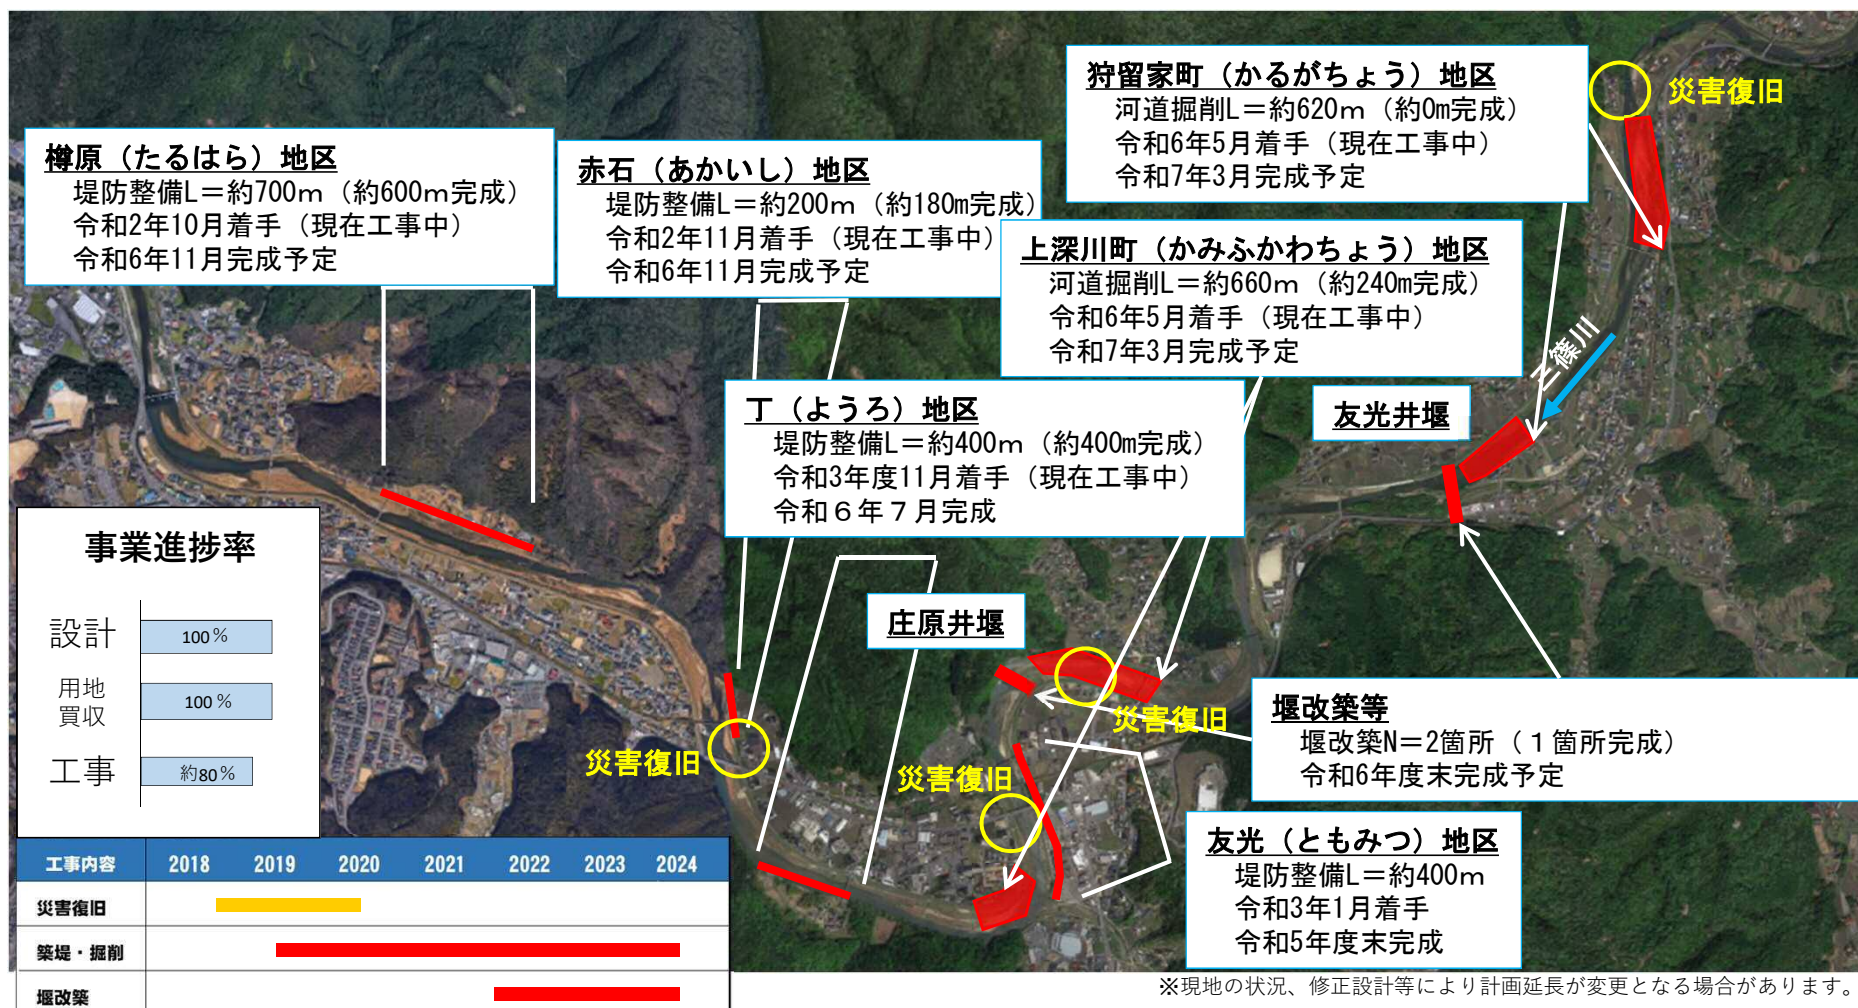

【三篠川】樽原地区工事進捗状況


令和6年8月末時点

- ・ 三篠川（樽原地区）において浸水被害防止のための築堤工事を実施しています。
- ・ 築堤工事が完成することで樽原地区において平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を軽減させることができます。

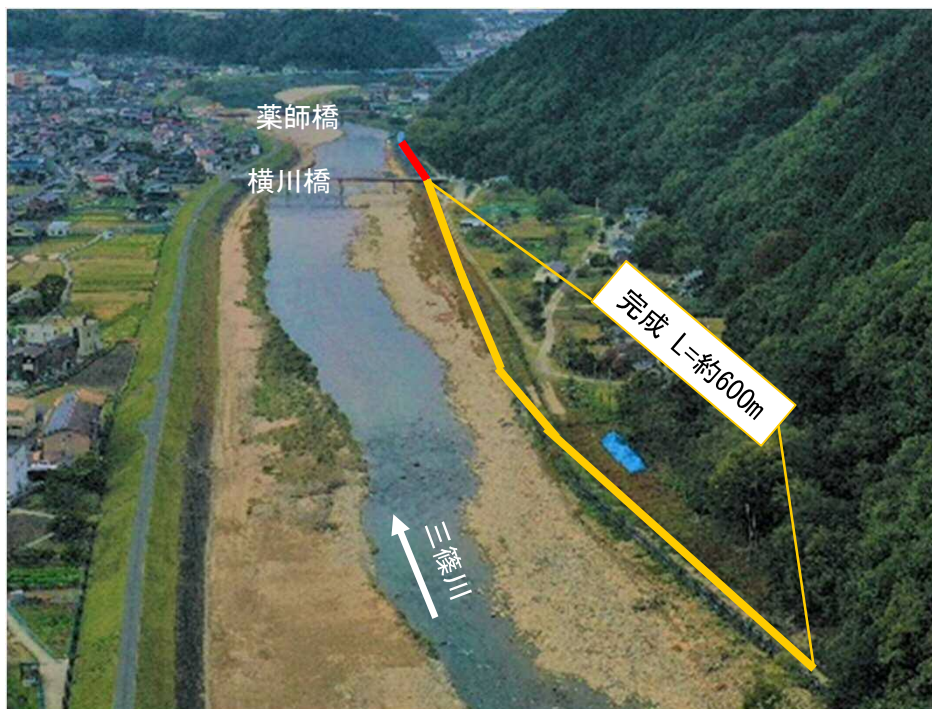

令和6年8月撮影

築堤イメージ

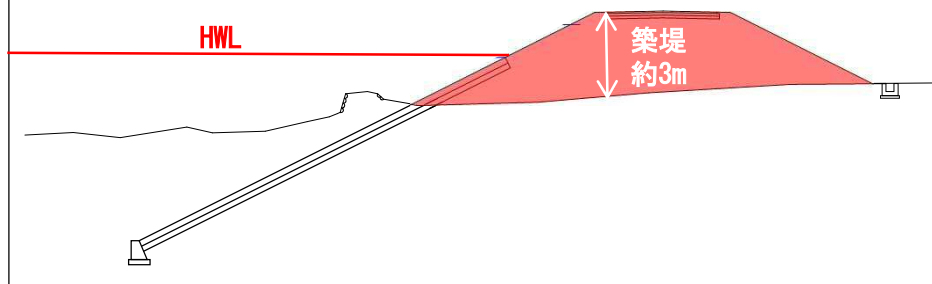

工事進捗状況

着手済：700m／700m【100%】

完 成：600m／700m【85%】

※現地の状況、修正設計等により計画延長が変更となる場合があります。

【三篠川】赤石地区工事進捗状況


令和6年8月末時点

- ・ 三篠川（赤石地区）において浸水被害防止のための築堤工事を実施しています。
- ・ 築堤工事が完成することで赤石地区において平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を軽減させることができます。



令和6年8月撮影

築堤イメージ

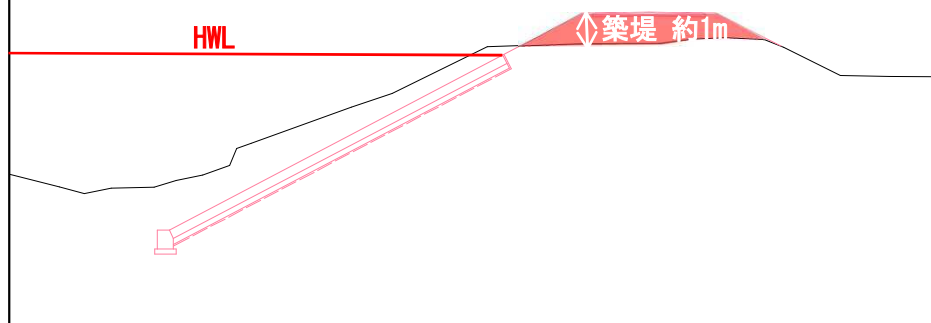

工事進捗状況

着手済：200m／200m【100%】

完 成：180m／200m【90%】

※現地の状況、修正設計等により計画延長が変更となる場合があります。

【三篠川】丁地区工事進捗状況


完成

令和6年8月末時点

- ・ 三篠川（丁地区）において浸水被害防止のための築堤工事を実施しています。
- ・ 築堤工事が完成することで丁地区において平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を軽減させることができます。



令和6年8月撮影

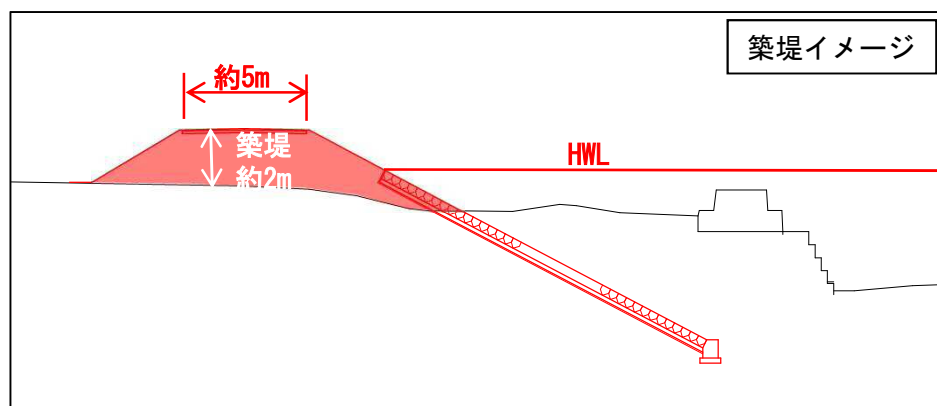

築堤イメージ

工事進捗状況

着手済：400m／400m【100%】

完 成：400m／400m【100%】

※現地の状況、修正設計等により計画延長が変更となる場合があります。

【三篠川】友光地区工事進捗状況


完成

令和6年3月末時点

- ・ 三篠川（友光地区）において浸水被害防止のための築堤護岸工事を実施しています。
- ・ 築堤護岸工事が完成することで友光地区において平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を軽減させることができます。



令和6年3月撮影

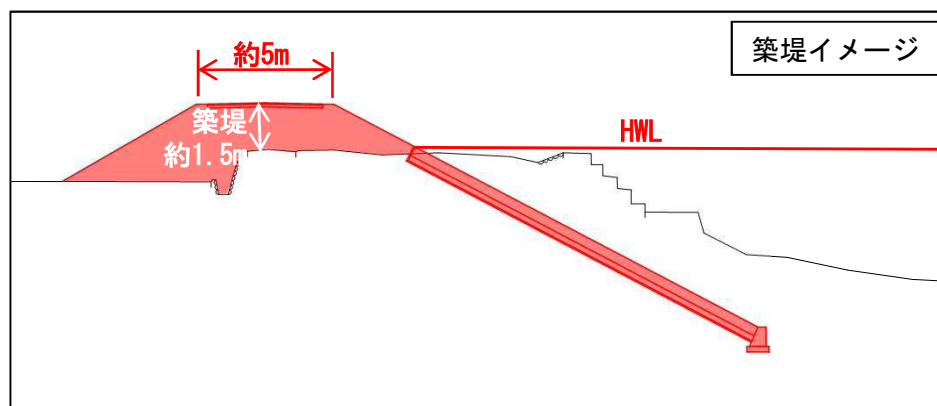

工事進捗状況

着手済：400m／400m【100%】

完 成：400m／400m【100%】



※現地の状況、修正設計等により計画延長が変更となる場合があります。

【三篠川】庄原井堰撤去工事進捗状況

完成

令和6年3月末時点

- ・ 水位低下のための取水堰の撤去、取水堰の代わりとなる取水施設の設置工事を実施しています。
- ・ 取水堰の撤去により洪水時の水位が低下し、平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を軽減させることができます。

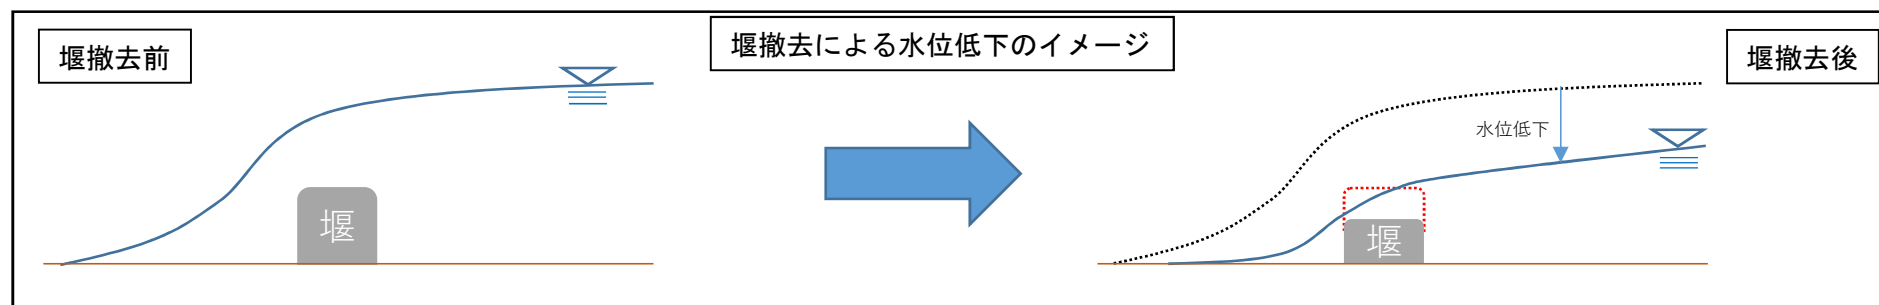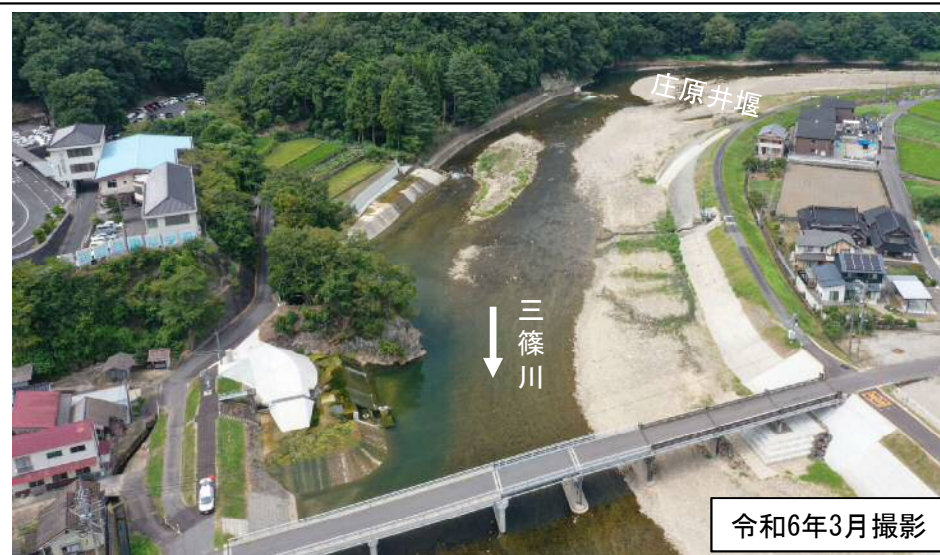

工事進捗状況

着手済：250m／250m【100%】

完 成：250m／250m【100%】

※現地の状況、修正設計等により計画延長が変更となる場合があります。


【三篠川】狩留家地区堤防整備外工事進捗状況

- ・ 水位低下のための取水堰の切り下げ、堰切り下げに合わせた堤外用水路の改良および導流堤の改良を実施しています。
- ・ 取水堰の切り下げにより洪水時の水位が低下し、平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を軽減させることができます。




令和6年8月撮影


堰撤去による水位低下のイメージ



堤外用水路の改良イメージ



導流堤の改良イメージ



工事進捗状況

着手済： 0m／500m 【 0%】
完 成： 0m／500m 【 0%】

※現地の状況、修正設計等により計画延長が変更となる場合があります。


【三篠川】上深川町地区河道掘削工事進捗状況

令和6年8月末時点

- ・ 三篠川（上深川町地区）において浸水被害防止のための河道掘削工事を実施しています。
- ・ 掘削工事により洪水時の水位が低下し、平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を軽減させることができます。



河道掘削による水位低下のイメージ



工事進捗状況

着手済： 660m／660m 【100%】

完 成： 240m／660m 【 36%】

※現地の状況、修正設計等により計画延長が変更となる場合があります。


【三篠川】狩留家町地区河道掘削工事進捗状況

令和6年8月末時点

- ・ 三篠川（狩留家町地区）において浸水被害防止のための河道掘削工事を実施しています。
- ・ 掘削工事により洪水時の水位が低下し、平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を軽減させることができます。



河道掘削による水位低下のイメージ



工事進捗状況

着手済： 0m／620m 【 0% 】
完 成： 0m／620m 【 0% 】

※現地の状況、修正設計等により計画延長が変更となる場合があります。
