

令和7年3月末時点

事業進捗率

設計	用地 買収	工事
100%	100%	約92%

工事内容

工事内容	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
災害復旧								
築堤・掘削								
堰改築								

樽原（たるはら）地区
堤防整備L＝約700m
令和2年10月着手
令和6年10月完成

赤石（あかいし）地区
堤防整備L＝約200m
令和2年11月着手
令和6年10月完成

上深川町（かみふかわちょう）地区
河道掘削L＝約660m
令和6年5月着手
令和6年10月完成

狩留家町（かるがちょう）地区
河道掘削L＝約620m（約370m完成）
令和6年5月着手（現在工事中）
令和7年6月完成予定

友光井堰
堰改築等
堰改築N＝2箇所
令和7年3月完成

友光（ともみつ）地区
堤防整備L＝約400m
令和3年1月着手
令和6年3月完成

丁（ようろ）地区
堤防整備L＝約400m
令和3年11月着手
令和6年7月完成

庄原井堰


災害復旧

※現地の状況、修正設計等により計画延長が変更となる場合があります。

【三篠川】樽原地区工事進捗状況


令和6年10月完成

- ・ 三篠川（樽原地区）において浸水被害防止のための築堤工事を実施しています。
- ・ 築堤工事が完成することで樽原地区において平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を軽減させることができます。

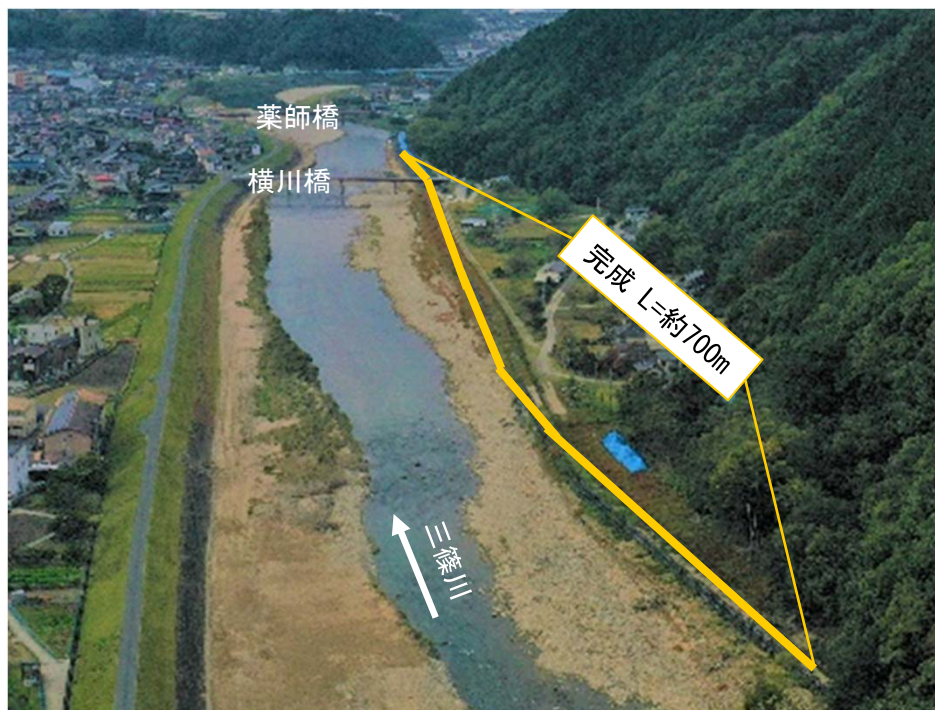

令和6年11月撮影

築堤イメージ

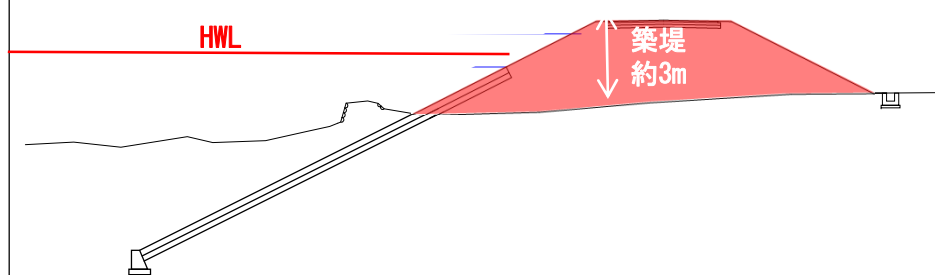

工事進捗状況

着手済：700m／700m【100%】

完 成：700m／700m【100%】

※現地の状況、修正設計等により計画延長が変更となる場合があります。

【三篠川】赤石地区工事進捗状況


令和6年10月完成

- ・ 三篠川（赤石地区）において浸水被害防止のための築堤工事を実施しています。
- ・ 築堤工事が完成することで赤石地区において平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を軽減させることができます。



令和6年11月撮影

築堤イメージ

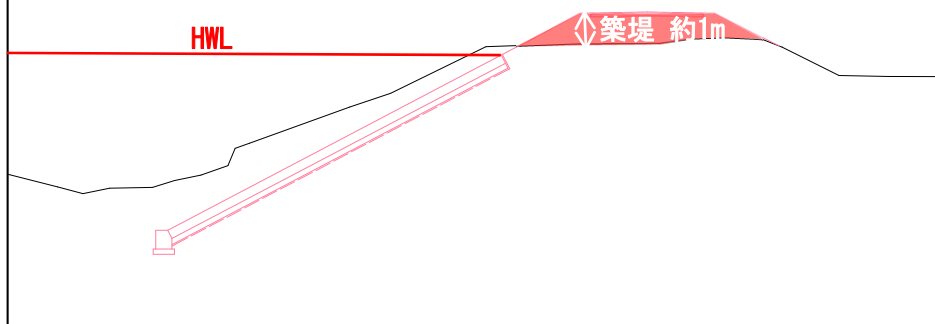

工事進捗状況

着手済：200m／200m【100%】

完 成：200m／200m【100%】

※現地の状況、修正設計等により計画延長が変更となる場合があります。


【三篠川】丁地区工事進捗状況

令和6年7月完成

- ・ 三篠川（丁地区）において浸水被害防止のための築堤工事を実施しています。
- ・ 築堤工事が完成することで丁地区において平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を軽減させることができます。



令和6年8月撮影

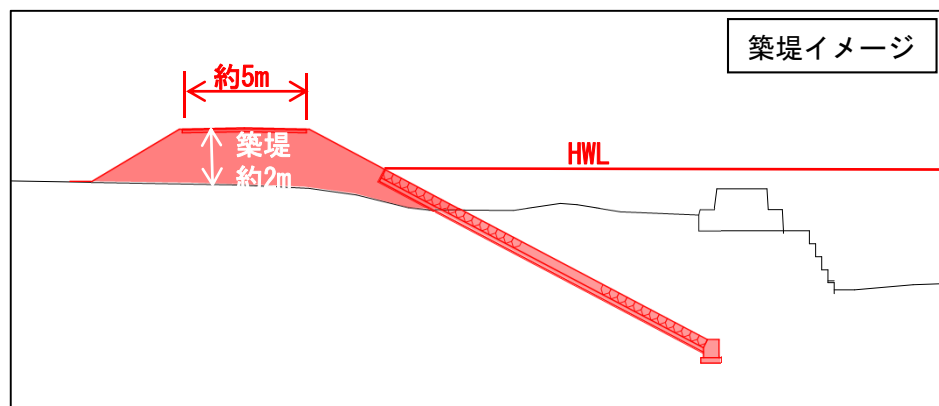

工事進捗状況

着手済：400m／400m【100%】

完 成：400m／400m【100%】

※現地の状況、修正設計等により計画延長が変更となる場合があります。


【三篠川】友光地区工事進捗状況

令和6年3月完成

- ・ 三篠川（友光地区）において浸水被害防止のための築堤護岸工事を実施しています。
- ・ 築堤護岸工事が完成することで友光地区において平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を軽減させることができます。



令和6年3月撮影

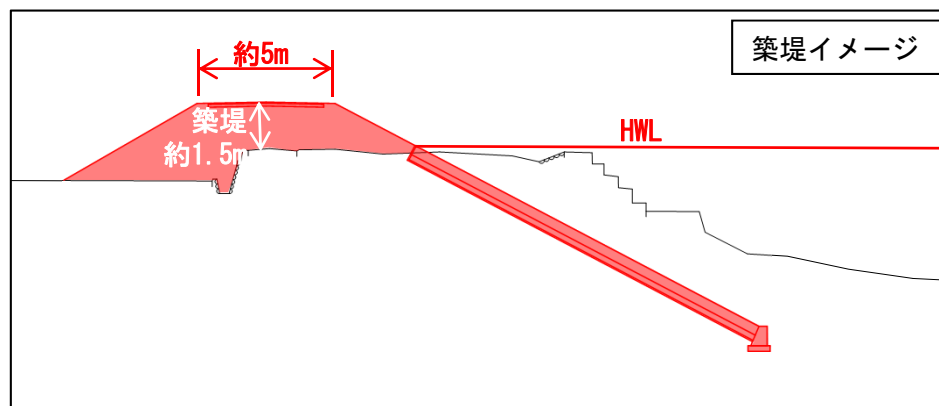

工事進捗状況

着手済：400m／400m【100%】


完 成：400m／400m【100%】

※現地の状況、修正設計等により計画延長が変更となる場合があります。

【三篠川】庄原井堰撤去工事進捗状況

令和6年3月完成

- ・ 水位低下のための取水堰の撤去、取水堰の代わりとなる取水施設の設置工事を実施しています。
- ・ 取水堰の撤去により洪水時の水位が低下し、平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を軽減させることができます。

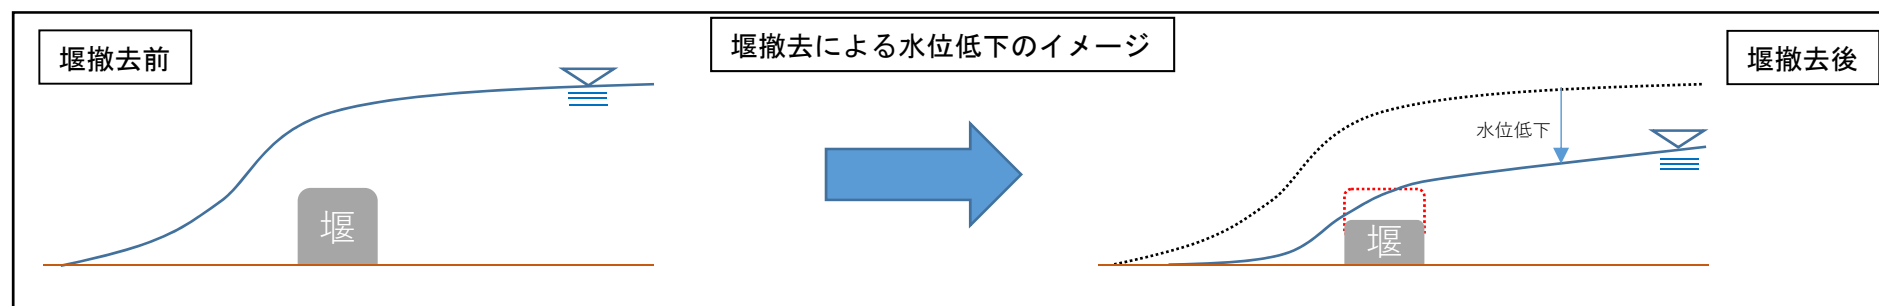

工事進捗状況

着手済：250m／250m【100%】

完 成：250m／250m【100%】

※現地の状況、修正設計等により計画延長が変更となる場合があります。

【三篠川】狩留家地区堤防整備外工事進捗状況


令和7年3月末時点

- ・ 水位低下のための取水堰の切り下げ、堰切り下げに合わせた堤外用水路の改良および導流堤の改良を実施しています。
- ・ 取水堰の切り下げにより洪水時の水位が低下し、平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を軽減させることができます。




令和7年3月撮影


堰撤去による水位低下のイメージ



堤外用水路の改良イメージ



導流堤の改良イメージ



工事進捗状況

着手済：500m／500m 【100%】

完 成：440m／500m 【 88%】

※現地の状況、修正設計等により計画延長が変更となる場合があります。


【三篠川】上深川町地区河道掘削工事進捗状況

令和6年10月完成

- ・ 三篠川（上深川町地区）において浸水被害防止のための河道掘削工事を実施しています。
- ・ 掘削工事により洪水時の水位が低下し、平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を軽減させることができます。



河道掘削による水位低下のイメージ



工事進捗状況

着手済： 660m／660m 【100%】

完 成： 660m／660m 【100%】

※現地の状況、修正設計等により計画延長が変更となる場合があります。


【三篠川】狩留家町地区河道掘削工事進捗状況

令和7年3月末時点

- ・ 三篠川（狩留家町地区）において浸水被害防止のための河道掘削工事を実施しています。
- ・ 掘削工事により洪水時の水位が低下し、平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を軽減させることができます。



河道掘削による水位低下のイメージ



工事進捗状況

着手済： 620m／620m 【100%】

完 成： 370m／620m 【60%】

※現地の状況、修正設計等により計画延長が変更となる場合があります。
