


【小瀬川】事業進捗状況

令和6年3月末時点

- ・ 小瀬川（防鹿・小川津地区）において洪水対策のための築堤工事等を実施しています。
- ・ 事業が完了することで、洪水氾濫による家屋等の浸水被害を軽減します。





小川津地区堤防施工状況（令和5年9月撮影）

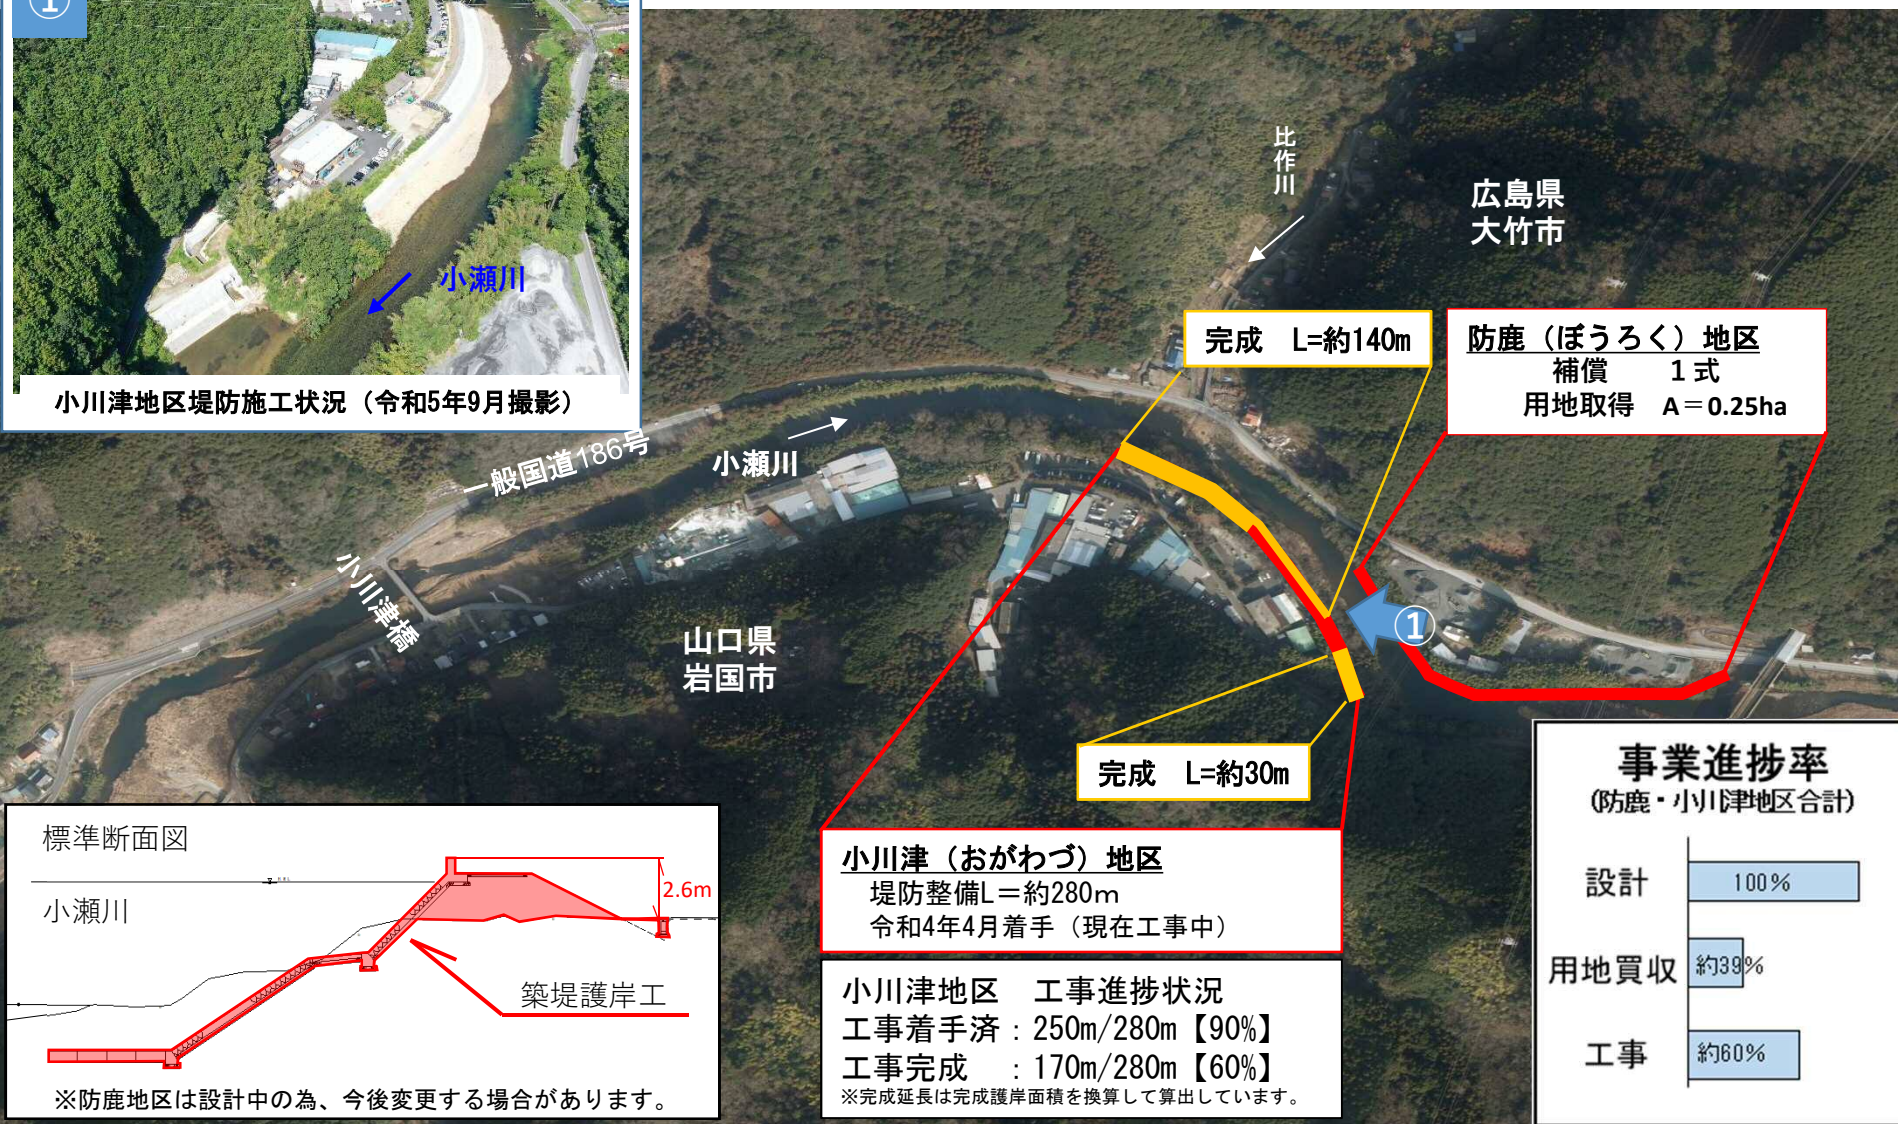

防鹿（ぼうろく）地区
補償 1式
用地取得 A=0.25ha

小川津（おがわづ）地区
堤防整備L=約280m
令和4年4月着手（現在工事中）

小川津地区 工事進捗状況
工事着手済：250m/280m【90%】
工事完成：170m/280m【60%】
※完成延長は完成護岸面積を換算して算出しています。

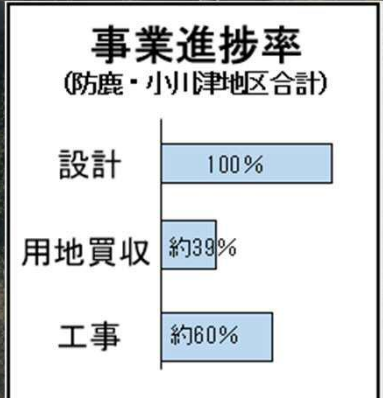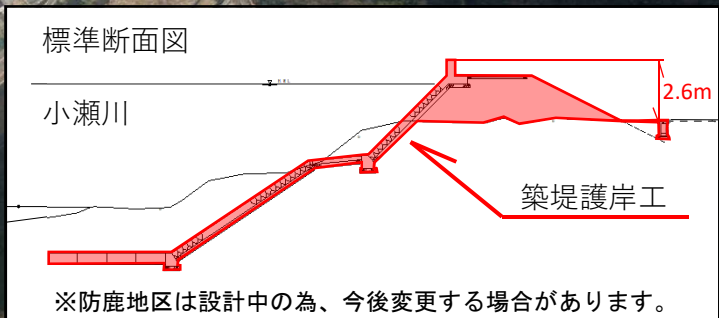


【小瀬川河口部】高潮・耐震・浸透対策進捗状況(国道2号～中市堰①)

令和6年3月末時点

令和5年11月完成

- ・小瀬川河口部において高潮対策工事を実施します。
- ・工事が完成することで高潮被害に対する安全性が向上し、浸水被害を軽減します。

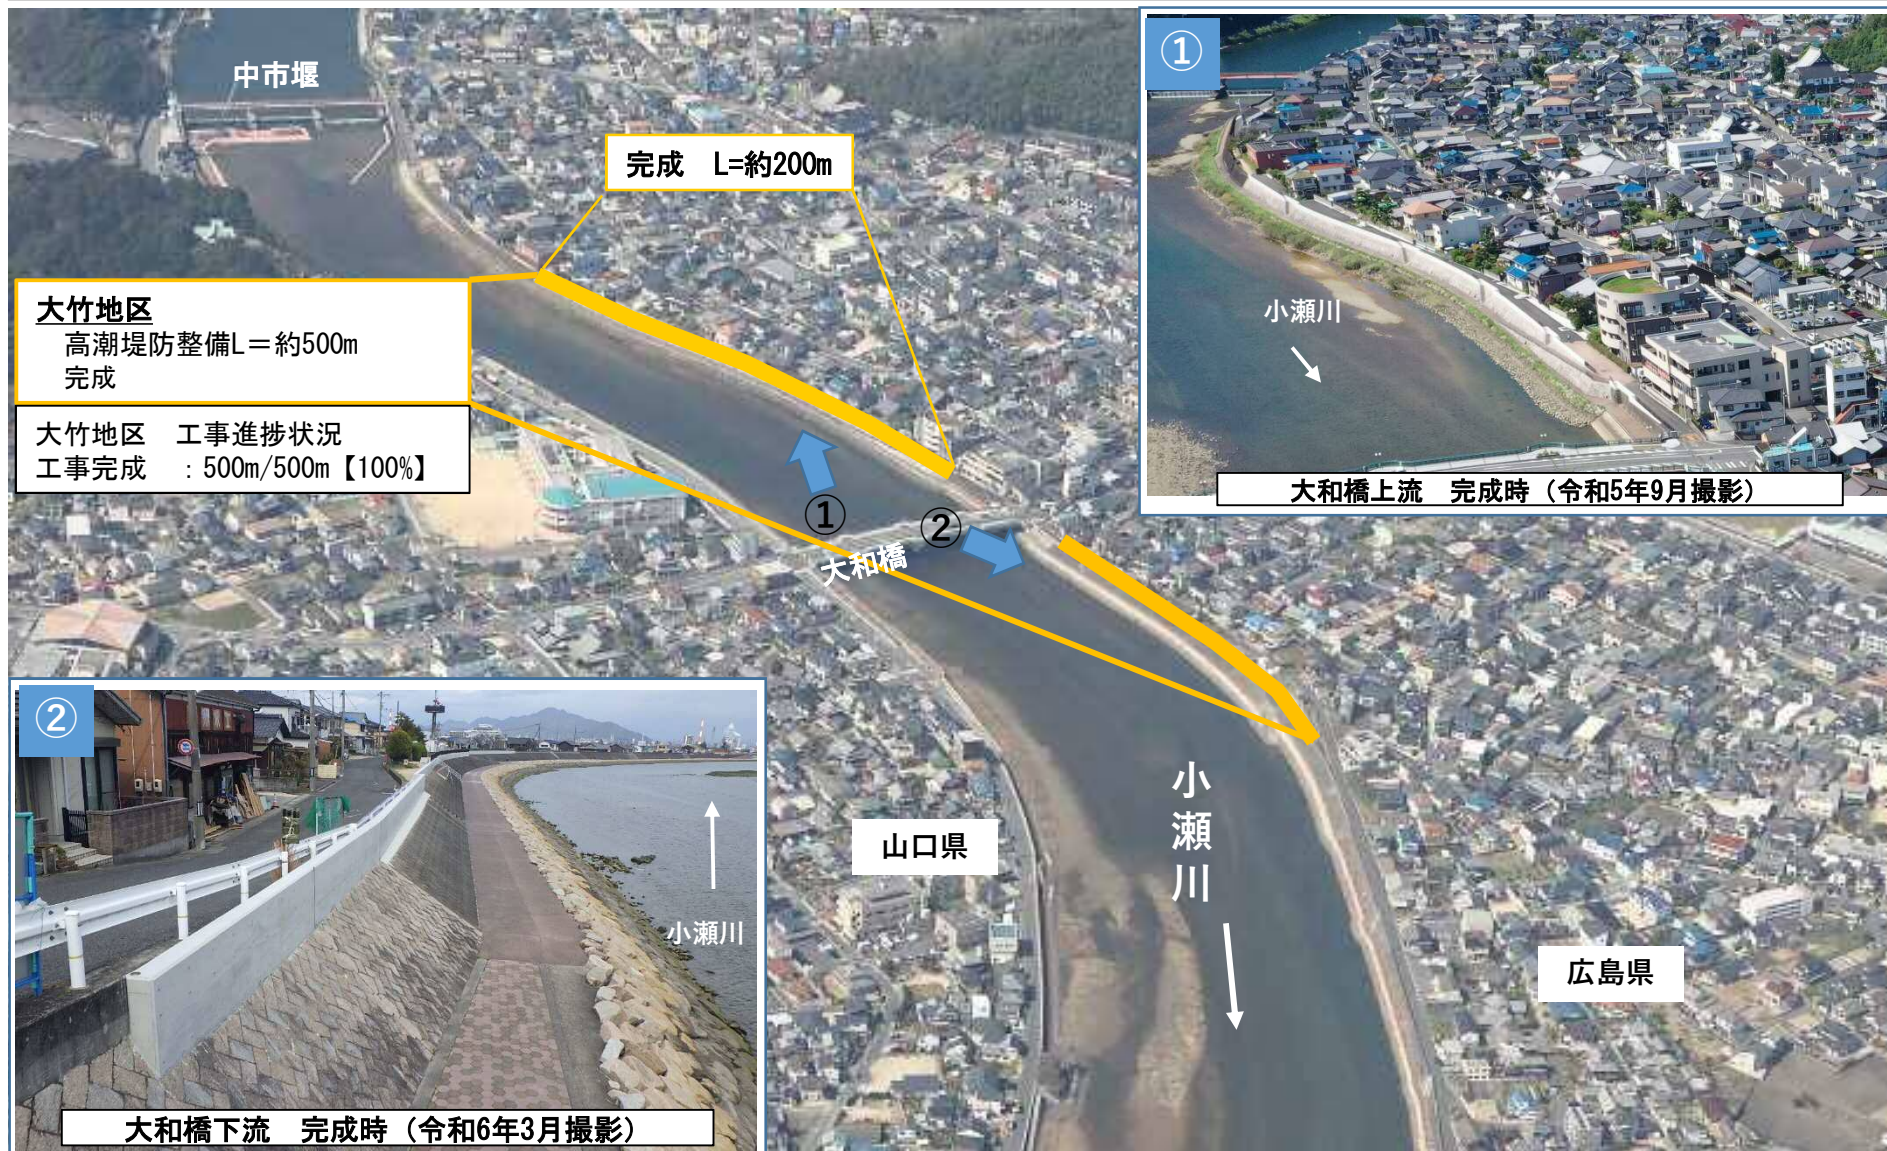

【小瀬川河口部】高潮・耐震・浸透対策進捗状況(国道2号～中市堰②)

令和6年3月末時点

- ・小瀬川河口部において高潮対策工事を実施します。
- ・工事が完成することで高潮被害に対する安全性が向上し、浸水被害を軽減します。

