

直轄砂防災害関連緊急事業の進捗状況について（第 5 報）

平成 21 年 7 月 21 日に山口県防府市で発生した土石流災害に対し、山口県知事の要請を受けて、国土交通省による直轄砂防災害関連緊急事業として採択されました。溪流内に堆積した不安定土砂の再移動等による二次災害防止及び再度災害防止を図ります。現時点の事業の進捗状況は以下のとおりです。

平成 21 年 9 月 30 日現在

箇所名	主な実施内容	工事進捗状況
剣 川 ・事業採択：7 月 31 日 ・地先：防府市大字下右田字勝坂 ・事業内容：砂防えん堤 1 基	8 月 1 日 現地測量着手 8 月 2 日 用地関係調査着手 8 月 3 日 進入路工事着手 砂防指定地協議着手 8 月 9 日 地元説明会開催 8 月 26 日 砂防指定地告示 9 月 3 日 えん堤工事契約	進入路(延長 400m)概成 詳細設計中 ボーリング調査着手(9/14) ボーリング完(9/24)
神里川 ・事業採択：7 月 31 日 ・地先：防府市大字高井字神里 ・事業内容：砂防えん堤 1 基	8 月 1 日 現地測量着手 8 月 2 日 用地関係調査着手 8 月 3 日 砂防指定地協議着手 8 月 6 日 進入路工事着手 8 月 12 日 水路付替完了※ 8 月 26 日 砂防指定地告示 9 月 4 日 えん堤工事契約	進入路(延長 200m)概成 詳細設計中 ボーリング調査着手(9/14) ボーリング完(9/24) ※土石流で流れが変わった 水路を元の流れへ付替
上田南川 ・事業採択：7 月 31 日 ・地先：防府市大字真尾字上田 ・事業内容：砂防えん堤 1 基	8 月 1 日 現地測量着手 8 月 2 日 用地関係調査着手 8 月 3 日 砂防指定地協議着手 8 月 4 日 進入路工事着手 8 月 10 日 地元説明会開催 8 月 26 日 砂防指定地告示 9 月 4 日 えん堤工事契約	進入路(延長 660m)概成 詳細設計中 ボーリング調査着手(9/8) ボーリング完(9/12)
奈美川（松ヶ谷川） ・事業採択：8 月 7 日 ・地先：防府市大字奈美 ・事業内容：砂防えん堤 1 基	8 月 8 日 現地測量着手 8 月 10 日 用地関係調査着手 8 月 27 日 地元説明会開催 9 月 1 日 砂防指定地告示	(既設道路が通行可能であり 工事用の進入路は不要)
素 川 ・事業採択：8 月 7 日 ・地先：防府市大字大崎 ・事業内容：砂防えん堤 1 基	8 月 8 日 現地測量着手 8 月 10 日 用地関係調査着手 8 月 11 日 土砂撤去着手 8 月 20 日 鉄道高架橋付近の土 砂撤去完了 9 月 1 日 砂防指定地告示 9 月 11 日 えん堤工事契約	鉄道高架橋付近(進入路・水 路部)土砂撤去完了 進入路完成 ボーリング着手(9/19) ボーリング調査中

※国土交通省山口河川国道事務所による砂防工事の進捗状況については、随時、中国地方整備局ホームページにおいて発信します。

<http://www.cgr.mlit.go.jp/>

問 い 合 わ せ 先	
国土交通省山口河川国道事務所	現地復旧対策チーム 電話 0853-22-1785 (代)
チームリーダー	田辺 裕和 (内線 204)
サブリーダー	藤原 寛 (内線 509)

山口県防府市での直轄砂防災害関連緊急事業の進捗状況

平成21年9月30日現在
(第5報)



つるぎがわ
▲剣川 ボーリング調査状況

090918撮影





かみさとがわ
▲神里川 ボーリング調査状況

090918撮影



すがわ
▲素川 ボーリング調査状況

090928撮影

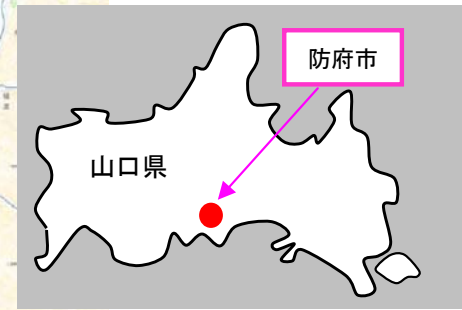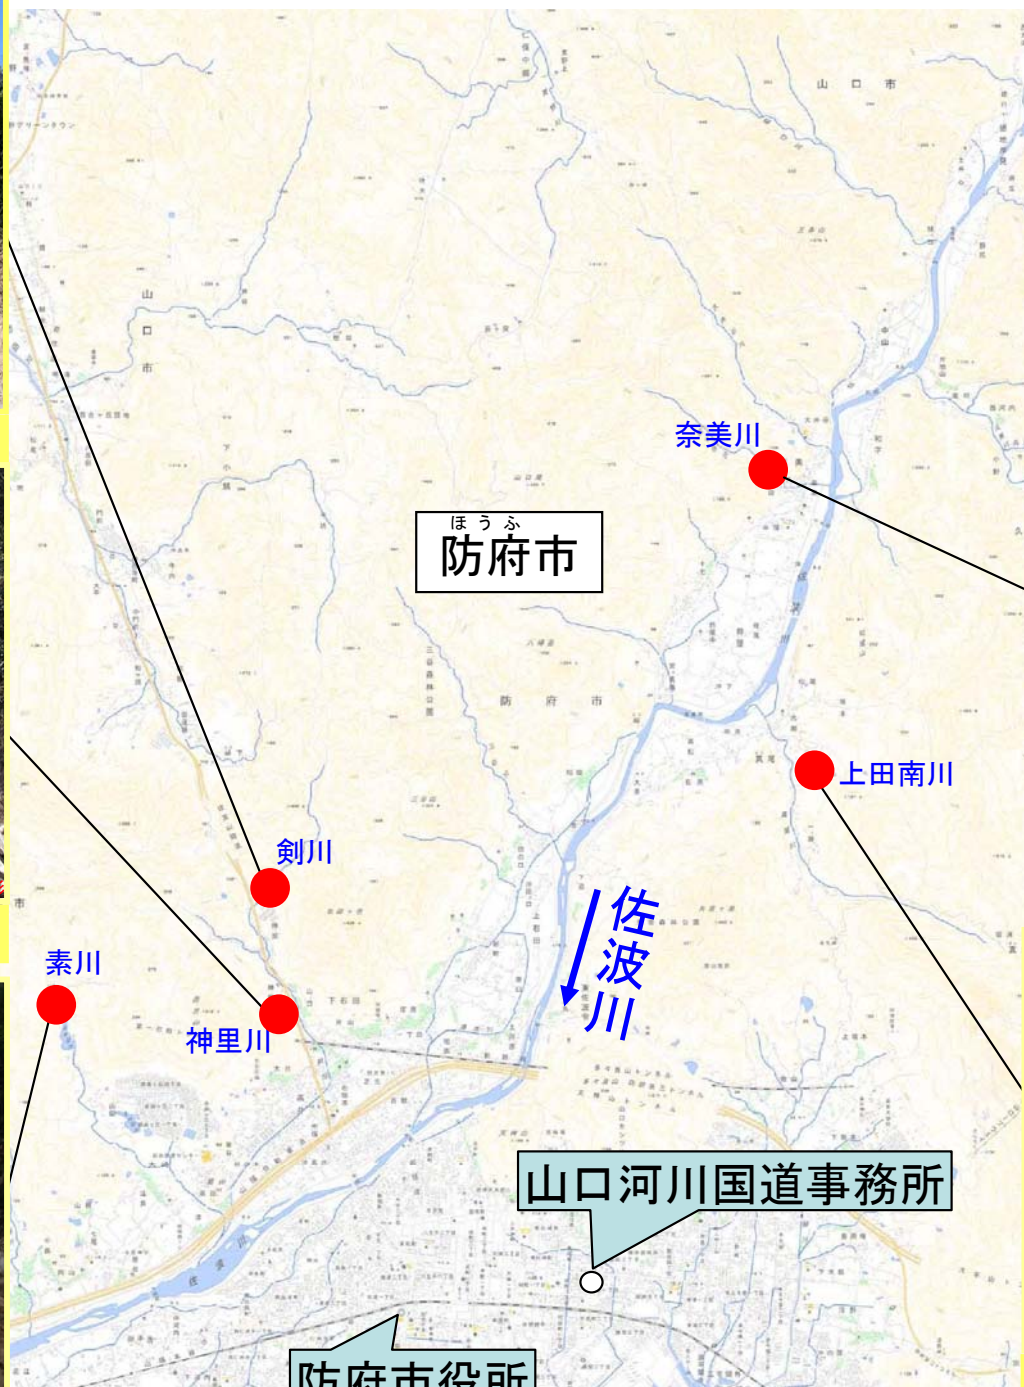

なみがわ
▲奈美川 えん堤予定地付近を下流より望む



うだみなみがわ
▲上田南川 えん堤予定地付近を下流より望む

H21.9.18撮影
