

緊急対策特定区間事業進捗

令和7年6月時点

※国土交通省の事業対象のみ掲載

江の川中下流域 地区毎の治水対策一覧(図)

令和3年8月大雨による浸水状況



令和2年7月豪雨による浸水状況



平成30年7月豪雨による浸水状況



※事業完了地区は地区毎の進捗未掲載

八神地区(上流)～水害に強い八神地区を創る治水事業～

- 八神地区(八神上流地区)は、平成29年5月に買収完了。
- 令和3年3月に堤防部分完成。
- 令和4年3月に国道261号嵩上げ区間が完了し、一連区間の整備が完了。

【進捗状況】 令和7年6月末時点

設計	
用地・補償	
工事	



H30年7月洪水(写真①)



H30年7月洪水(写真②)




八神地区(下流)～水害に強い八神地区を創る治水事業～

- 令和5年12月に買収完了。
- 令和5年6月に堤防約340m区間が完了。整備延長810mのうち約80%完成。
- 令和7年度に地区の上下流端部分の築堤盛土を実施し、樋門の扉体部分を残し概成予定。




【進捗状況】 令和7年6月末時点

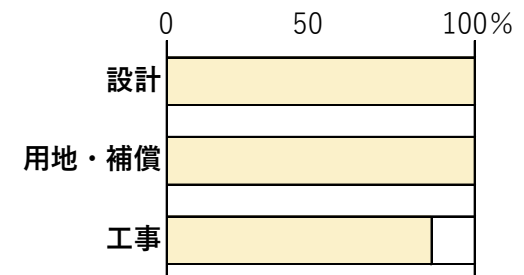

八神地区(太田)～水害に強い八神地区を創る治水事業～

- 八神地区(太田地区)は、平成28年度より事業(用地買収)着手。
- 令和5～6年度に用地買収完了箇所では埋蔵文化財発掘調査を実施。
- 令和7年度は取水堰等の設計を実施予定。

【進捗状況】 令和7年6月末時点

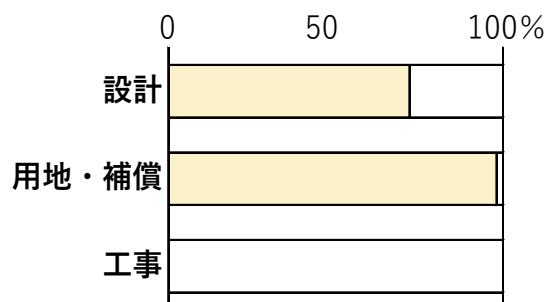

田野・赤栗地区 ～災害に強い田野地区を創るまちづくり事業～

- 宅地嵩上げ及び堤防整備(輪中堤)による浸水対策。
- 水害や土砂災害の危険を回避した地区内外の安全な場所へ移転。
- 令和6年度は、道路詳細設計、樋門詳細設計及び設計に必要な地質調査を実施。
- 事業に必要な範囲に用地幅杭を設置し、用地調査を実施予定。

【R3年11月撮影】

【進捗状況】

令和7年6月末時点

0 50 100%

設計

用地・補償

工事

H30年7月豪雨浸水範囲

輪中堤 L=約300m


江の川 →

至 赤栗 →

長良地区【家屋個別移転・防災集団移転】

- 水害や土砂災害の危険を回避した地区外の安全な場所へ移転。
- 令和6年度～令和7年度で、移転補償を実施予定。

H30年7月豪雨浸水範囲

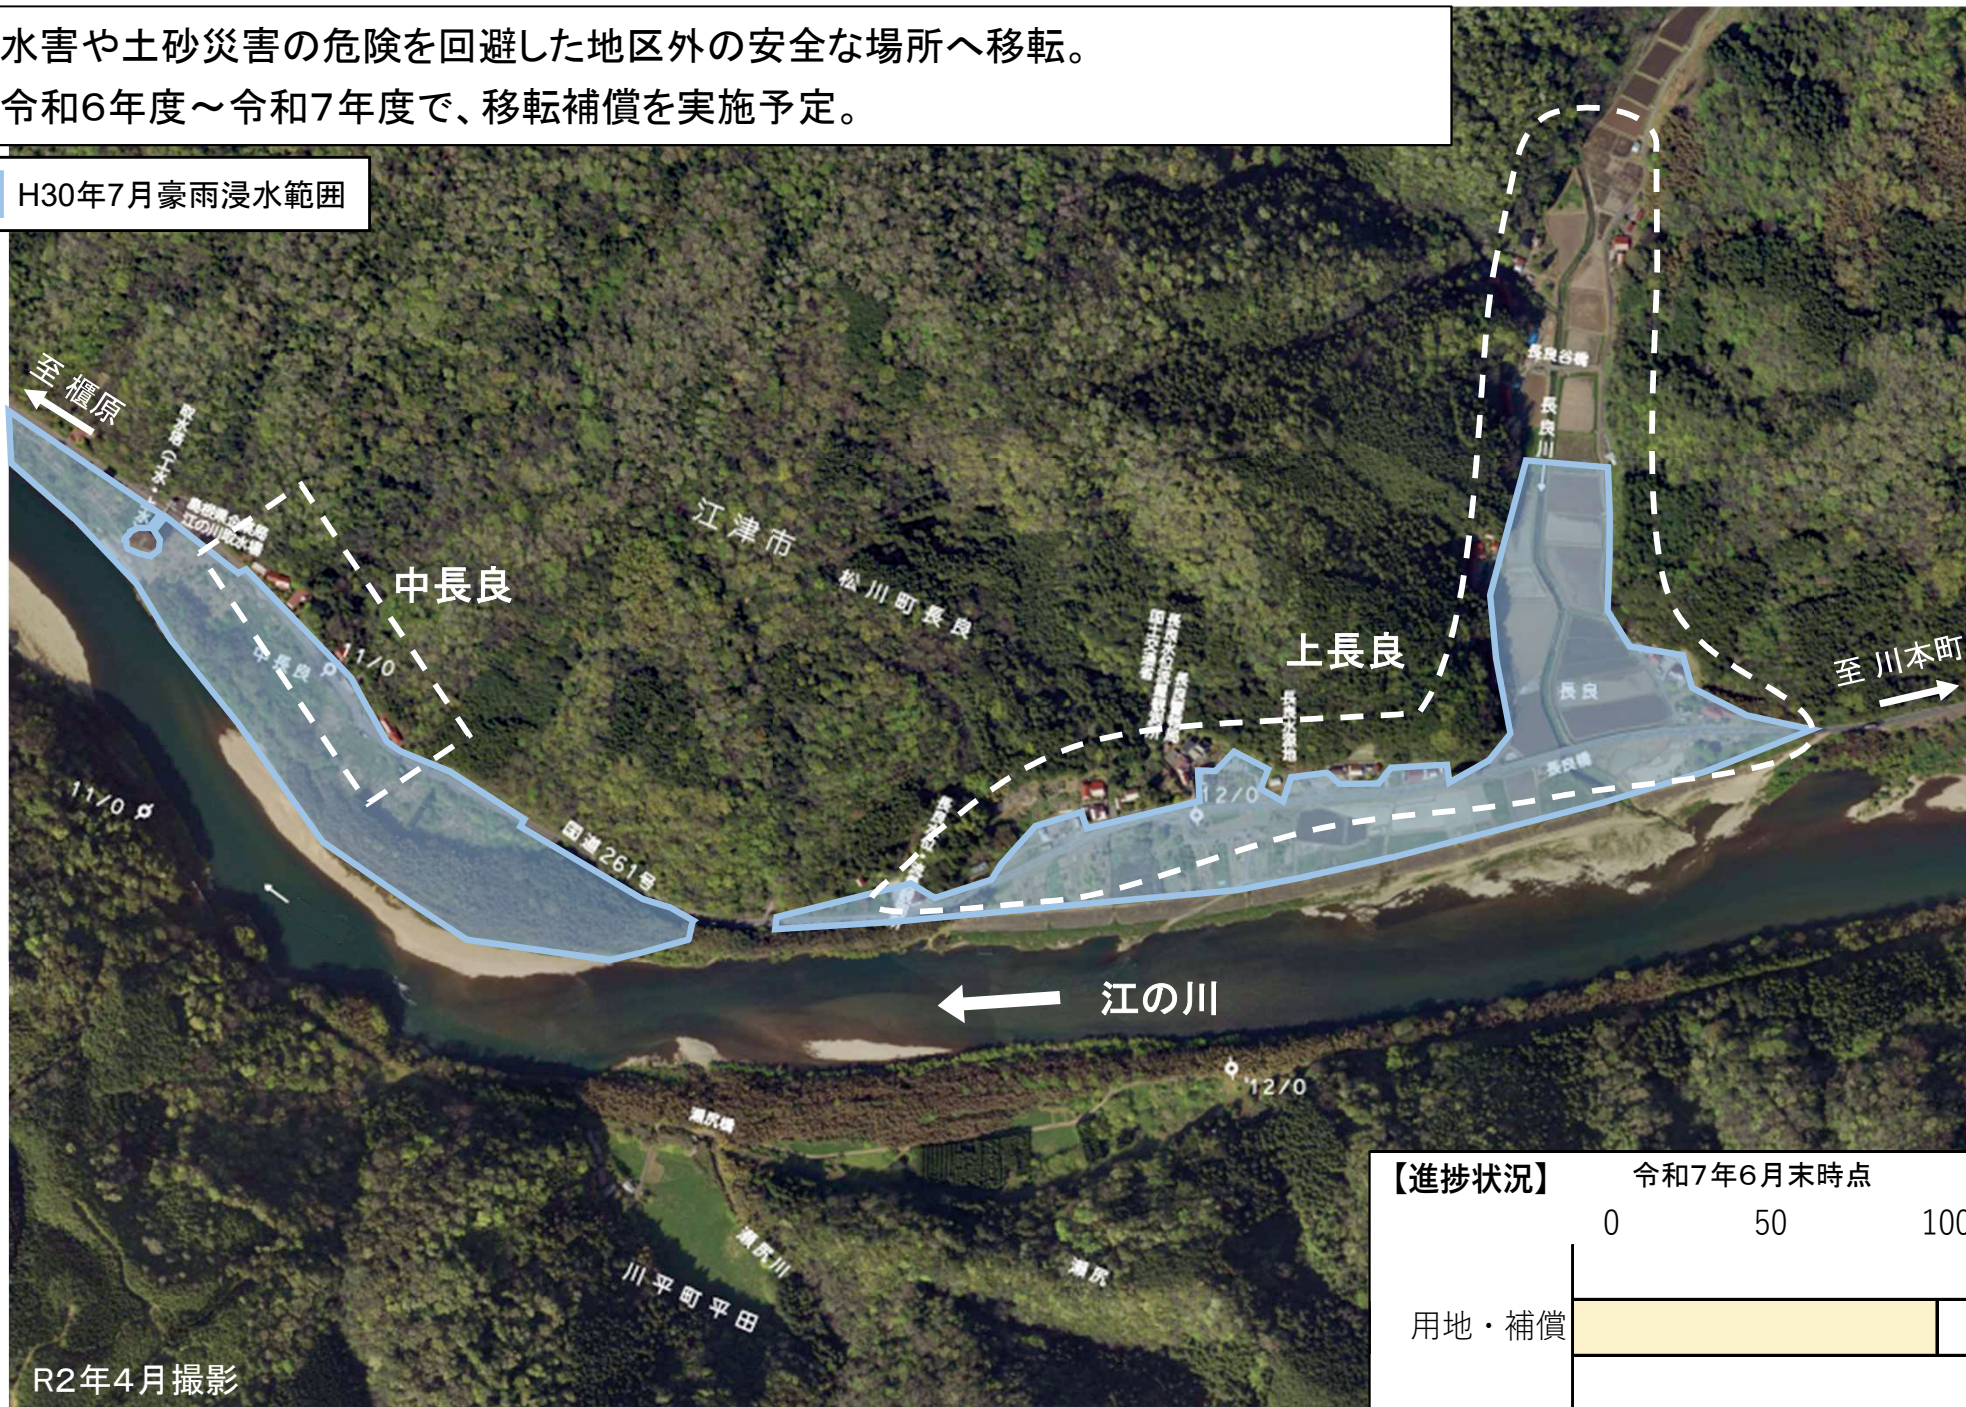


【進捗状況】

令和7年6月末時点


0 50 100%

用地・補償




下大貫地区(久井谷・榎谷・元折)～水害に強い下大貫地区を創る治水事業～

- 久井谷及び榎谷(榎谷、茗荷谷、元折)について、堤防整備及び家屋移転による治水対策を実施。
- 家屋個別移転を行う元折地区は、令和7年度に買収を実施。
- 堤防整備を行う久井谷・榎谷地区は、令和7年度から堤防の詳細設計及び地質調査等を実施予定。
- 榎谷地区については、令和8年度に埋蔵文化財の試掘調査を実施予定。

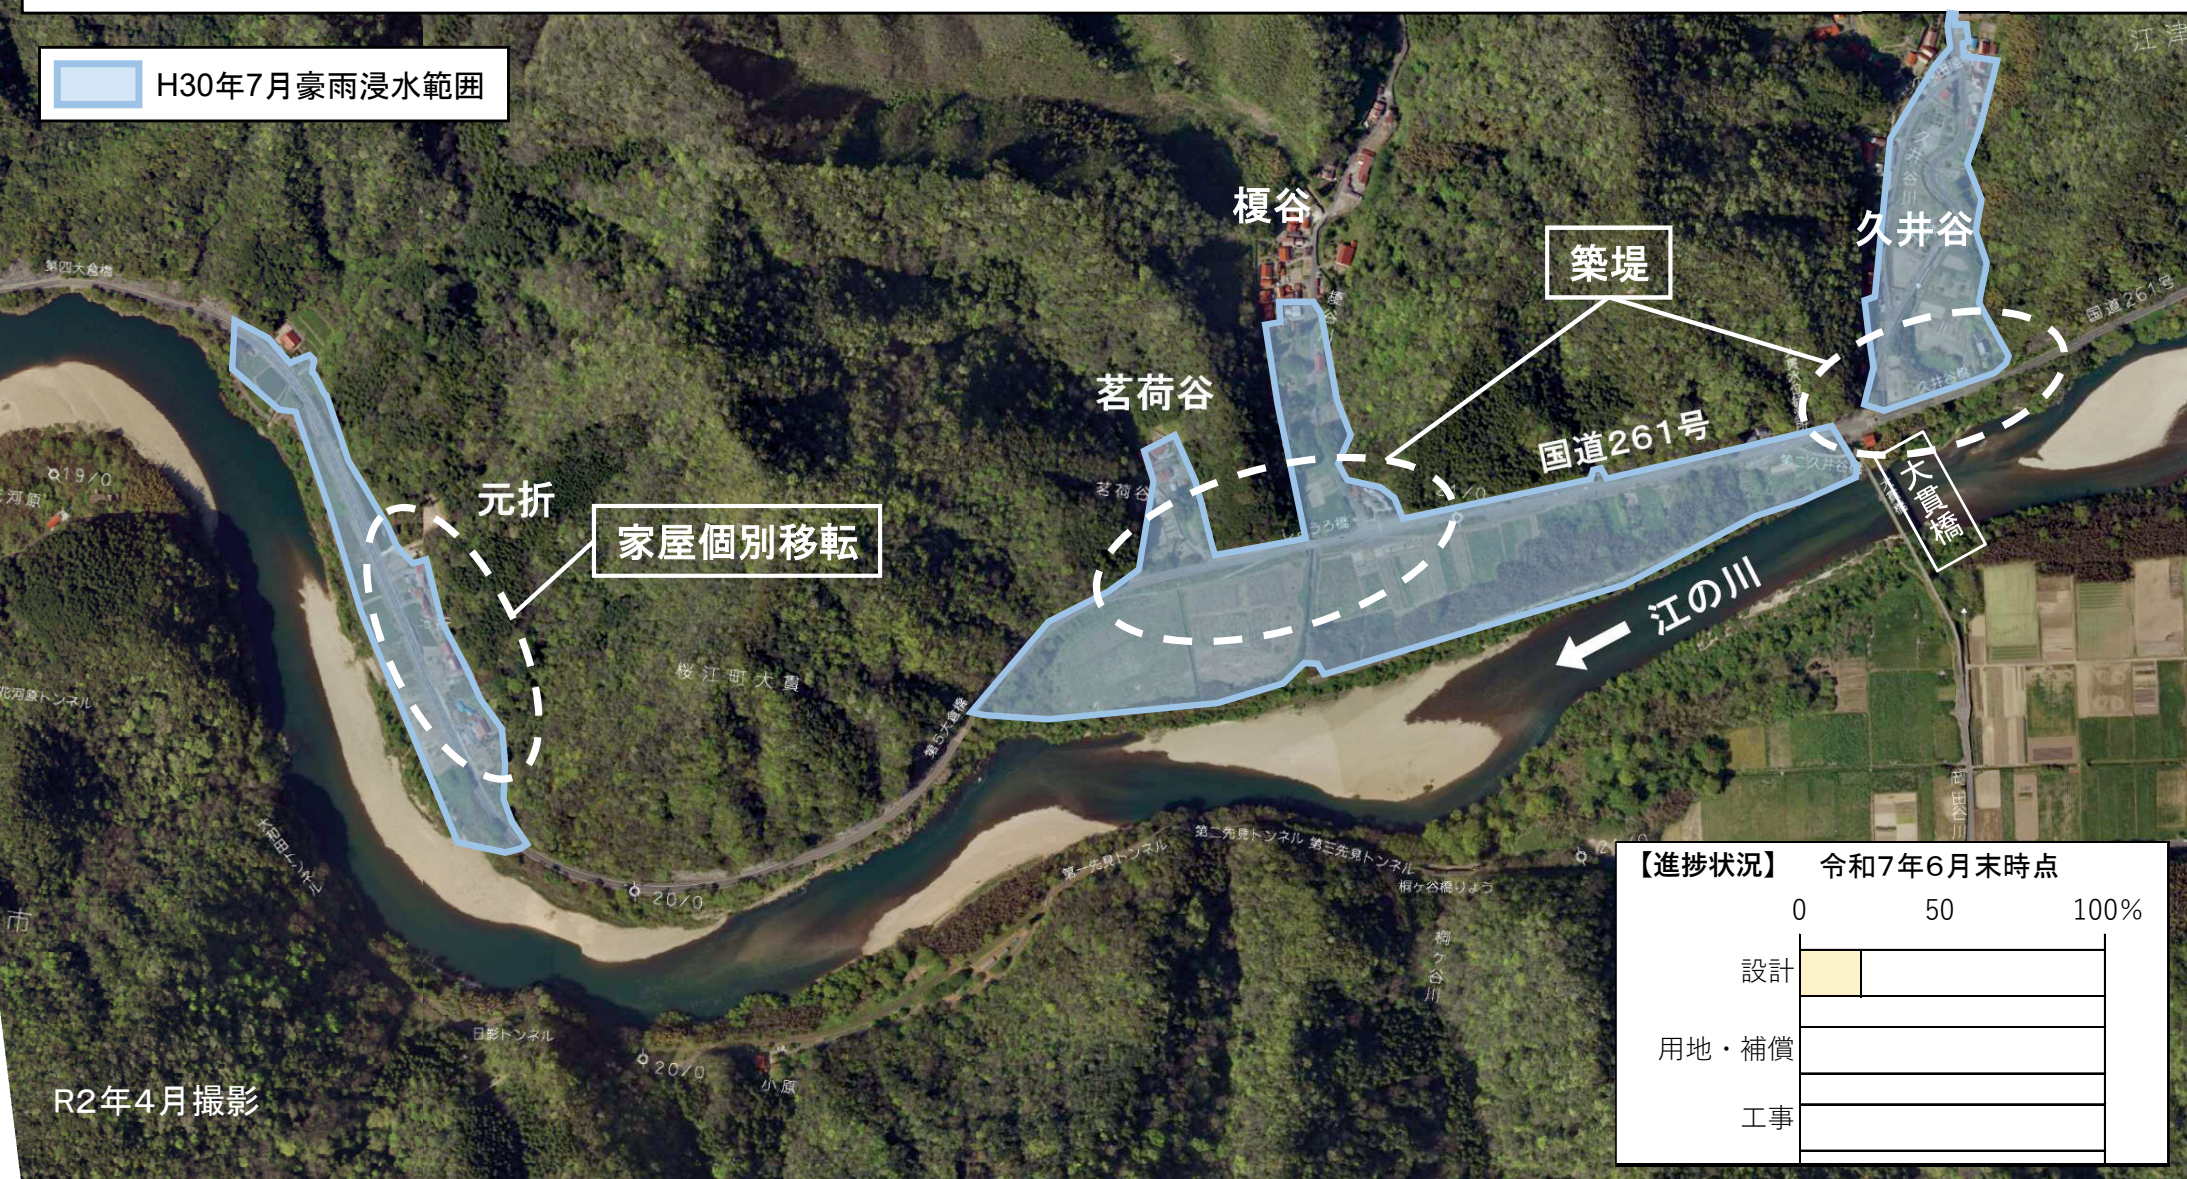


田津地区 ～水害に強い田津地区を創る治水事業～

- 堤防整備(輪中堤)による浸水対策。
- 令和7年度は、樋門(1基)等の詳細設計を行う。また、用地調査を行い、上流側の用地補償を実施する予定。
- 工事用道路は令和6年度に着手し、約110m整備済。

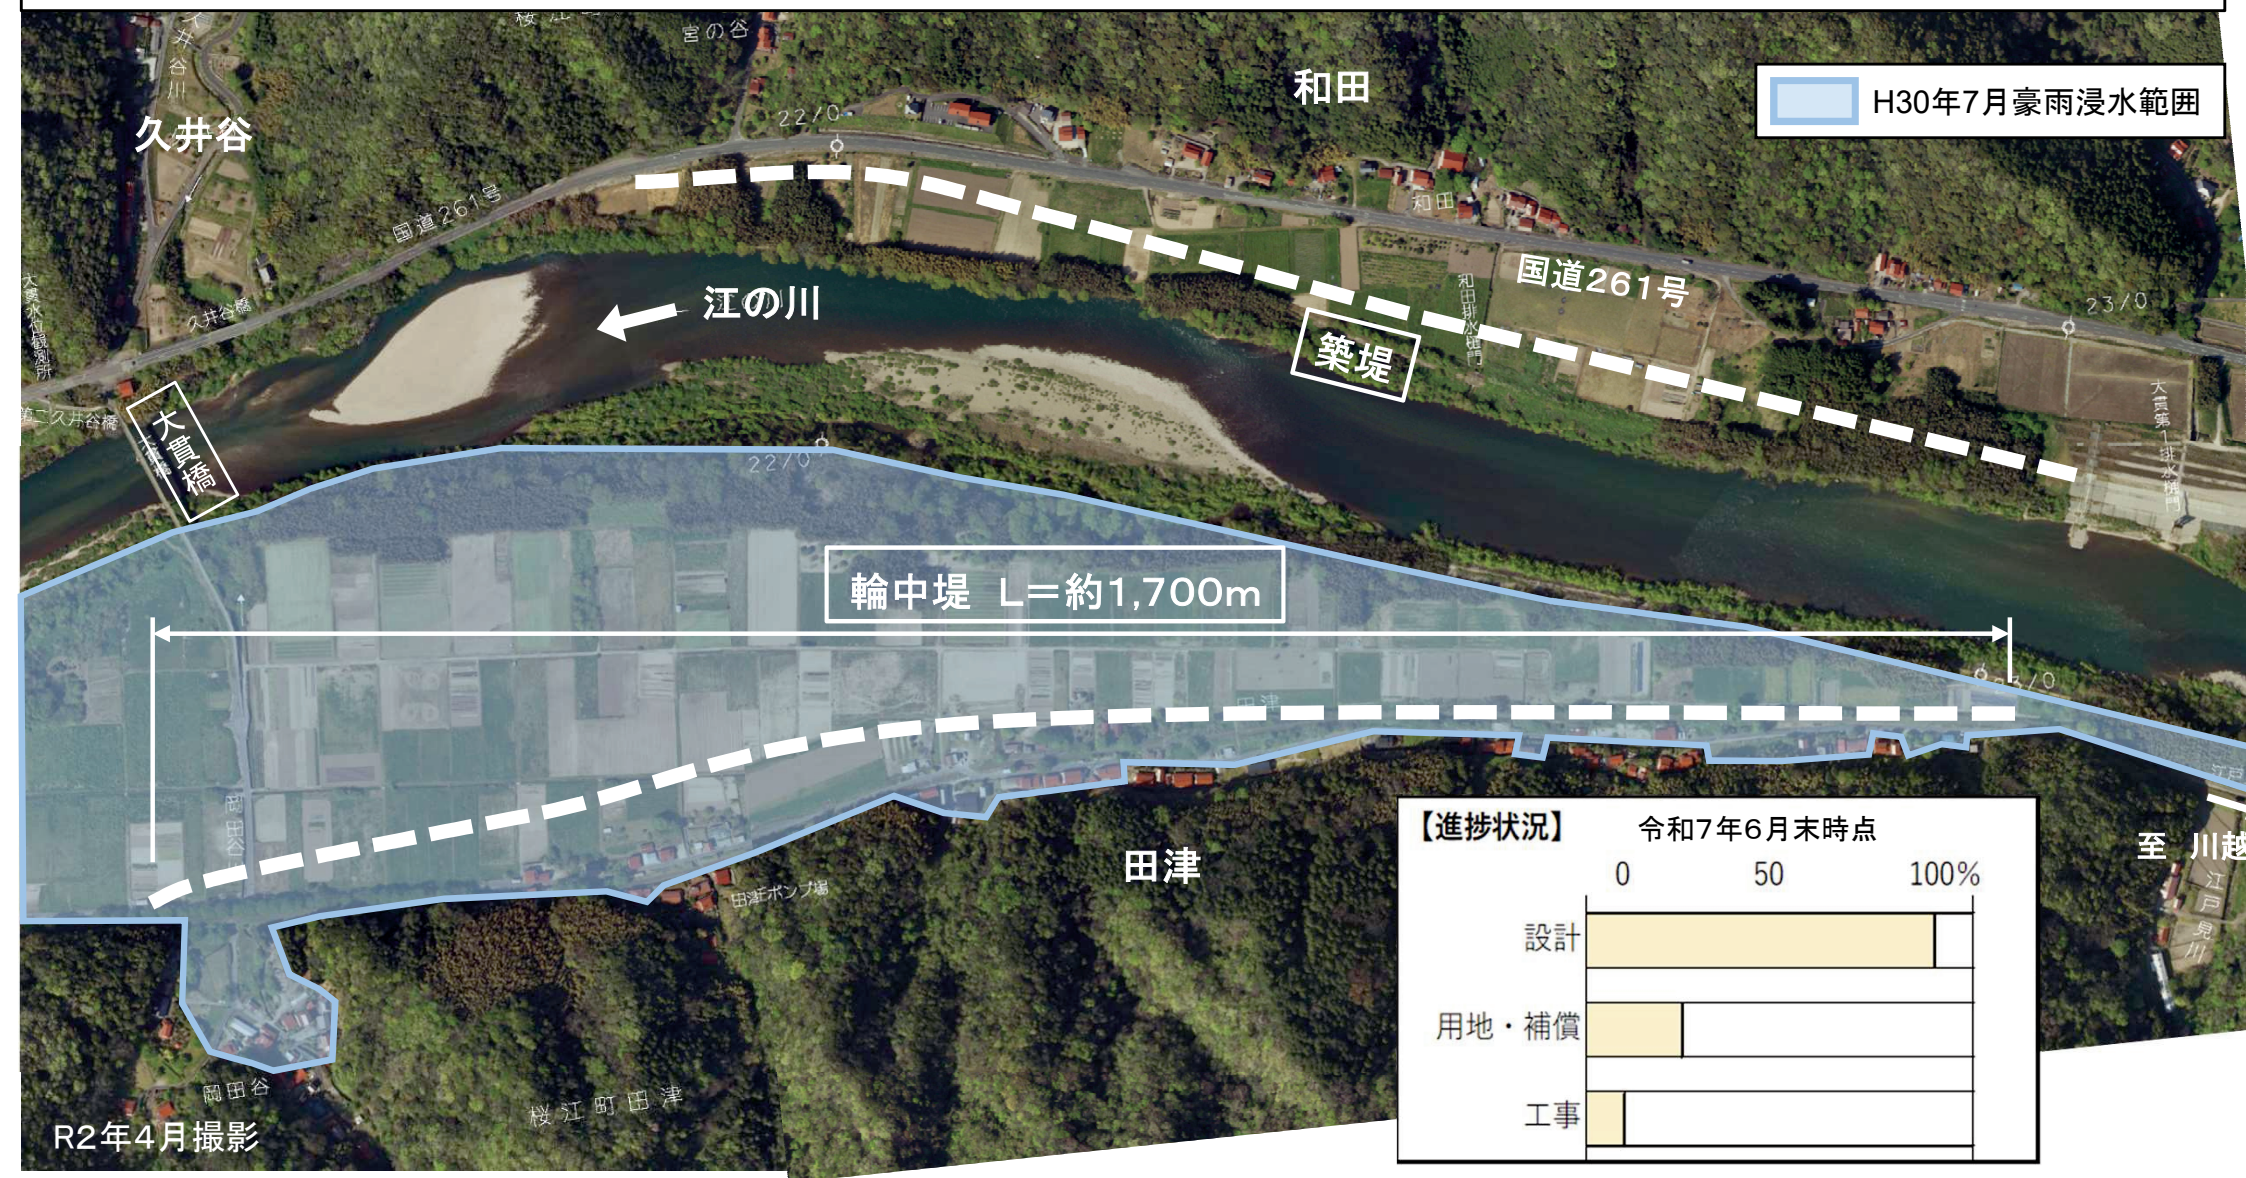


上大貫地区(大貫・和田)～水害に強い大貫・和田地区を創る治水事業～

- 平成8年に上流から工事着手し、約1,800mを整備済み。
- 令和7年度は、昨年に引き続き約120mの区間を施工予定。2基の樋門(国債R6～R7)工事が完了。

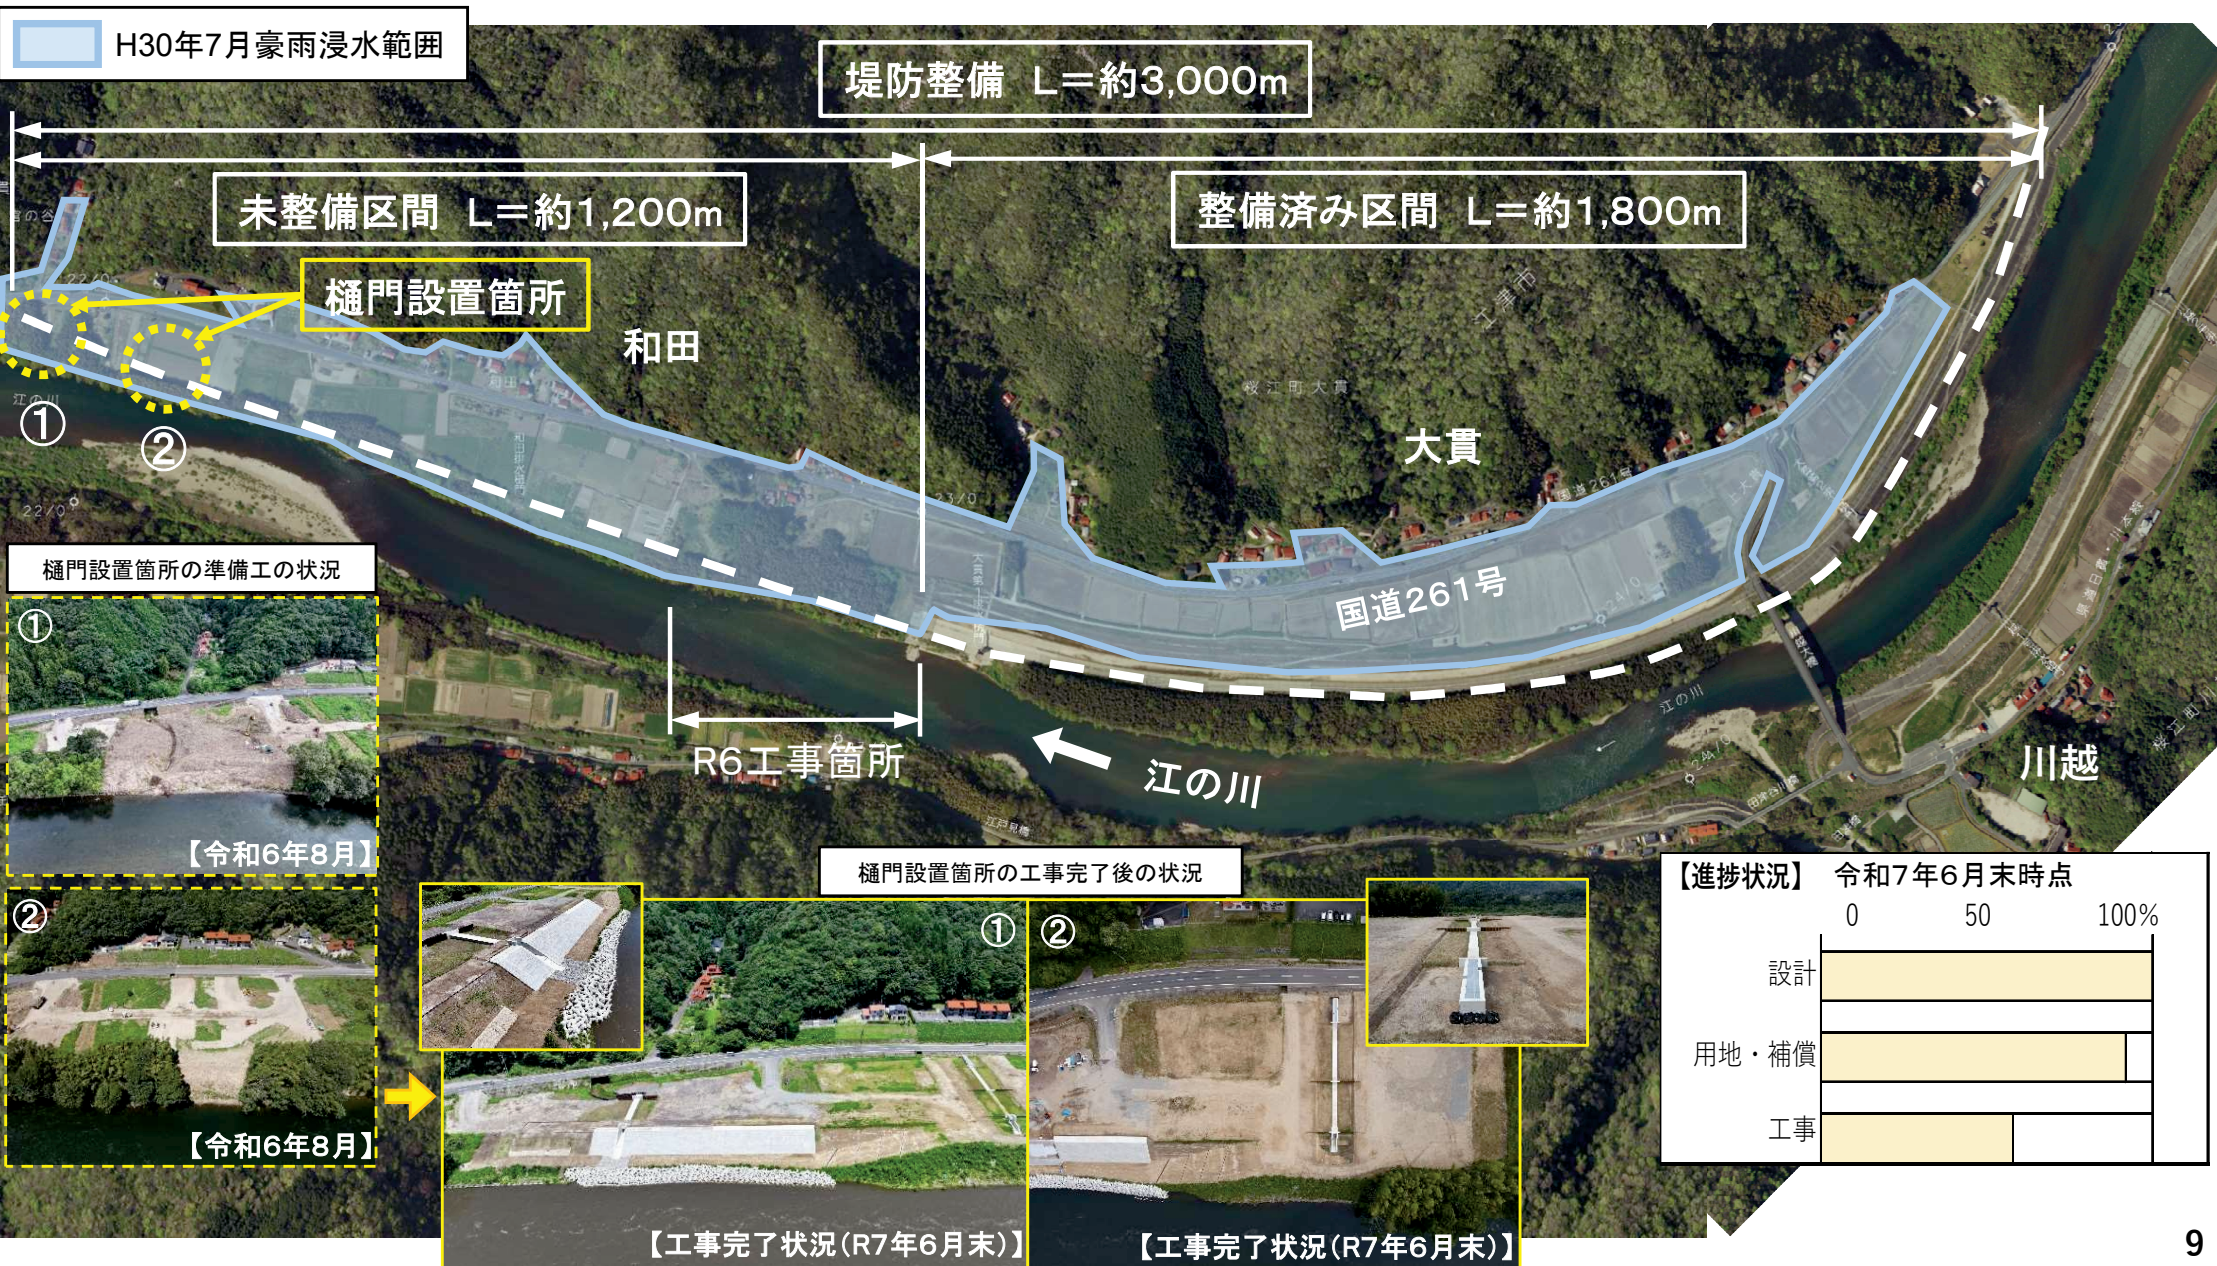

恵梨地区【家屋個別移転】


- 水害の危険を回避した安全な場所への地区外への移転。
- 令和7年度に用地買収を実施。

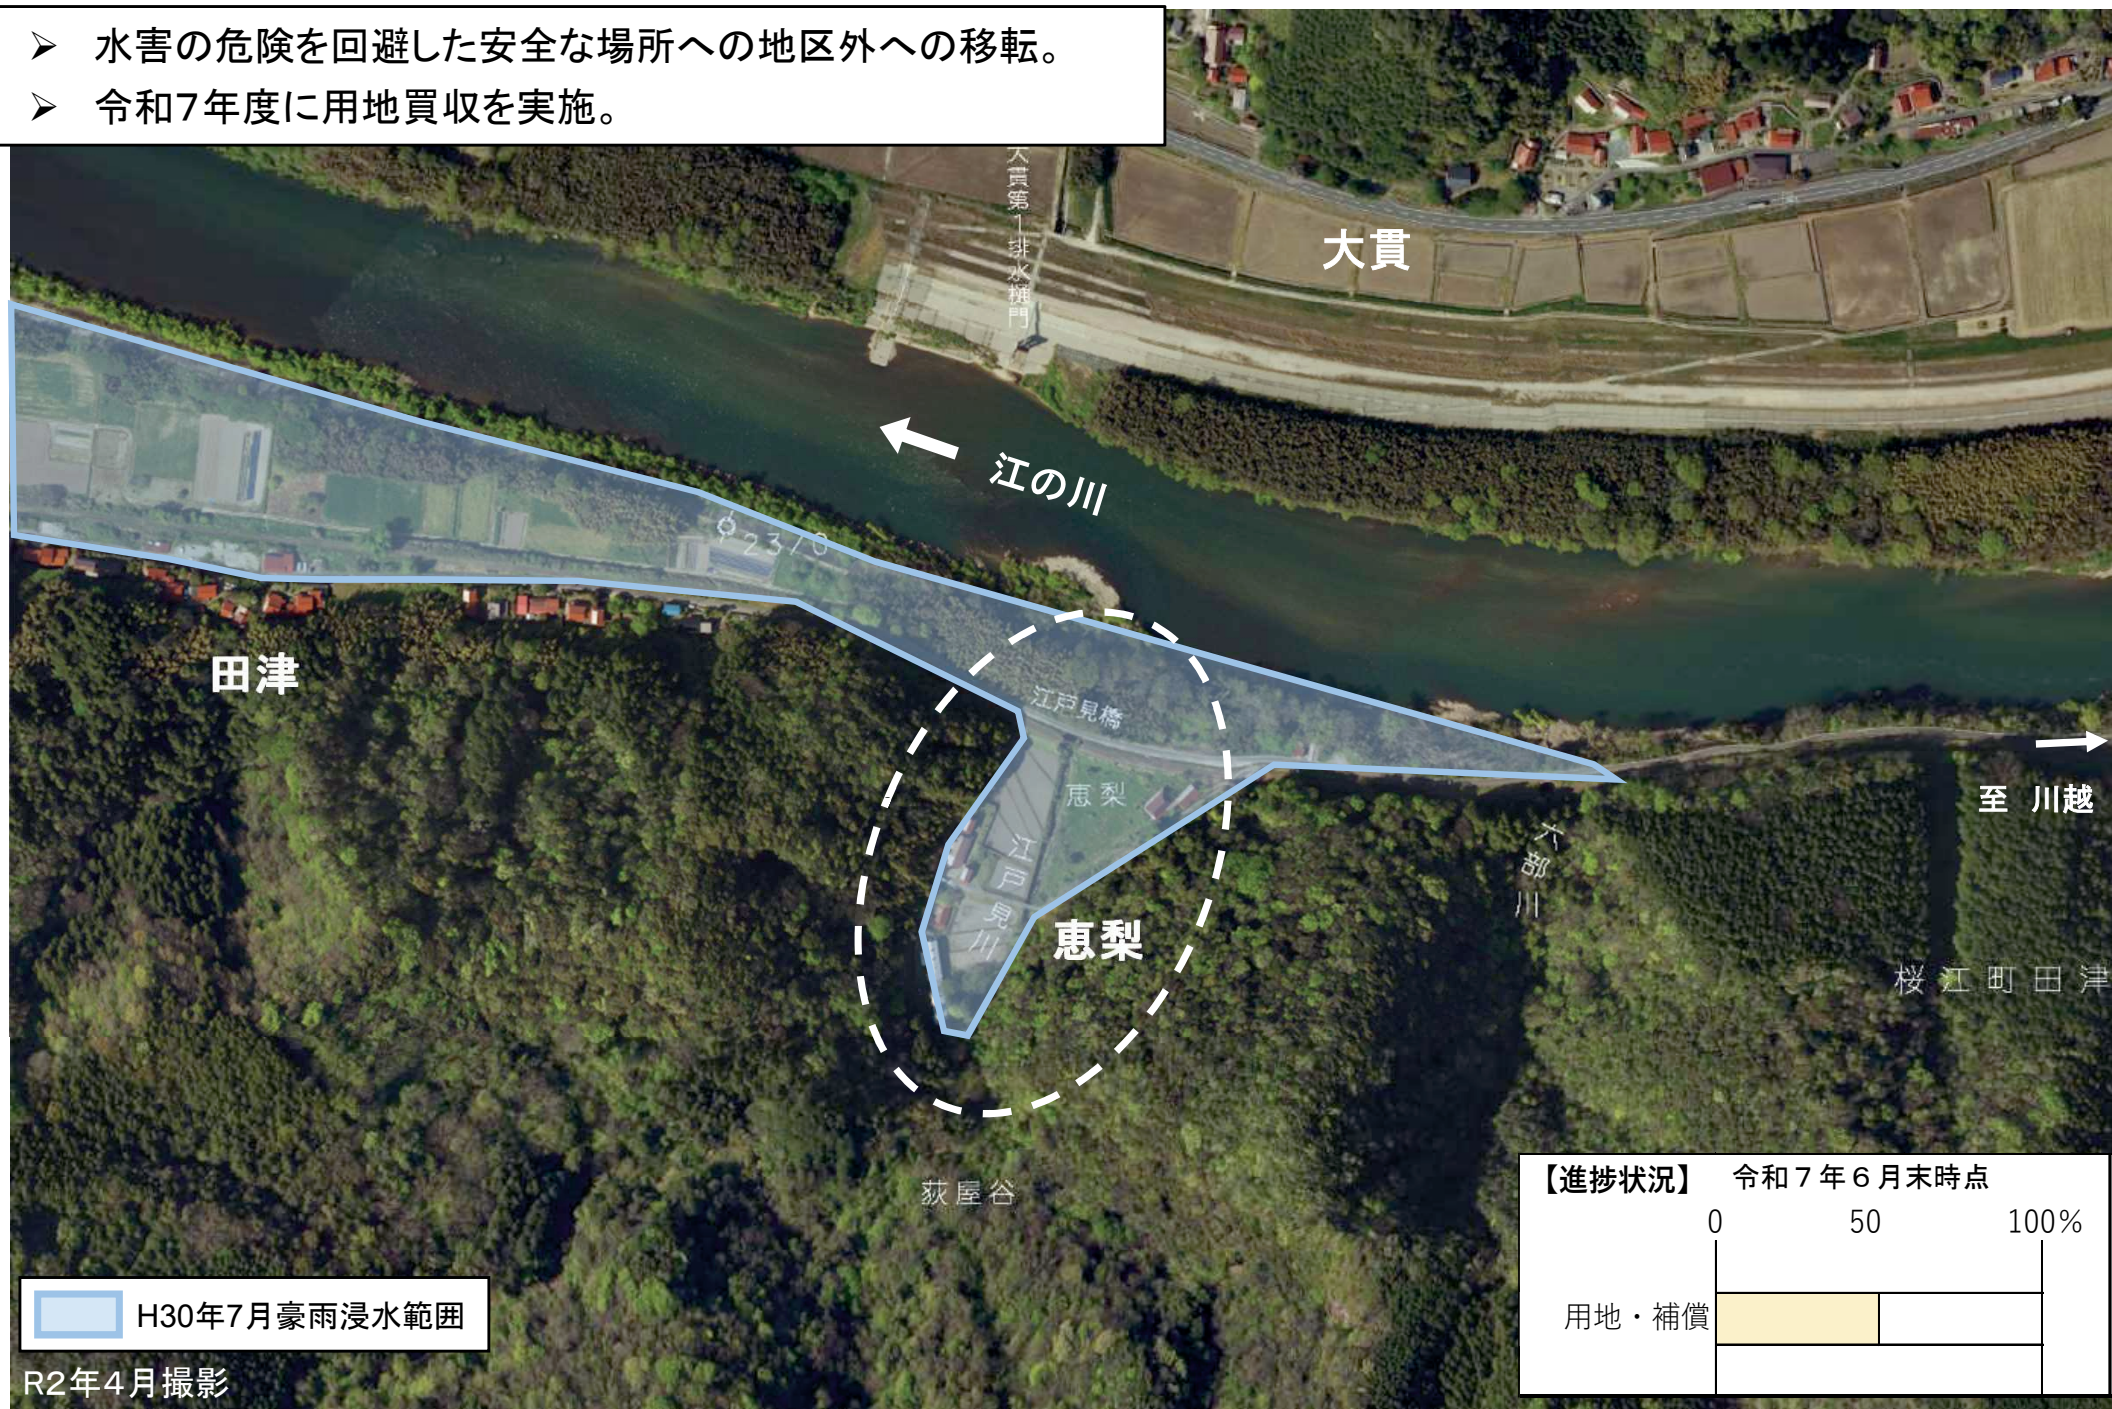

川越地区 ～水害に強い川越地区を創る治水事業～

- 平成元年度に事業着手し、本川上流側の築堤は平成26年度に実施。
- 平成31年度に支川田津谷川の整備に着手。
- 令和6年度に一部護岸工事を実施。
- 令和7年度は、昨年度に引き続き用地買収、一部工事用道路設置工事を実施予定。

【進捗状況】 令和7年6月末時点

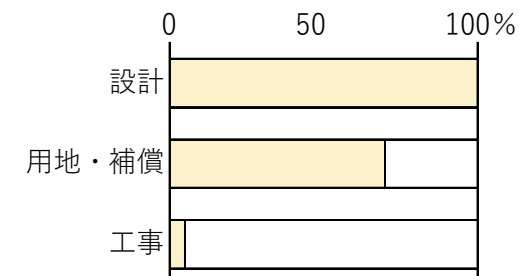

H30年7月豪雨浸水範囲

川越

堤防整備
(H元年度～H26年度)

J R 三江線

堤防整備
L＝約600m

宅地の嵩上げ
(H5年度～H11年度)

田津谷川

川越大橋
(H19.7竣工)

江の川

至 田津



至 R261

大貫

瀬尻・久料谷地区 ～災害に強い瀬尻・久料谷地区を創るまちづくり事業～

- 令和5年11月から迂回路工事に着手。
- 令和6年6月に買収完了。
- 令和7年度は、護岸工事を継続するとともに宅地嵩上げに着手。


【完成イメージ図】

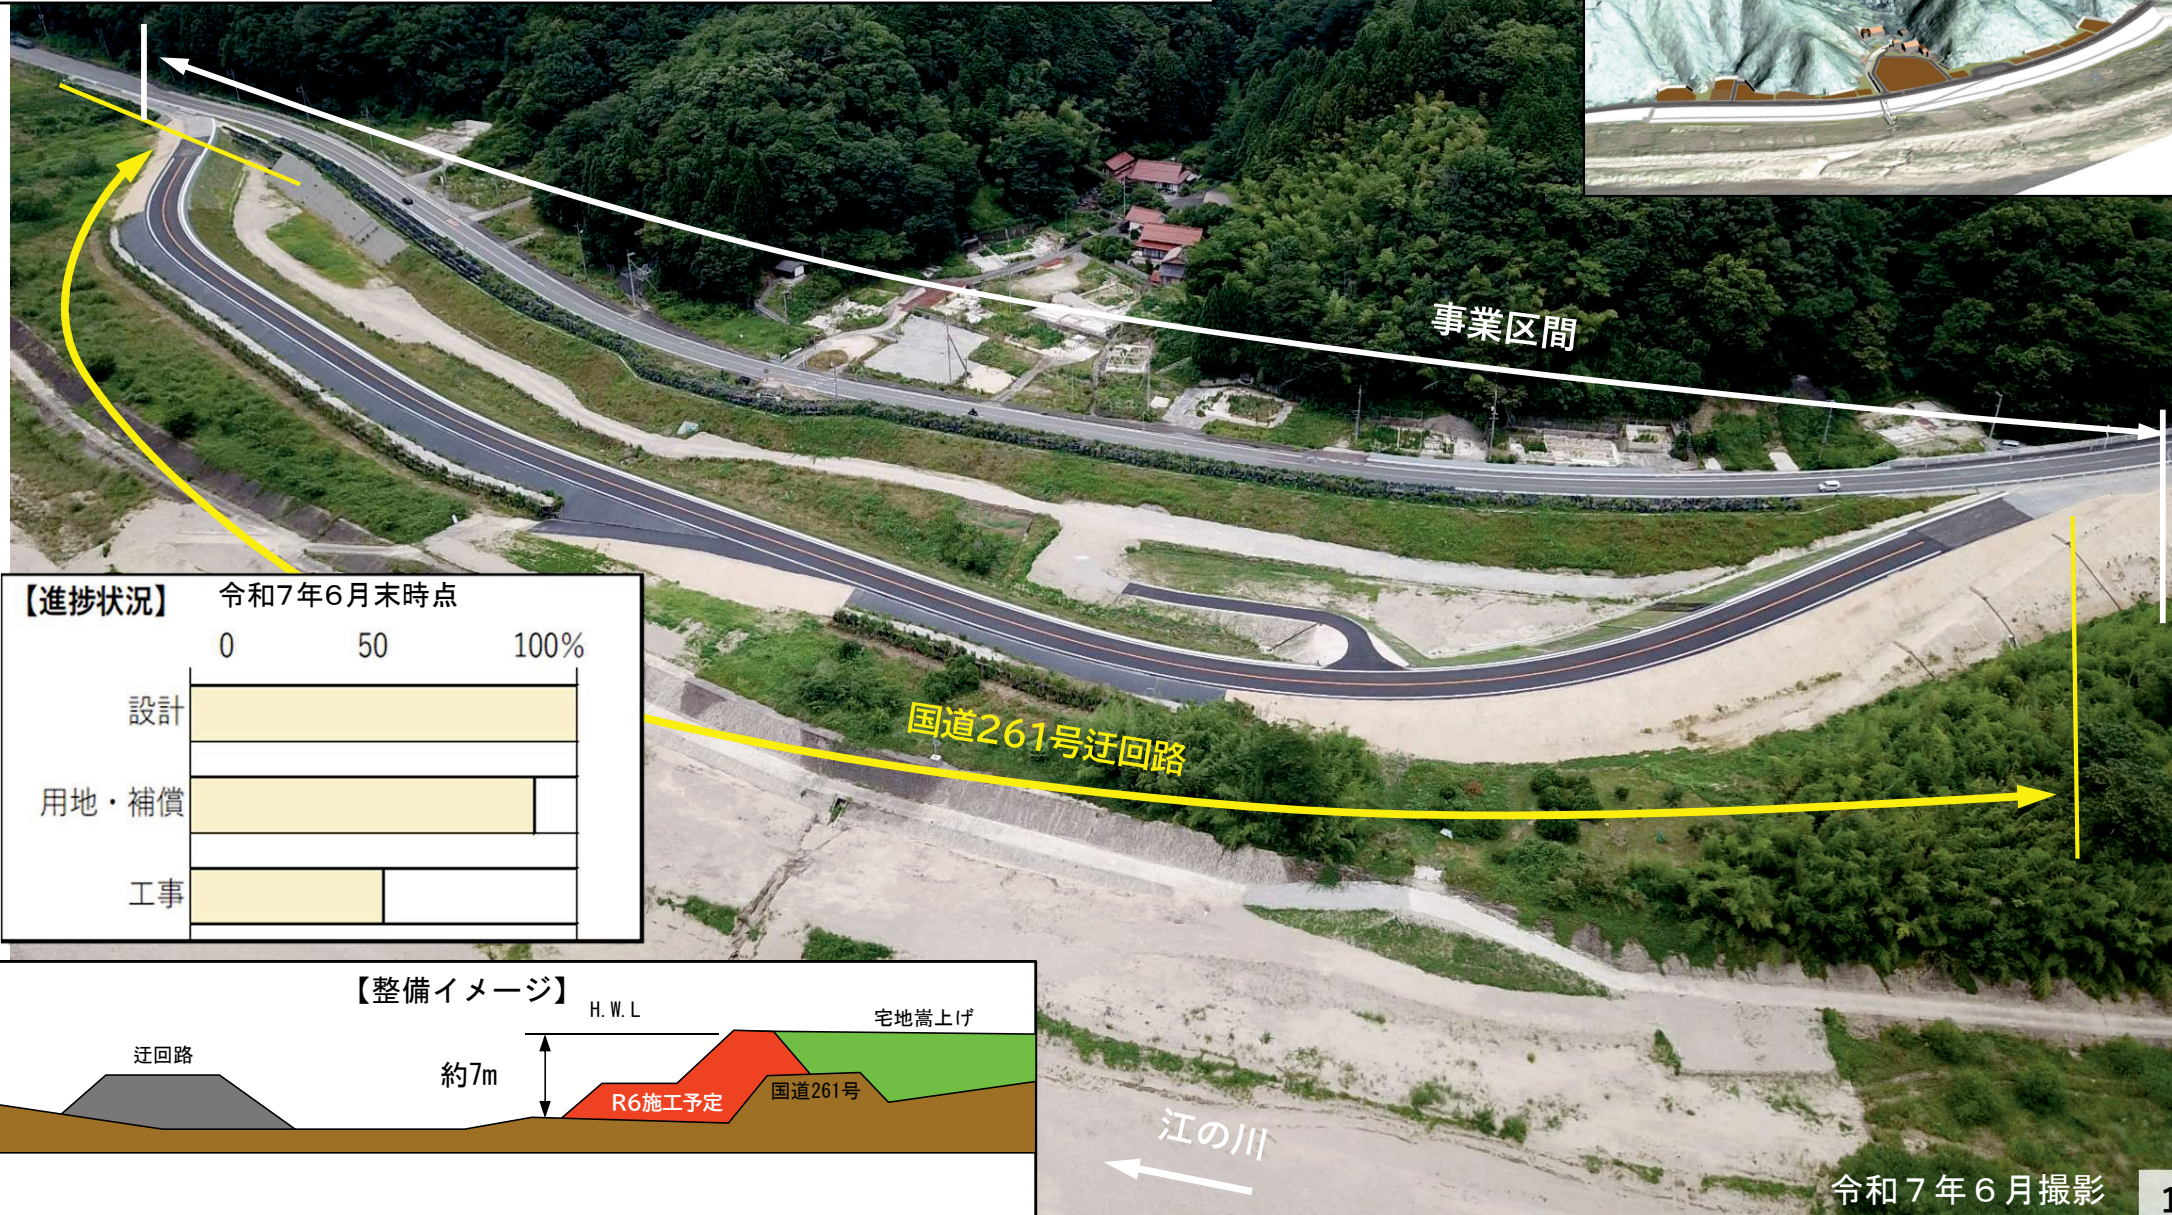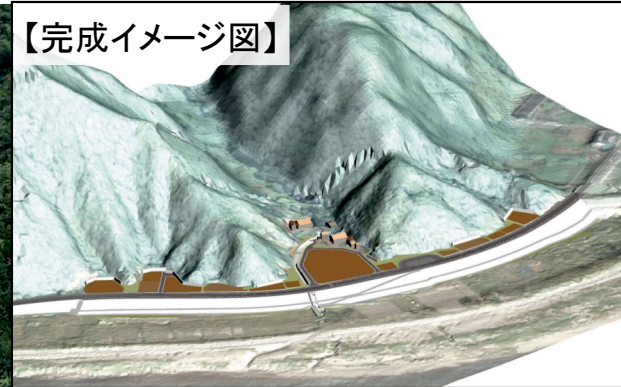

谷地区 ～災害に強い谷地区を創るまちづくり事業～


- 川本町の『まちづくり計画』を踏まえ、支川矢谷川上流まで、宅地集約・宅地嵩上げによる浸水対策。
(矢谷川下流側:国施工、矢谷川上流側:県施工)
- 令和6年度より事業(用地買収)着手。
- 令和7年度は、土砂搬入路の検討、用地調査、用地買収を実施予定。

【進捗状況】 令和7年6月末時点

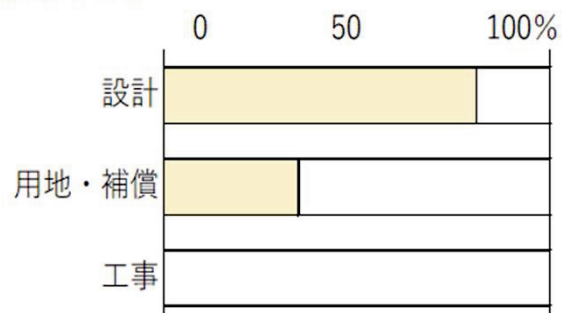

凡 例

- 河川
- 護岸(ブロック積、ブロック張)
- 盛土
- 道路(県道、町道、管理用通路)
- 宅地
- 宅地外(空地)

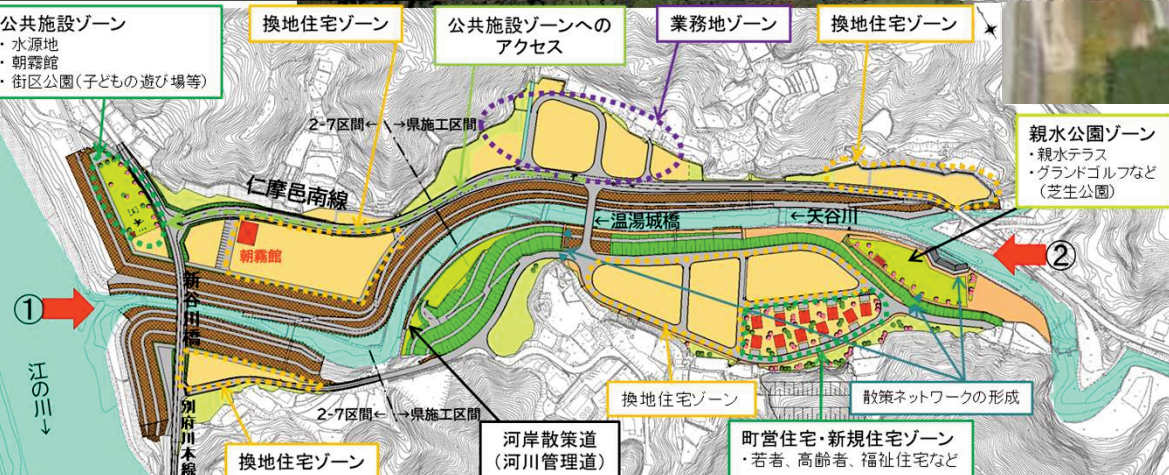

江の川

川本町川本

川本大橋

谷

矢谷川

国施工区間

34k000

JR三江線

H30年7月豪雨浸水範囲

- 堤防整備による浸水対策。
- 令和7年度は、継続して用地買収を実施予定。



(写真①)



(写真②)



【進捗状況】 令和7年6月末時点		0	50	100%
設計				
用地・補償				
工事				
