

## 長迫側、阿賀側ともにトンネルの掘削を進めています

### 長迫工事(長迫側)

長迫工事は、2月20日時点で約160mの掘削が完了しました。住宅直下のトンネル掘削中であり、引き続き、騒音・振動に十分配慮しながら掘削を進めています。



トンネル掘削機による掘削状況


### 東工事(阿賀側)

東工事は、2月20日時点で阿賀側坑口から約940mの掘削が完了しました。昨年、10月より施工を開始した、トンネル形状の仕上げとなる「覆工コンクリート」は、約290m完了しています。



掘削状況

トンネル工事の進捗状況 (H29.2.20 時点)

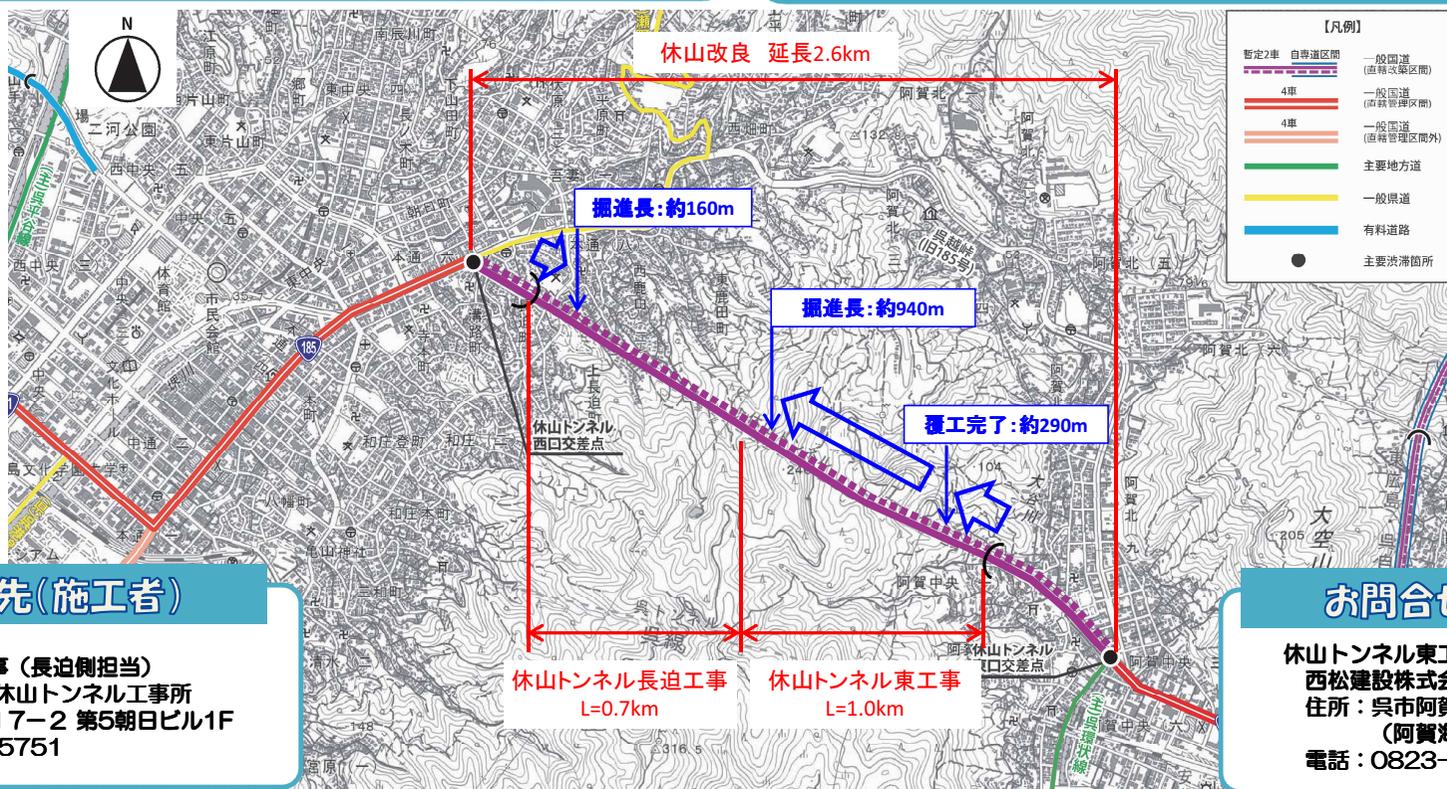

### お問合せ先(施工者)

休山トンネル長迫工事(長迫側担当)  
 株式会社 奥村組 休山トンネル工事所  
 住所: 呉市朝日町17-2 第5朝日ビル1F  
 電話: 0823-27-5751

### お問合せ先(施工者)

休山トンネル東工事(阿賀側担当)  
 西松建設株式会社 休山トンネル出張所  
 住所: 呉市阿賀中央2丁目1-26  
 (阿賀海岸通北バス停前)  
 電話: 0823-27-3178

工事の施工につきましては、騒音・振動等の抑制に努め、細心の注意を払って進めてまいります。また、皆様のご意見等もお聞きしながら進めてまいります。工事期間中は、ご不便やご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。


## 【長迫側の工事の状況について】

### ◆周辺の生活環境に配慮し施工方法を工夫しています(開通が平成29年度より遅れる見込み)

- 当初は昼夜連続(24時間)での掘削作業を予定していましたが、想定よりも硬い地盤が出現し、地表に振動が伝わりやすくなったことから、トンネル上部の住宅地への騒音・振動等の影響を少なくするため、昼間のみの工事に変更し、周辺環境に配慮し工事を進めてきました。
- 現在は、振動を抑制できる大型機械を導入し、更に地元の皆様のご協力により、24時(深夜0時)まで作業を延長して工事を進めています。
- しかしながら、現在のトンネル掘削の進み具合を踏まえると、平成29年度に予定していた開通は遅れる見込みです。
- 引き続き早期開通を目指して努力してまいります。今後も地質の変化が想定されることから、開通時期はトンネル掘削の進み具合を踏まえ、見通しがたった段階でお知らせします。



防音ハウスを設置し、騒音等の低減に努めながら工事を進めています。

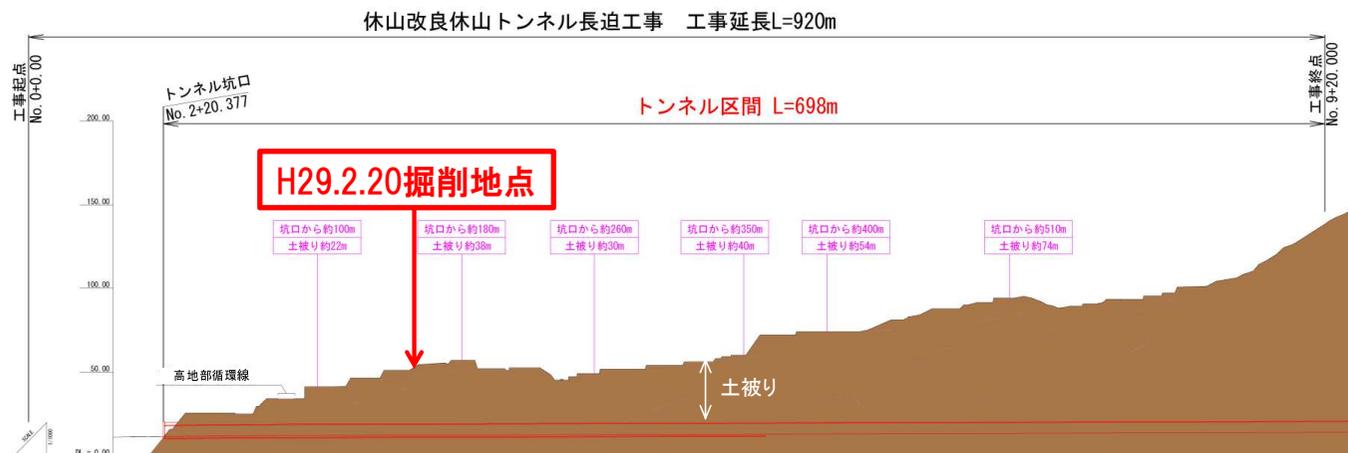

2月13日から作業時間を延長し工事を進めています。

【当面の作業時間帯】

**7:00~24:00頃を予定**

※なお、騒音・振動の大きな掘削作業は、遅くとも23:00までには終了します。

### お問い合わせ先(発注者)

国土交通省 中国地方整備局  
広島国道事務所 工務課  
住所：広島市南区東雲2丁目13-28  
電話：082-281-4131 (代表)

お使いの井戸や家屋等に異変があった場合は、国土交通省広島国道事務所へ連絡をお願いします。
