

県・市等の内水対策等の取り組み状況と課題

1. 米子市 建設部 維持管理課 5
2. 境港市 建設部 管理課 11
3. 松江市 都市整備部 河川課 17
4. 安来市 上下水道部 下水道課 22
5. 鳥取県 県土整備部 空港港湾課 24
6. 島根県 土木部 河川課 26
7. 島根県 農林水産部 農村整備課 30

県・市の内水対策の取り組み状況、及び課題等の対応状況

No	機関名	取り組み状況	取り組みに対する課題等	課題に対する検討・対応状況
1	米子市 建設部 (維持管理課)	1. 計画事業 祇園町地区内水排除計画 2. 計画年次 平成15年度～ 3. 計画箇所 米子市祇園町地区 4. 取り組み概要 高潮と降雨の同時発生により浸水被害が発生しており、平成15～16年度に貯水槽(鉄筋コンクリート構造) V=107.7m³、1基、及び排水ポンプ11kw、50m³/min、1基を鳥取県が設置し、平成23年度より米子市が引き継いでいる。	現在設置された貯水槽及びポンプのみでは、地区全体の内水排除は十分ではなく、今後上流域の流出流量の分散及びポンプ能力の向上を図る必要がある。	鳥取県が設置し、米子市が随門管理委託を受託している樋門のうち、1基の簡易樋門を除き、平成22年度に鳥取県において漏水を防ぎ水密性を高める工事を行っていた。 また、内水排除として平成23年度に道路横断管の設置工事を実施するとともに仮設ポンプ1基を設置、平成24年度からは2基設置した。 平成26年度も設置完了している。 (仮設ポンプ設置期間:6～10月)
2	米子市 建設部 (維持管理課)	1. 計画事業 津用河川四反田川樋門設置事業 2. 計画年次 平成10年度～ 3. 計画箇所 米子市除田町地区 4. 取り組み概要 中海の潮位上昇に伴う津用河川四反田川への逆流防止のため樋門設置工事を行った。	樋門を閉じた場合の内水排除が必要である。	平成24年度から内水排除対策として仮設排水ポンプを1基設置した。 平成26年度も設置完了している。 (仮設ポンプ設置期間:6～10月)
3	境港市 建設部 (管理課)	1. 計画事業 外江・渡地区内水排除対策事業 2. 計画年次 平成21年度～ 3. 計画箇所 境港市外江・渡地区 4. 取り組み概要 当該地区は家屋が連担する地域であるが、護岸背後の地盤が低いいため高潮時に外水被害を度々受けてきた。これまでの高潮時対策は、護岸背後地の排水路河口に設置されている数箇所の集水桝において、樋板により外水を遮断し、移動式水中ポンプで内水を強制排除してきた。これらの方策では、人足確保や初動体制の遅れなどの問題点があったため、固定式の内水排除ポンプ施設の整備を行うことで、内水排除対策とこれまでの問題点を解消するものである。	市内には、高潮時に移動式ポンプで内水を強制排水している箇所が他にも多く点在することから、今後吐口の統廃合並びに樋門の整備も含めて検討を行い、その整備主体、監理における関係機関での役割分担も明確にしておく必要がある。	【外江地区】 H21 外江中央都市下水路河口にマンホール式水中ポンプ施設設置 H23 外江都市下水路河口にマンホール式水中ポンプ施設設置 H26 外江地区現況雨水系統調査・雨水基本設計業務を実施 H27～外江地区雨水実施設計業務、外江地区雨水排水路整備工事に着手予定 【渡地区】 H23 渡地区雨水基本設計業務 H24 渡地区雨水実施設計業務 H24～渡地区雨水排水路整備工事 H27～樋門工事、旧渡瀬港水域埋立・渡瀬港地区内水排除施設整備

県・市の内水対策の取り組み状況、及び課題等の対応状況

No	機関名	取り組み状況	取り組みに対する課題等	課題に対する検討・対応状況
4	境港市 建設部 (管理課)	1. 計画事業 西工業団地内水排除対策事業 2. 計画年次 平成24年度～ 3. 計画箇所 境港市西工業団地 4. 取り組み概要 当該地区には民間所有の水域貯木場があり、斐伊川本川(中海)との間において護岸が未整備で開口状況にあり、高潮時には背後地の居住地域や工業団地にもその影響が及んでいる。 斐伊川河川整備計画に基づき当該護岸が整備されることにより、中海と貯木場が締め切られることから、背後地域における現況の雨水排水系統を見直す必要が生じるため、境港市では現況の雨水排水系統調査を実施し、適切な排水ルートを設定するとともに、新たな排水路整備並びに排水路河口部における樋門・内水排除施設整備を行うこととしている。	護岸が整備された後、新たな排水路完成までの間、仮排水路で対応するため内水排除に対し、十分な機能が確保できない。	H24 西工業団地現況雨水排水系統調査・雨水基 本設計業務 H25 西工業団地雨水排水施設設計業務 樋門予備設計業務 H26 樋門詳細設計業務 H27～西工業団地雨水排水施設整備工事
5	境港市 建設部 (管理課)	1. 計画事業 岬町・境水道沿岸背後地区における内水排除対策事業 2. 計画年次 平成10年度～(平成22年度に計画完了) 3. 計画箇所 境港市岬町周辺(民有地)、その他 境水道沿岸地区 4. 取り組み概要 当該地区には民間所有の造船所があり、斜路や一部民有護岸が存在している。護岸自体も低く高潮時の影響を受けるほか、造船所背後地が低いことから護岸改修並びに内水排除対策が求められている。また、この地域と隣接する境水道に面する護岸背後地域における浸水、内水排除対策の必要性も指摘されている。 これらの地域における対策については、平成22年に定められた斐伊川水系河川整備計画においては、長期的に検討されるべき地区として計画(20年間)には明記されなかった。その際に、各自自治体で実施が検討されている内水対策が明らかになった時点で調整を図り、必要な堤防等の整備を行うという指摘を受けたことから、境港市ではこれらの地域における内水排除対策計画(公共下水道雨水計画)を策定し、護岸改修とあわせて整備を行っていくこととしている。	・護岸の所有者(関係機関)との連絡調整 河川区域、漁港区域、港湾区域が幅横するところから関係機関との認識共有が必要 ・背後地域における内水排除計画の作成 ・具体的な護岸整備に向けた事業化	[雨水計画策定] H10 境港市公共下水道事業計画事業変更認可 H16 境港市公共下水道事業計画事業変更認可 H22 境港市公共下水道事業計画事業変更認可

県・市の内水対策の取り組み状況、及び課題等の対応状況

No	機関名	取り組み状況	取り組みに対する課題等	課題に対する検討・対応状況
6	松江市 (河川課)	1. 計画事業 八束排水路整備工事 2. 計画年次 平成19～25年度 3. 計画箇所 八束町入江、二子、寺津、亀尻、馬渡地区 4. 取り組み概要 中国四国農政局による、八束町の中海北西護岸部分への護岸堤防施設(道路建設、埋め立て)建設に伴い、既設水路84箇所を30箇所へ統合し、新たに排水路約5.5kmの整備を行い中海へ内水を排除するもの。 道路建設は農政局に替わって島根県が施工し、排水路整備は農政局が施工し、平成25年度に完了した。内水排除対策として、市の河川管理施設として帰属を受けた。 外水対策として設置された樋門等は、治水に影響の大きい施設であるスライドゲートは出雲河川事務所、その他フラップゲート25箇所は松江市河川課で管理を行っている。	埋め立てにより残水域として残る不整形な土地利用方法について、関係機関で十分検討を行う必要がある。 新設される排水路は水路勾配も緩く、土砂流入も多いため排水路の浸透等、維持管理が必要となる。また、フラップゲートの点検等により、機能確保が必要となる。	フラップゲートの点検を行っている。
7	松江市 (河川課)	1. 計画事業 河川・排水路改良事業 2. 計画年次 通年 3. 計画箇所 松江市大井町～美保関 4. 取り組み概要 地元要望等に基づき、松江市内全域を対象に行っている河川排水路改良工事のなかで、中海沿岸の普通河川においても内水対策のため改良工事を実施している。また、治水対策の一環として、中海に放流する普通河川についても浸透事業に取り組んでいる。	限られた事業費の中で、市内全域を対象とした事業であり、中海の計画エリアに集中して投資できないため、中海の護岸整備にあわせ、普通河川及び排水路の取付区間を十分確保し整備する必要がある。	平成25年度は新庄町地内の平地川改修(ブロック積造岸)事業により27.5m施工した。また、改修事業とあわせて浸透事業を行った。 平成26年度は約20m区間の整備を計画している。
8	安来市 上下水道部 (下水道課)	1. 計画事業 下水道雨水排水整備事業 南十神地区 2. 計画年次 平成25～28年度 3. 計画箇所 安来市南十神地区 4. 取り組み概要 (1) 西ノ川水路と前ノ川を連結し、下流で一本化を図る。 (2) 中海の水位上昇による逆流防止と洪水時の内水排除のためにゲートポンプを設置する。	ゲート設置に向け、仮設計画も含めた具体的な施工方法、予算計画等を樹立すること。	(1) 下水道雨水排水事業として認可を得た。 (2) ポンプ場、雨水渠の詳細設計を発注し、施工計画・仮設計画・予算計画等の具体的な検討を開始した。

県・市の内水対策の取り組み状況、及び課題等の対応状況


No	機関名	取り組み状況	取り組みに対する課題等	課題に対する検討・対応状況
9	鳥取県 (空港港湾課)	【米子港】 ・護岸(パラベット等)について、短期整備区間は治手済。短中期・中期整備区間に早期着手していただけるよう測量を実施中。今後、設置位置や構造について、国土交通省と調整を実施する予定。 ・背後に港湾施設のない地域については、護岸の引き継ぎに必要な条件等について、国と協議中。 【境漁港】 ・矢板岸壁の防食対策(機能保全事業)を平成23年度から実施中。(平成26年度完了予定)	【米子港】 ・護岸の国への引き継ぎにあたり、必要となる条件(県で行うべき修繕範囲)等が明確になっていない。	【米子港】 ・護岸等の引き継ぎにあたり、必要となる条件等について引き継ぎ国と調整を行う。
10	鳥根県 (河川課)	1. 計画事業 安全な暮らしを守る県単河川緊急整備事業 2. 計画年次 平成24年度～ 3. 計画箇所 ①吉田川 安来市下坂町福井地区 ②木戸川 安来市安来町河口付近近 4. 取り組み概要 ①一級河川吉田川: 安来市下坂町福井地区 平成24年度「福井団地」の浸水対策として、吉田川自己流HWLまでの堤防嵩上げを行った。平成25年度は大型水路逆流防止対策としてゲートを設置した。 ②一級河川木戸川: 安来市安来町河口付近 木戸川河口部の浸水対策については、現地測量・調査、対策工法の検討を実施中。	①一級河川吉田川 「福井団地」の浸水対策は平成25年度に完了した。 ②一級河川木戸川 木戸川河口部の浸水対策として、左岸堤防の嵩上げ工事、右岸逆流防止対策が必要。	②一級河川木戸川 - 左岸:今年度、地元の詳細が得られれば、堤防の嵩上げ工事を実施する予定。 - 右岸:今年度、逆流防止施設の設計を実施する予定。
11	鳥根県 (農村整備課)	1. 島田地区園営代行干拓事業 位置: 安来市島田町 工期: 昭和26～38年度 概要: 農地等造成37.3ha(田3.3ha、畑1.8ha、その他2.2ha) ※干拓堤防延長: 約1.8km 2. 島田地区干拓堤防の管理 管理対象: 干拓堤防(延長1.8km、土地1.4ha) 堤防管理者: 鳥根県 管理委託協定 S62年4月1日付け 委託者: 農林水産省 受託者: 鳥根県 管理概要: 県単予算により管理 H20～堤防補修(段階的)実施 H22 堤防全区間補修L=1,730m(事業費1.4億円) H14～草刈り等管理実施	・地元から、国土交通省への堤防移管の要望あり。 ・農政局・鳥根県・国土交通省出雲河川事務所 で移管についての協議を継続して実施しているが、築堤目的が農地の保全であること、移管後の維持管理費の負担等の課題がある。	農政局・国土交通省出雲河川事務所・鳥根県で移管についての協議を継続。 ○現状 ・移管対象施設の構造等の資料を出雲河川事務所へ提出。 ・平成25年度に対象施設の追加調査として、国庫補助事業により堤防の健全度調査を実施。 〔点検結果〕 島田地区干拓堤防の最下流部580mについて対策が必要 ・今後、この対策等について、安来市や農政局と協議予定。

(別 表)

中海に係る内水対策の取り組みの現状と課題、及び対応状況

(米子市建設部維持管理課)

○内水対策の取り組み状況	
1. 計画事業名	祇園町地区内水排除計画
2. 計画年次	平成15年度～
3. 計画箇所（エリア）	米子市祇園町地区 (別途図面、写真を添付)
4. 取り組みの概要	高潮と降雨の同時発生により浸水被害が発生しており、平成15年度から平成16年度に貯水槽（鉄筋コンクリート構造） $V=107.7\text{m}^3$ 1基及び排水ポンプ 11kW 、 $0\text{m}^3/\text{min}$ 1基を鳥取県が設置し、平成23年度より米子市が引き継いでおります。
○取り組みに対する課題等	
現在設置された貯水槽及びポンプのみでは、地区全体の内水排除は十分ではなく、今後、上流域の流出流量の分散及びポンプ能力の向上を図る必要がある。	
○課題等に対する検討・対応状況（取り組みの進捗状況）	
鳥取県が設置し、市が樋門管理委託を受託している別添図面の樋門のうちB-3の簡易樋門を除き、平成22年度、鳥取県において漏水を防ぎ水密性を高める工事を行っていただいた。	
また、内水排除として平成23年度に道路横断管の設置工事を実施するとともに仮設ポンプを1基設置しました。平成24年度から2基設置。	
平成26年度も設置完了（仮設ポンプ設置期間：6月～10月）	

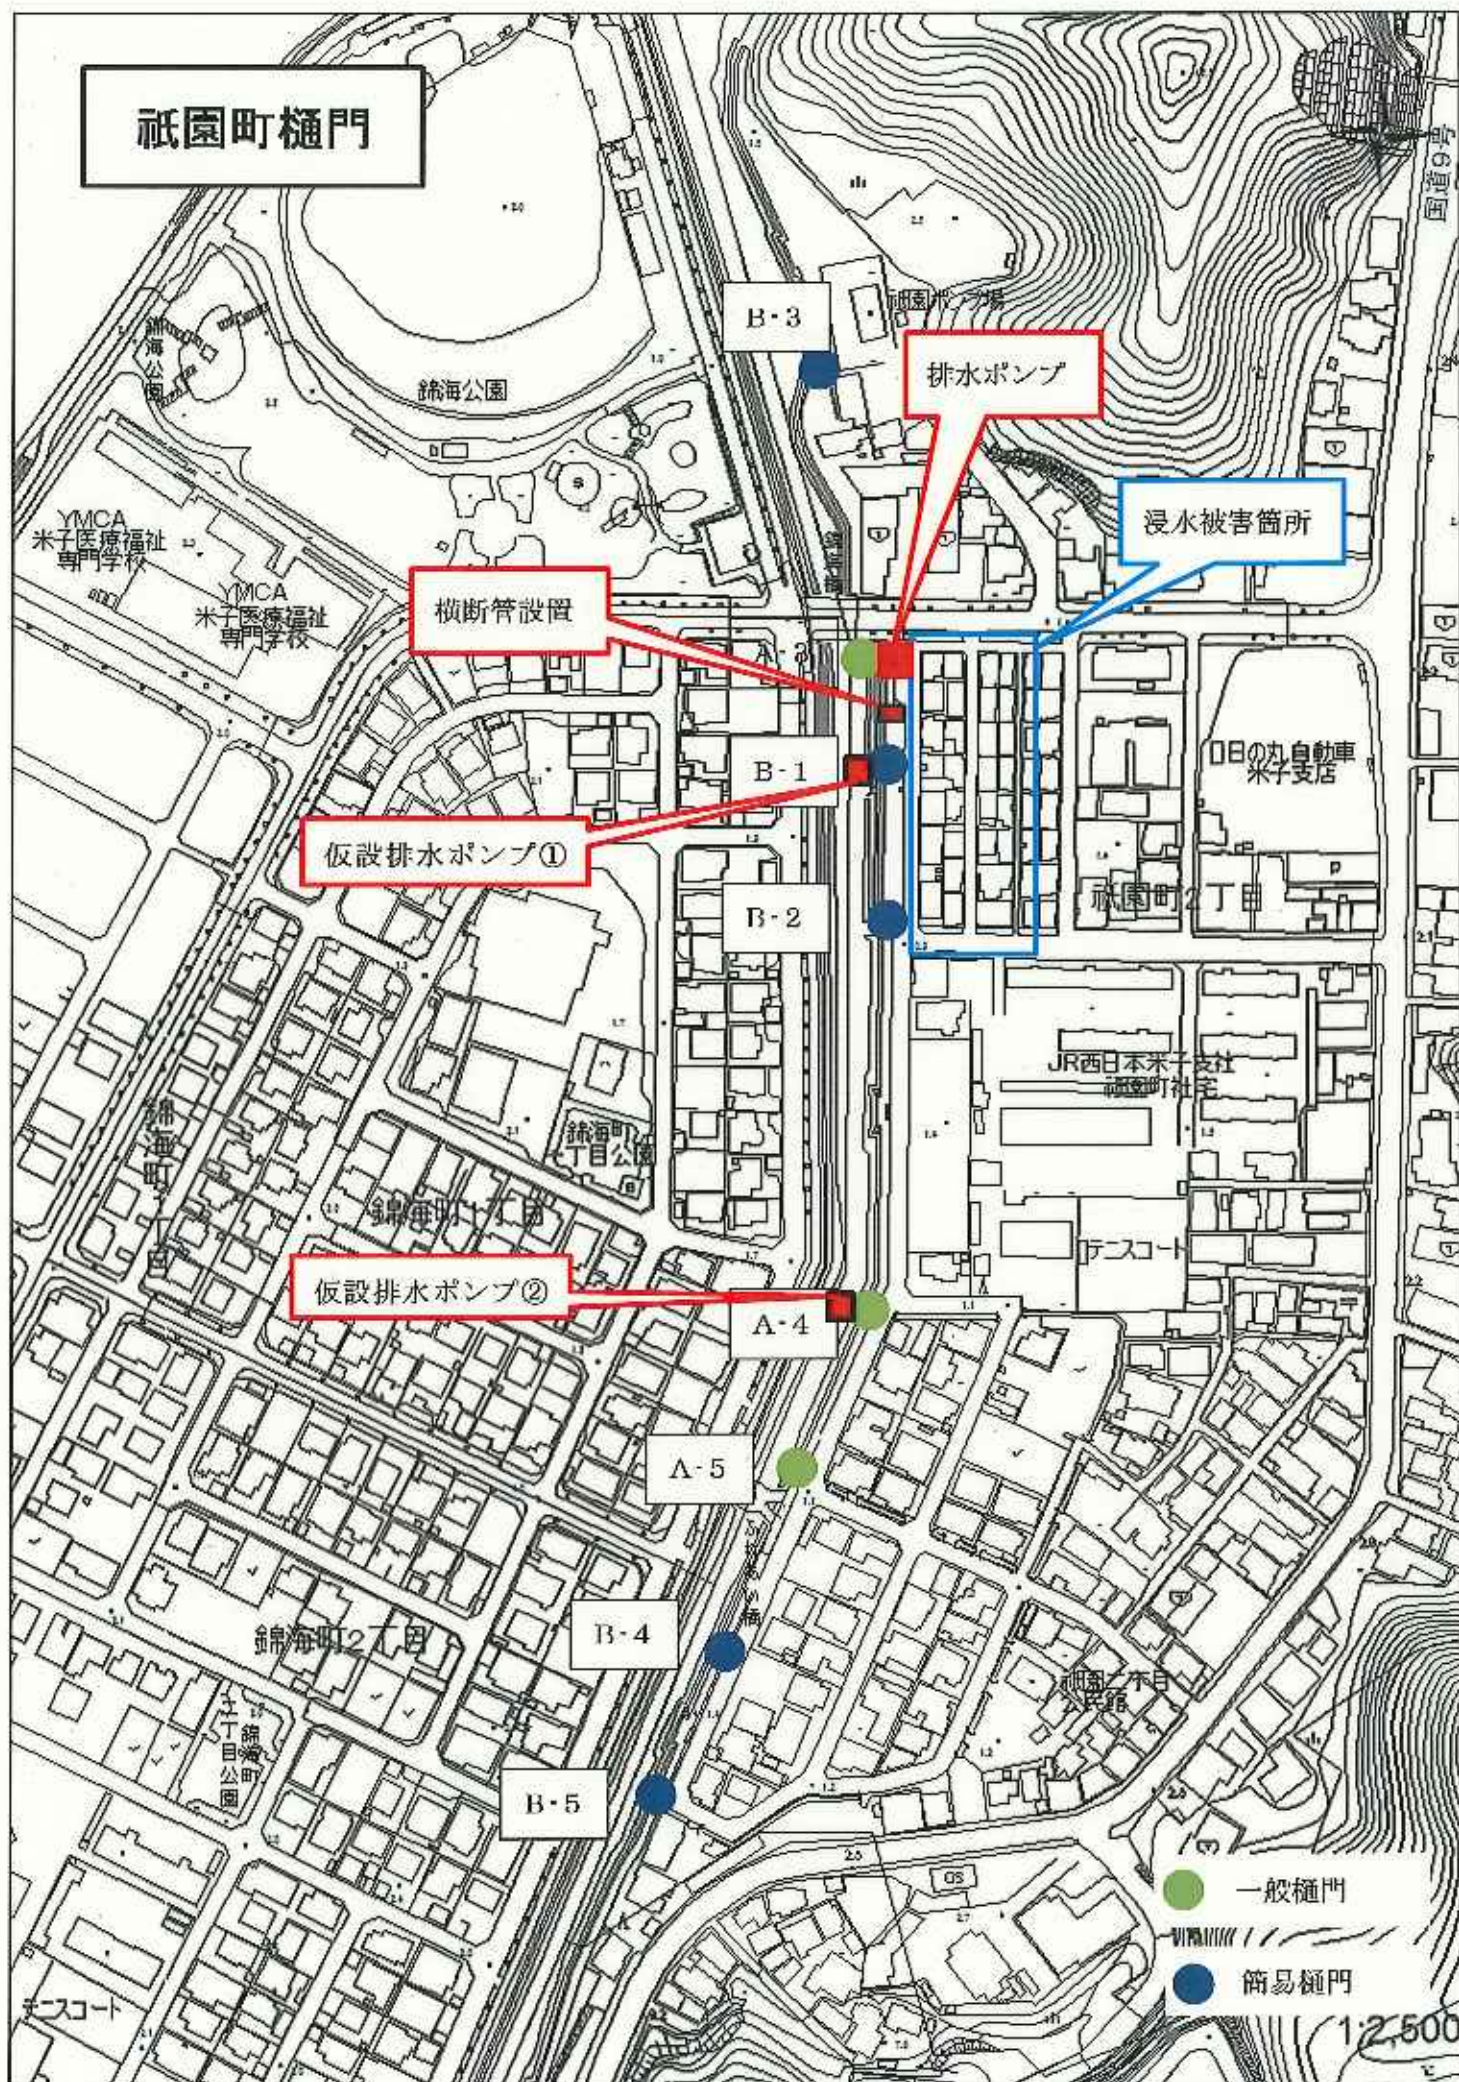

祇園町地区内水排除計画

ポンプ(承水路側から見て)



ポンプ(道路側から見て)



仮設排水ポンプ(北側)



仮設排水ポンプ(南側)



仮設排水ポンプ(北側)



仮設排水ポンプ(南側)



横断管設置



横断管設置(詳細)



(別 表)

中海に係る内水対策の取り組みの現状と課題、及び対応状況

(米子市建設部維持管理課)

○内水対策の取り組み状況


- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| 1. 計画事業名 | 準用河川四反田川樋門設置事業 |
| 2. 計画年次 | 平成10年度～ |
| 3. 計画箇所（エリア） | 米子市陰田町地区
(別途図面、写真を添付) |
| 4. 取り組みの概要 | 中海の潮位上昇に伴う準用河川四反田川への逆流防止のため設置工事を行った。 |

○取り組みに対する課題等

樋門を閉じた場合、内水排除

○課題等に対する検討・対応状況（取り組みの進捗状況）

平成24年度から内水排除対策として仮設排水ポンプを1基設置
平成26年度も設置完了（仮設ポンプ設置期間：6月～10月）

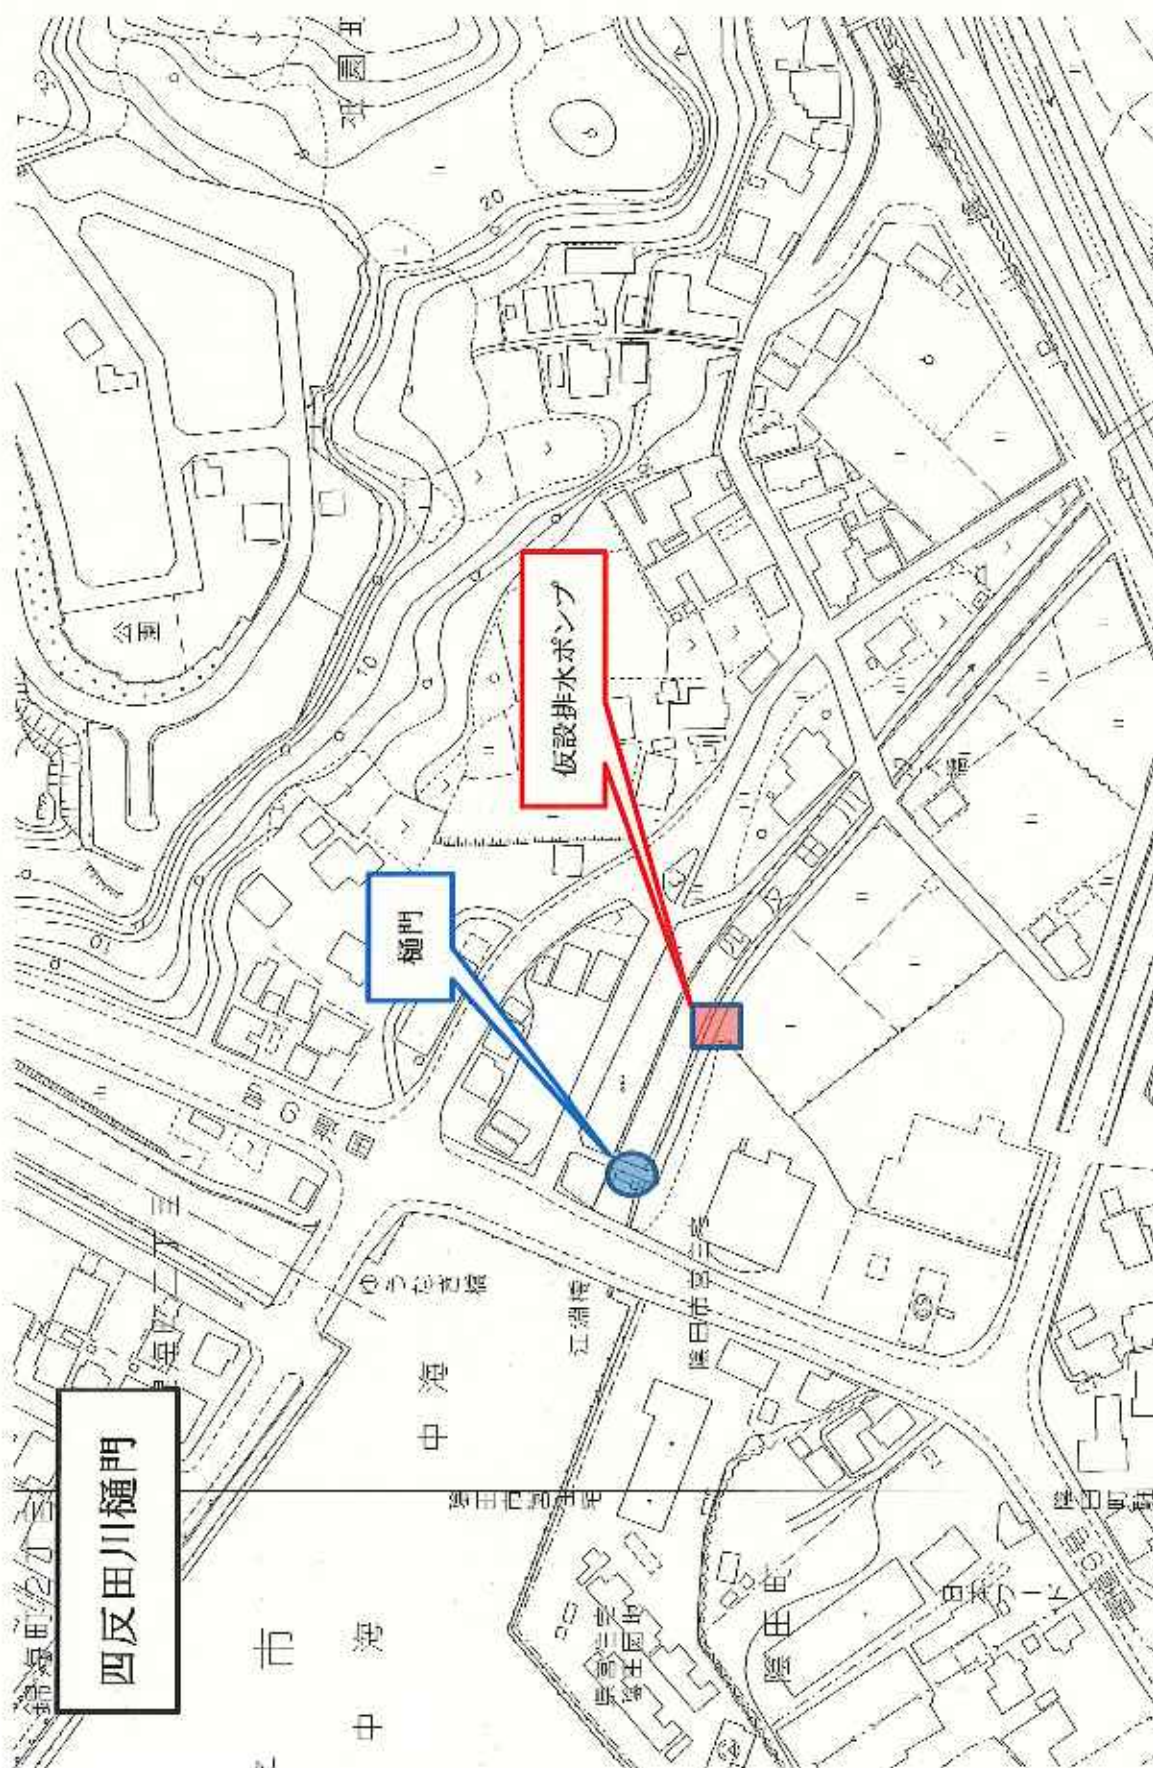

準用河川四反田川樋門設置事業

樋門(下流側から見て)



仮設排水ポンプ



仮設排水ポンプ(北側)



中海に係る内水対策の取り組みの現状と課題、及び対応状況

(境港市建設部管理課) NO.1

○内水対策の取り組み状況

- 1 計画事業名 外江・渡地区内水排除対策事業
- 2 計画年次 平成 21 年度～
- 3 計画箇所 境港市外江・渡地区
- 4 取り組みの概要

当該地区は、家屋が連担する地域であるが、護岸背後の地盤が低いために高潮時に外水の被害をたびたび受けてきた。これまでの高潮時の対策は、護岸背後地の排水路河口に設置されている数か所の集水桝において、樋板により外水を遮断し、移動式水中ポンプで内水を強制排除してきた。これらの方法では、人員確保や初動体制の遅れなどいくつかの問題点があったため、固定式の内水排除ポンプ施設の整備を行うことで、内水排除対策とこれまでの問題点を解消するものである。

○取り組みに対する課題等

市内には、高潮時に移動式ポンプで内水を強制排水している箇所が他にも多く点在することから、今後も、吐口の統廃合並びに樋門の整備も含めて検討を行い、その整備主体、管理における関係機関での役割分担も明確にしておく必要がある。


○課題等に対する検討・対応状況（取り組みの進捗状況）

（外江地区）

- ・平成 21 年度：外江中央都市下水路河口にマンホール式水中ポンプ施設設置
(設置：境港管理組合)
- ・平成 23 年度：外渡都市下水路河口にマンホール式水中ポンプ施設設置
- ・平成 26 年度：外江地区現況雨水系統調査・雨水基本設計業務
- ・平成 27 年度～外江地区雨水実施設計業務、外江地区雨水排水路整備工事

（渡地区）

- ・平成 23 年度：渡地区雨水基本設計業務
- ・平成 24 年度：渡地区雨水実施設計業務
- ・平成 24 年度～渡地区雨水排水路整備工事
- ・平成 27 年度～樋門工事、旧渡漁港水域埋立事業、渡漁港地区内水排除施設整備

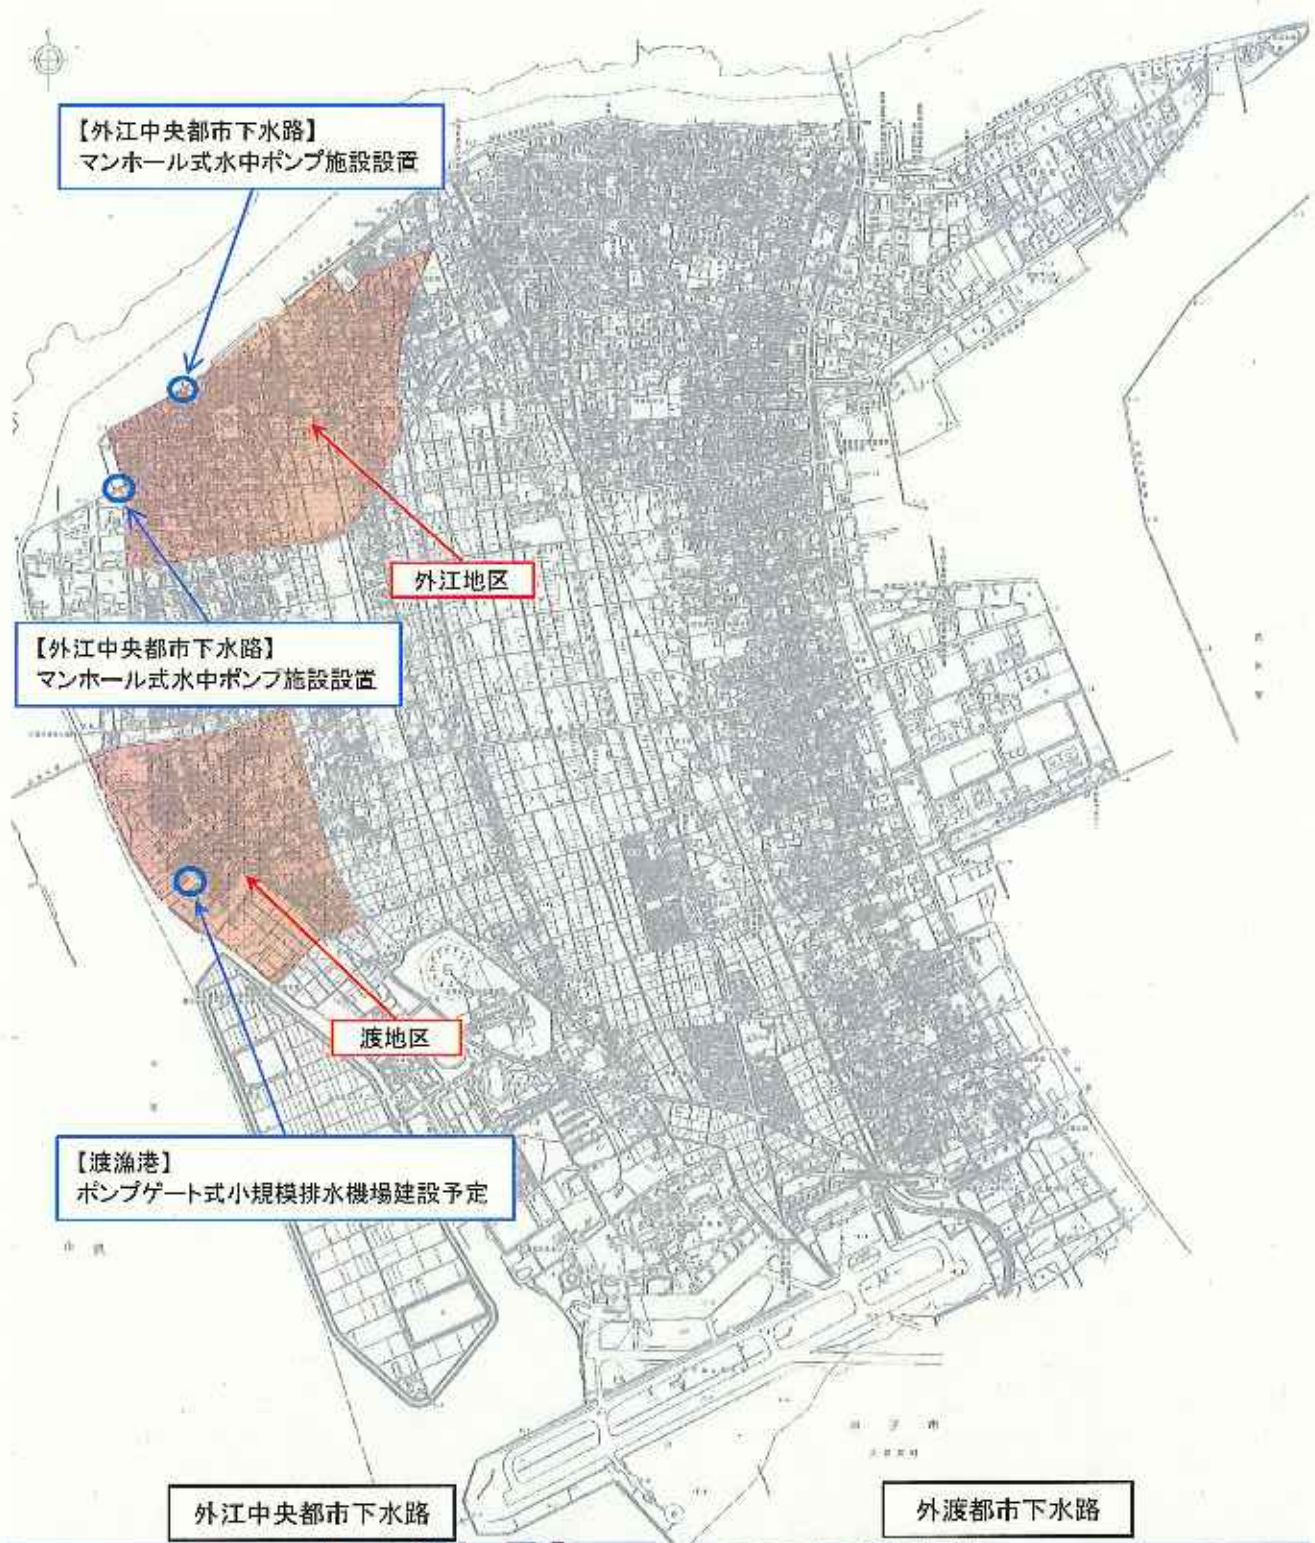

中海に係る内水対策の取り組みの現状と課題、及び対応状況

(境港市建設部管理課) NO.2

○内水対策の取り組み状況

- 1 計画事業名 西工業団地内水排除対策事業
- 2 計画年次 平成 24 年度～
- 3 計画箇所 境港市西工業団地
- 4 取り組みの概要

当該地区には、民間所有の水域貯木場があり、斐伊川本線（中海）との間において護岸が未整備で開口状況にあり、高潮時には背後地の居住地域や工業団地にもその影響が及んでいる。

これらのことから、平成 22 年 9 月に策定された斐伊川水系河川整備計画において、短期整備箇所に位置づけられた。

斐伊川河川整備計画に基づき、当該護岸が整備されることにより、中海と水域（貯木場）が締め切られることから、背後地域における現況の雨水排水系統を見直す必要が生じるため、境港市では、現況の雨水排水系統調査を実施し、適切な排水ルートを決するとともに、新たな排水路整備並びに排水路河口部における樋門、並びに内水排除施設整備を行う事としている。

○取り組みに対する課題等

護岸が整備された後(締切工事後)、新たな排水路の完成まで、仮排水路で対応するため内水排除に対して十分な機能が確保できない。

○課題等に対する検討・対応状況（取り組みの進捗状況）

- ・平成 24 年度：西工業団地現況雨水排水系統調査・雨水基本設計業務
- ・平成 25 年度：西工業団地雨水実施設計業務・樋門予備設計業務
- ・平成 26 年度：樋門詳細設計業務
- ・平成 27 年度～西工業団地雨水排水施設整備工事

中海に係る内水対策の取り組みの現状と課題、及び対応状況

(境港市建設部管理課) NO.8

○内水対策の取り組み状況

- 1 計画事業名 岬町、並びに境水道沿岸背後地区における内水排除対策事業
- 2 計画年次 平成 10 年度～(平成 22 年度に計画完了)
- 3 計画箇所 境港市岬町周辺(民有地)、その他境水道沿岸地区
- 4 取り組みの概要

当該地区には、民間所有の造船所があり、斜路や一部民有の護岸が存在している。護岸事態も低く高潮時の影響を受けるほか、造船所背後地が低いことから、護岸の改修並びに内水排除対策が求められている。

また、この地域と隣接する境水道に面する護岸背後地域における浸水、内水排除対策の必要も指摘されている。

これらの地域における対策については、平成 22 年に定められた斐伊川河川整備計画においては、長期的に検討されるべき地区として計画(20 年間)には明記されなかった。

その際に、各自治体で実施が検討されている内水対策が明らかになった時点で調整を図り、必要な堤防等の整備を行うという指摘を受けたことから、境港市では、これらの地域における内水排除対策計画(公共下水道雨水計画)を策定し、護岸改修と併せて整備を行っていく事としている。

○取り組みに対する課題等

- ・護岸の所有者(関係機関)との連絡調整
河川区域、漁港区域、港湾区域が複層することから関係機関との認識共有が必要
- ・背後地域における内水排除計画の作成
- ・具体的な護岸整備に向けた事業化

○課題等に対する検討・対応状況(取り組みの進捗状況)

(雨水計画策定)

- ・平成 10 年度 境港市公共下水道事業計画事業変更認可
- ・平成 16 年度 境港市公共下水道事業計画事業変更認可
- ・平成 22 年度 境港市公共下水道事業計画事業変更認可



中海に係る内水対策の取り組みの現状と課題、及び対応状況

(松江市河川課)

内水対策の取り組み状況

1. 計画事業名 八束排水路整備工事

2. 計画年次 平成19年度～平成25年度

3. 計画箇所（エリア） 八束町入江、三子、寺津、亀尻、馬渡地区
(別添図面)

4. 取り組みの概要

中国四国農政局による、八束町の中海北西護岸部分への護岸堤防施設（道路建設、埋め立て）建設に伴い、既設水路84箇所を30箇所へ統合し、新たに排水路約5.5kmの整備を行い中海へ内水を排除するもの。

道路建設は農政局に替わって島根県が施工し、排水路整備は農政局が施工し平成25年度に完了した。

内水排除対策として、市の河川管理施設として帰属を受けた。

外水対策として設置された樋門等は、治水上影響の大きい施設であるスライドゲートは国交省出雲河川事務所、その他フラップゲート25箇所は市河川課が管理を行っている。

○取り組みに対する課題等

埋め立てにより残水域として残る不整形な土地利用方法について、関係機関で十分検討を行う必要がある。


新設された排水路は水路勾配も緩く、土砂流入も多いため排水路の浚渫等、維持管理が必要となる。

フラップゲートの点検等により、機能確保が必要となる。

○課題に対する検討・対応状況（取り組みの進捗状況）

フラップゲートの点検を行っている。

八束排水路工事 排水路位置图

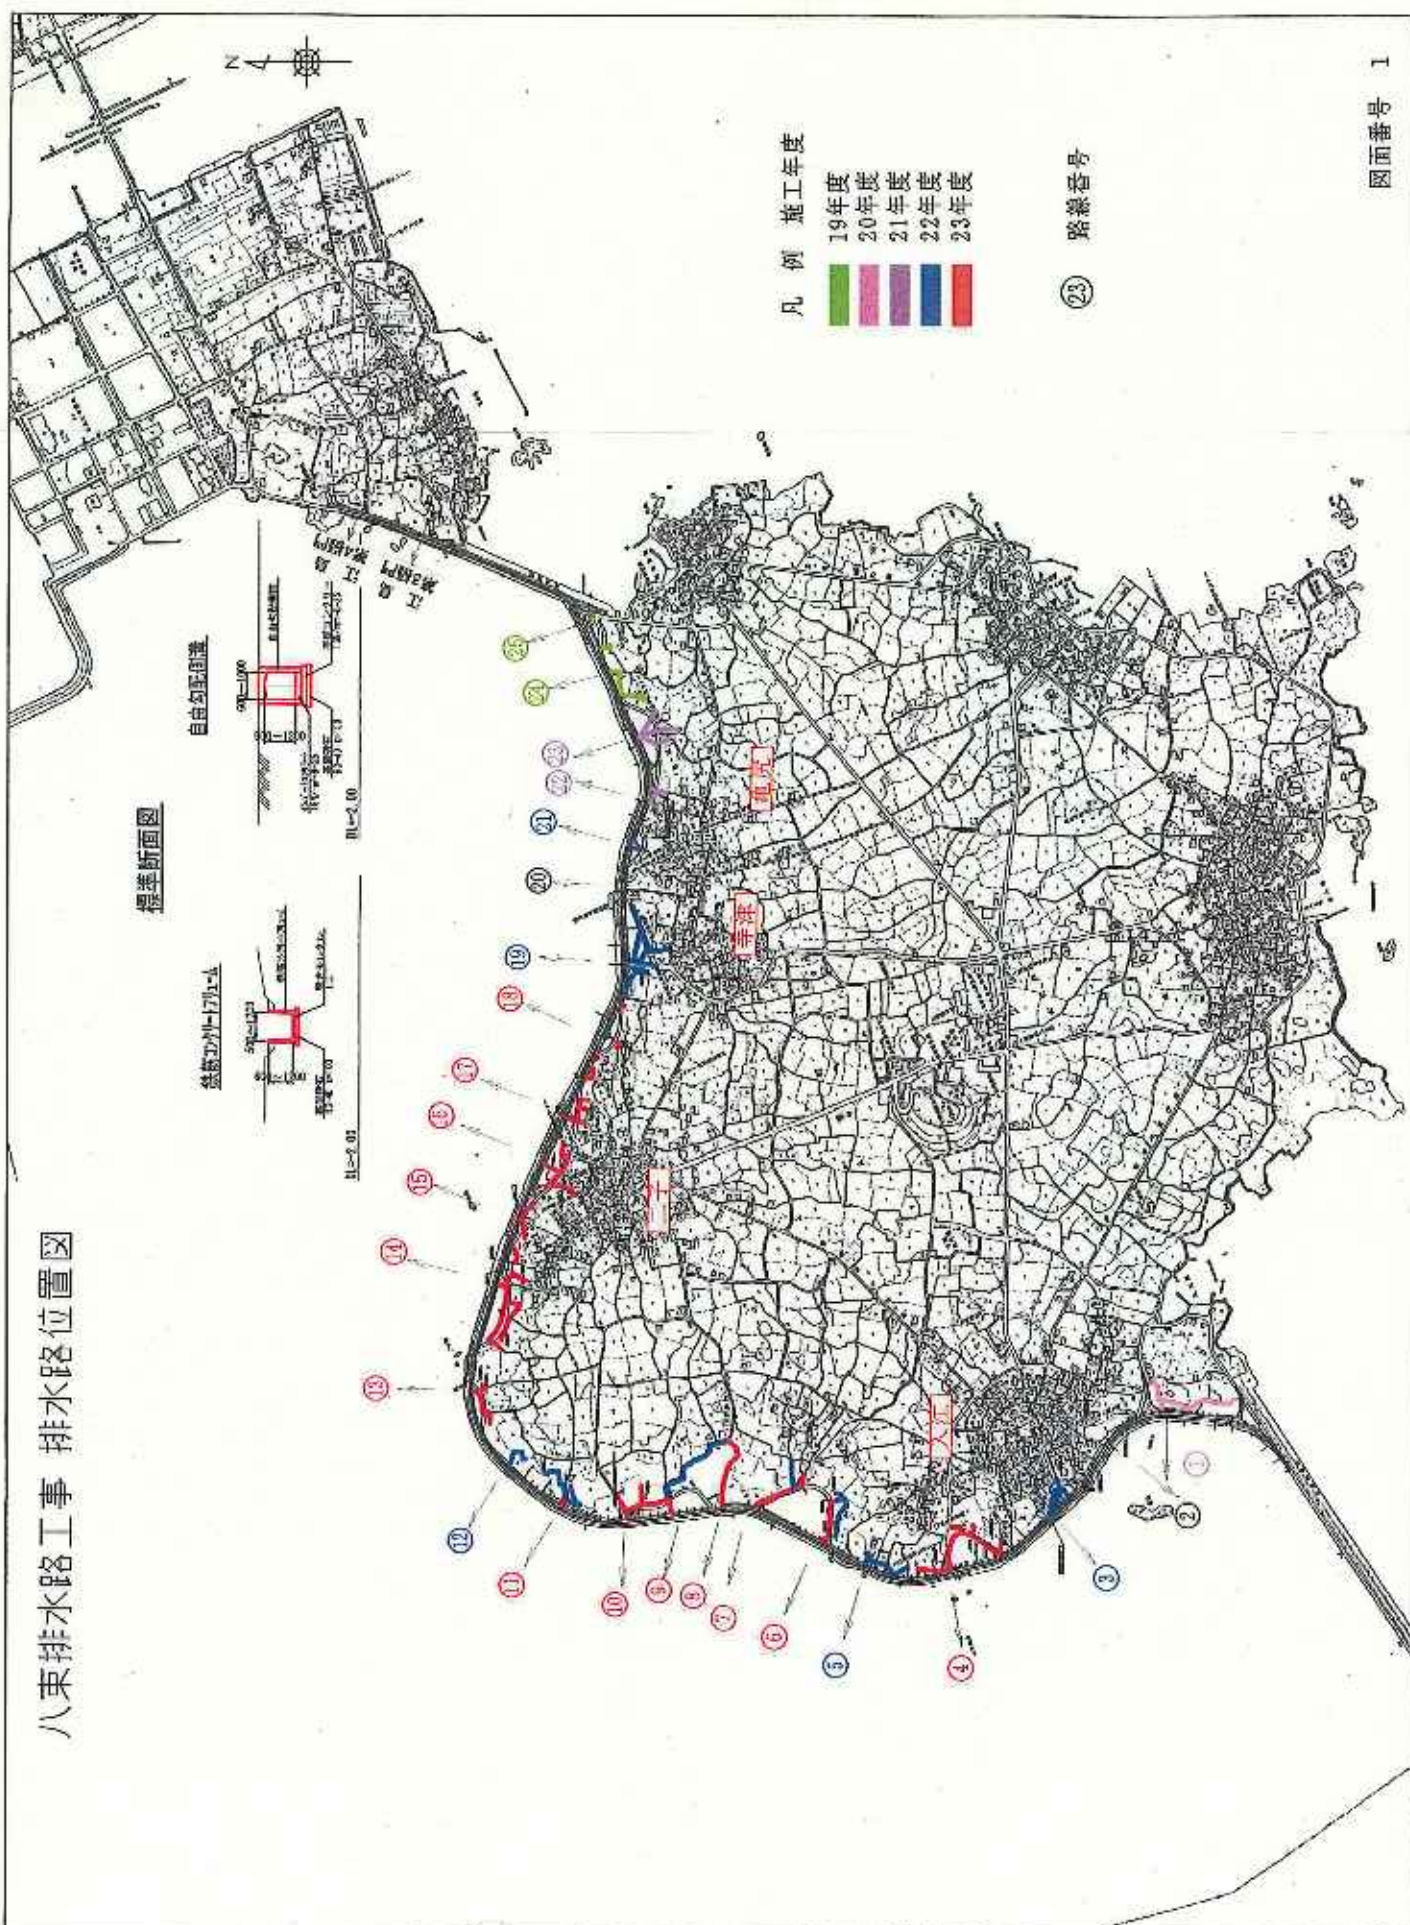

中海に係る内水対策の取り組みの現状と課題、及び対応状況

(松江市河川課)

○内水対策の取り組み状況

1. 計画事業名 河川・排水路改良事業

2. 計画年次 通年

3. 計画箇所（エリア） 松江市大井町地内～美保関
(別添図面)

4. 取り組みの概要

地元要望等に基づき、松江市内全域を対象に行っている河川排水路改良工事のなかで、中海沿岸の普通河川においても、内水対策のため改良工事を実施している。

また、治水対策の一環として、中海に放流する普通河川についても浚渫事業に取り組んでいる。

○取り組みに対する課題等

限られた事業費の中で、市内全域を対象とした事業であり、中海の計画エリアに集中して投資できないため、中海の護岸整備にあわせ、普通河川及び排水路の取付け区間十分確保し整備してもらう。

○課題に対する検討・対応状況（取り組みの進捗状況）

平成25年度は、新庄町地内の平地川改修（ブロック積護岸）事業により27.5m施工した。改修事業と合わせて浚渫事業を行った。

平成26年度は約20m区間を計画している。



中海に係る内水対策の取り組みの現状と課題、及び対応状況

(安来市 上下水道部 下水道課)

○内水対策の取り組み状況

1. 計画事業名 下水道雨水排水整備事業 南十神地区
2. 計画年次 平成25年度 ～ 平成28年度
3. 計画箇所 安来市 南十神地区 (別添位置図を参照)
4. 取り組みの概要
 - 1) 西ノ川水路と前ノ川水路を連結し下流で1本化を図る。
 - 2) 中海の潮位上昇による逆流防止と洪水時の内水排除のためにゲートポンプを設置する。


○取り組みに対する課題等

- 1) ゲート設置に向け、仮設計画も含めた具体的な施工方法、予算計画等を樹立すること。

○課題等に対する検討・対応状況 (取り組みの進捗状況)

- 1) 下水道雨水排水事業として認可を得た。
- 2) ポンプ場、雨水渠の詳細設計を発注し、施工計画、仮設計画、予算計画等の具体的な検討を開始した。

下水道雨水排水整備事業 南十神地区 位置図

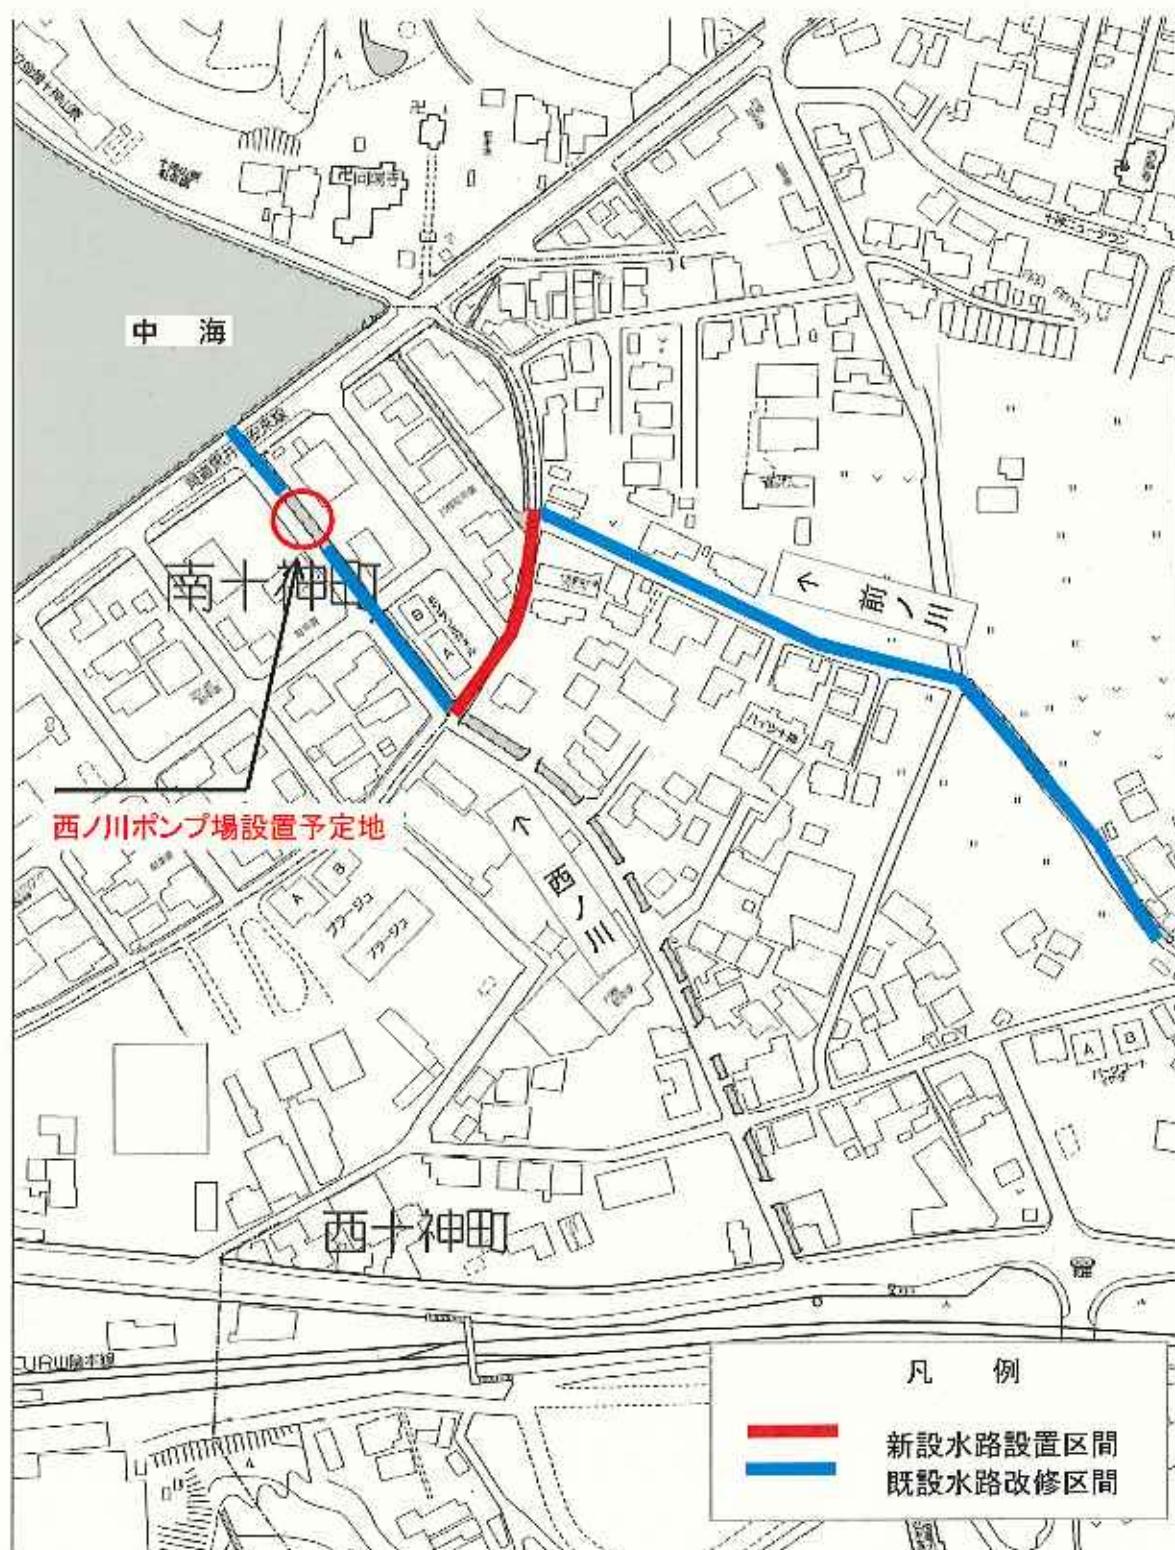

中海に係る内水対策の取り組みの現状と課題、及び対応状況

(鳥取県 空港港湾課)

○取り組み状況

【米子港】

- ・護岸（パラペット等）について、短期整備区間については着手済。短中期・中期整備区間の早期に着手していただけるよう、測量を実施中。今後、設置位置や構造について、国土交通省と調整を実施する予定。
- ・背後に港湾施設のない地域については、護岸の引き継ぎに必要な条件等について、国と協議中。

【境漁港】

- ・矢板岸壁の防食対策（機能保全事業）を平成23年度から実施中。（平成26年度完了予定）

<以下、市管理漁港のため参考>

【渡漁港】（境港市管理漁港）

- ・漁港区域の変更については、国の水産審議会にて承認済み。工事完成後、境港市において、漁港区域の変更を告示予定。
- ・現漁港の財産処分については、平成25年9月に水産庁に申請書を提出し、同年10月に承認された。
- ・漁港区域の埋立申請については、今後境港市の申請をもとに県が承認する予定。

【崎津漁港】（米子市管理漁港）

- ・国土交通省による護岸嵩上げは、平成22年度までに完了した。

○取り組みに対する課題等


【米子港】

- ・護岸の国への引き継ぎにあたり、必要となる条件（県で行うべき修繕範囲）等が明確になっていない。

○課題等に対する検討・対応状況（取り組みの進捗状況）

【米子港】

- ・護岸等引き継ぎにあたり、必要となる条件等について引き続き国と調整を行う。

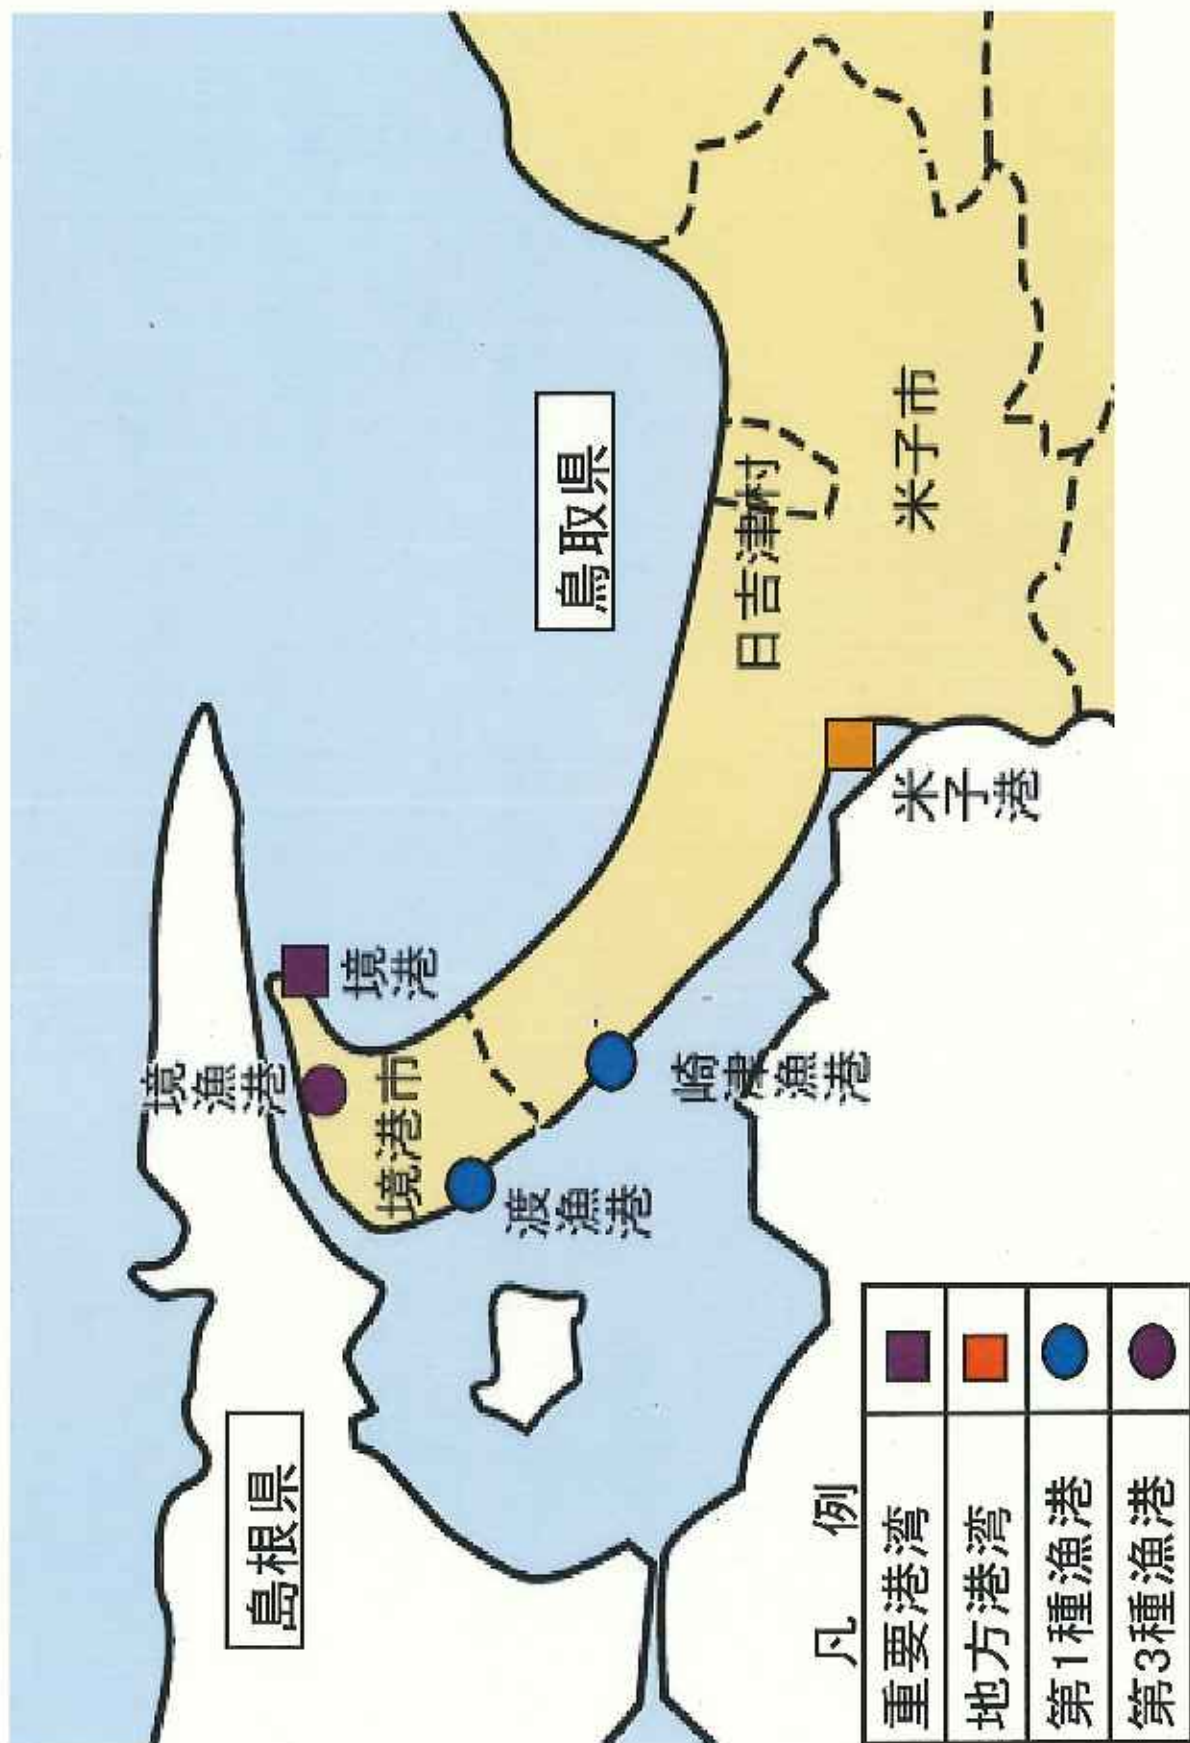

(別 表)

中海に係る内水対策の取り組みの現状と課題、及び対応状況

(島根県 河川課)

○内水対策の取り組み状況

1. 計画事業名

安全な暮らしを守る県単河川緊急整備事業

2. 計画年次

平成24年度～

3. 計画箇所（エリア）

・1級河川吉田川 安来市下坂田町福井地区 (別途図面参照)

・1級河川木戸川 安来市安来町河口付近 (別紙図面参照)

4. 取り組みの概要

・1級河川吉田川 安来市下坂田町福井地区

平成24年度「福井団地」の浸水対策として、吉田川自己流 H.W.L までの堤防嵩上げを行った。

平成25年度 大型水路逆流防止対策として、ゲートを設置した。

・1級河川木戸川 安来市安来町河口付近

木戸川河口部の浸水対策については、現地測量・調査、対策工法の検討を実施中。

○取り組みに対する課題等

・1級河川吉田川 安来市下坂田町福井地区

「福井団地」の浸水対策は、平成25年度に完了した。

・1級河川木戸川 安来市安来町河口付近

木戸川河口部の浸水対策として、左岸堤防の嵩上げ工事、右岸逆流防止対策が必要。

○課題等に対する検討・対応状況 (取り組みの進捗状況)

・1級河川木戸川 安来市安来町河口付近

左岸：今年度、地元の了解が得られれば、堤防の嵩上げ工事を実施する予定。


右岸：今年度、逆流防止施設の設計を実施する予定。

吉田川河口部浸水対策について

島根県土木部河川課



烏根系十木部河川課

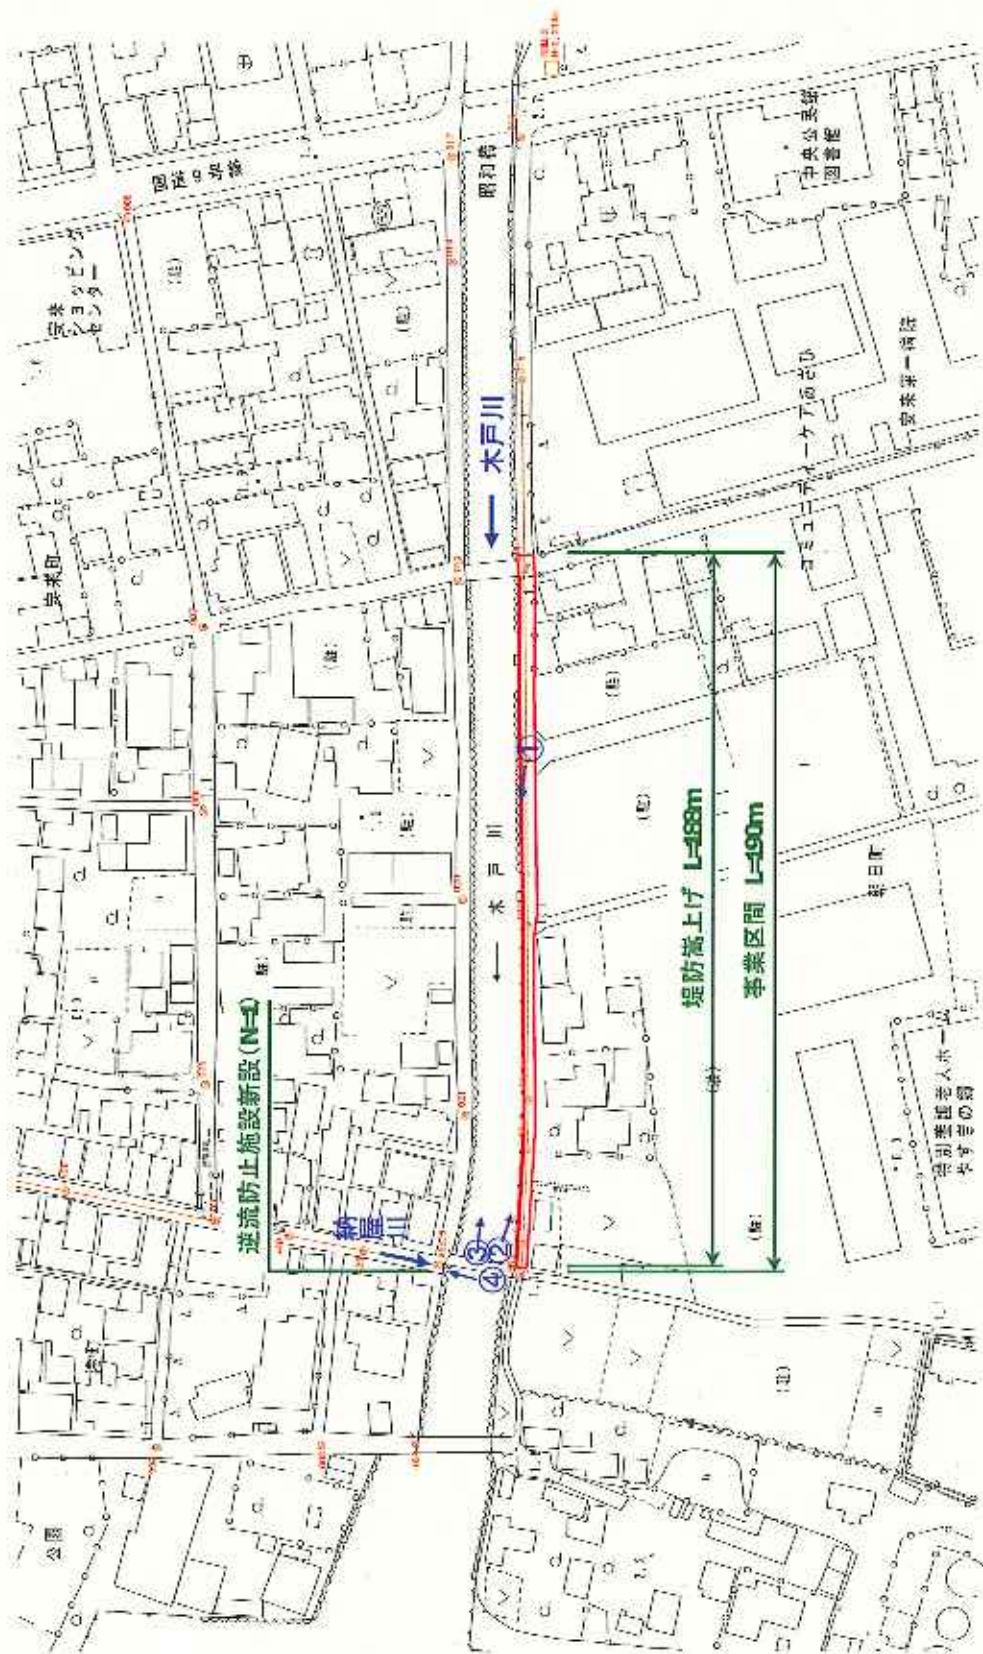

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

木戸川河口部浸水対策について (2 / 2)



(別 表)

中海に係る内水対策の取り組みの現状と課題、及び対応状況

(島根県 農林水産部農村整備課)

○内水対策の取り組み状況

1. 島田地区国営代行干拓事業

位 置：安来市島田町

工 期：昭和26～38年度

工事概要：農地等造成 37.3ha (田 3.3ha、畑 1.8ha、その他 2.2ha)

※干拓堤防延長 約 1.8km

2. 島田地区干拓堤防の管理

管 理 対 象：干拓堤防(延長 1.8km、土地 1.4ha)

堤防管理者：島根県

管理委託協定 S62.4.1 付け、

委託者：農林水産省 受託者：島根県

管 理 概 要：県単予算により管理

H20～ 堤防補修(段階的)実施

H22 堤防全区間補修 L=1,730m、事業費 1.4 億円

H14～ 草刈り等管理実施

○取り組みに対する課題等

- ・地元から国土交通省への堤防移管要望あり。
- ・農政局、県、国土交通省出雲河川事務所で移管についての協議を継続して実施しているが、築堤目的が農地の保全であること、移管後の維持管理費の負担等の課題がある。

○課題等に対する検討・対応状況 (取り組みの進捗状況)

農政局、国土交通省出雲河川事務所、県で移管についての協議を継続。

現状：移管対象施設の構造等の資料を出雲河川事務所へ提出

H25 対象施設の追加調査として国庫補助事業により堤防の健全度調査実施

- ・堤防の健全度の点検結果

島田地区干拓堤防の最下流部 580mについて対策が必要

今後、この対策について安来市や農政局と協議。
