

# 高梁川（清音地区・中原地区）災害復旧工事



～2018年7月豪雨災害による漏水の発生を受けて、直轄河川災害復旧事業および直轄河川災害関連緊急事業にて、漏水箇所の遮水工を実施しています～

工事では大変ごめいわくをおかけいたしております。  
工事の進み具合などを定期的にお知らせするため配布・掲示・回覧等にて地域の皆様に情報提供いたしております。


★工事に関するお問い合わせ★  
国土交通省 中国地方整備局  
岡山河川事務所  
高梁川災害復旧対策出張所  
☎086-465-1880  
担当：山下建設監督官  
または、現場職員へお気軽に！



## 事業の流れ



もうこれ以上被害が出ない様、悪い鬼（災害）を追い払いましょう！

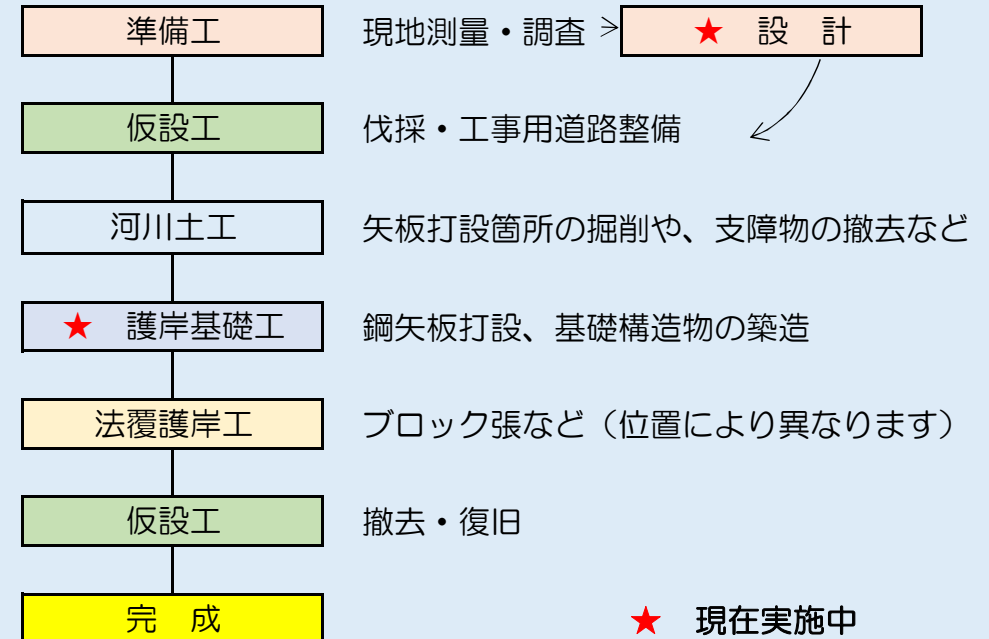

## 実施の状況です

メイン工種である、鋼矢板の掘削圧入作業を行っています！



矢板高さに合わせ筋掘します



大型クレーンを搬入し  
現地で組み立てます



製作された鋼矢板が搬入され



掘削併用圧入機で、施工していきます



先端の超硬ビット  
で破砕掘削します

がんばろう総社

2019そうじゃ吉備路マラソン「復興支援チャリティマラソン」2月24日(日)

市民が支え、みんなが主役の手作りマラソン！走ろう歴史ロマンあふれる早春の吉備路を！








# ドローンによる上空からの写真

撮影:平成31年1月15日

## 清音工区

工事起点から  
川辺橋付近

下流より上流を  
のぞむ

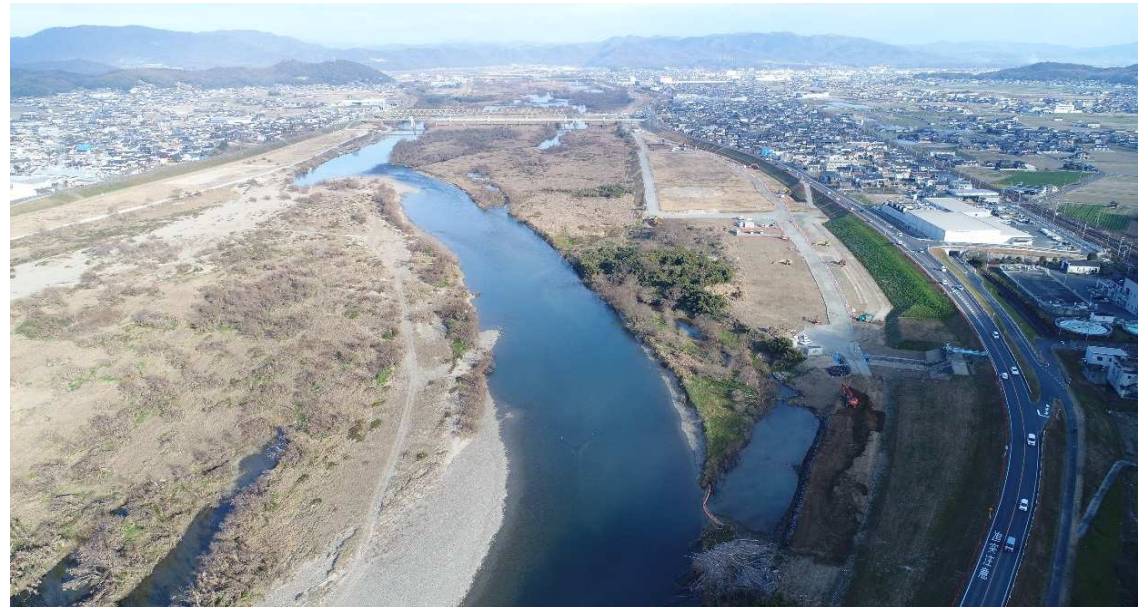

工事起点から  
川辺橋付近

上流より下流を  
のぞむ



川辺橋から

ポンプ場付近

下流より上流を  
のぞむ



川辺橋から

ポンプ場付近

上流より下流を  
のぞむ



## 中原工区

ポンプ場から  
工事終点付近

下流より上流を  
のぞむ



ポンプ場から  
工事終点付近

上流より下流を  
のぞむ







1 月末時

各工区の進捗状況です！  
安全第一で作業しています

今後とも、ご理解  
ご協力をお願いします！

今月は主に、各工区にて矢板打設用の  
床掘を終えています。  
また、早いところでは  
機械搬入～圧入開始まで行っています

各所に設置した観測井戸や各水源地施設や  
企業様のデータ提供のご協力を得ながら  
水質や水量の変異などないか、  
確認しながら施工しています！

|                 |
|-----------------|
| 清音地区            |
| その1工区 三宅建設(株)   |
| 進捗率： 9 %        |
| 施工内容： 床掘を終えています |



作業状況



|                 |
|-----------------|
| 清音地区            |
| その2工区 (株)ニシテクノ  |
| 進捗率： 10.2 %     |
| 施工内容： 床掘を終えています |



作業状況



|                        |
|------------------------|
| 清音地区                   |
| その3工区 中央建設(株)          |
| 進捗率： 28 %              |
| 施工内容： 鋼矢板圧入を<br>行っています |



作業状況



|                        |
|------------------------|
| 清音地区                   |
| その4工区 蜂谷工業(株)          |
| 進捗率： 20 %              |
| 施工内容： 鋼矢板圧入を<br>行っています |



作業状況



|                        |
|------------------------|
| 清音地区                   |
| その5工区 (株)荒木組           |
| 進捗率： 13.1 %            |
| 施工内容： 鋼矢板圧入を<br>行っています |



作業状況



|                        |
|------------------------|
| 清音地区                   |
| 中原その1 中村建設(株)          |
| 進捗率： 18 %              |
| 施工内容： 鋼矢板圧入を<br>行っています |



作業状況



|                        |
|------------------------|
| 清音地区                   |
| 中原その2 天野産業(株)          |
| 進捗率： 20 %              |
| 施工内容： 鋼矢板圧入を<br>行っています |



作業状況



|                        |
|------------------------|
| 清音地区                   |
| 中原その3 (株)奥野組           |
| 進捗率： 30 %              |
| 施工内容： 鋼矢板圧入を<br>行っています |



作業状況



|                        |
|------------------------|
| 中原地区                   |
| その4工区 (株)竹内組           |
| 進捗率： 10 %              |
| 施工内容： 鋼矢板圧入を<br>行っています |



作業状況



|                        |
|------------------------|
| 中原地区                   |
| その5工区 (株)笹山工業          |
| 進捗率： 15 %              |
| 施工内容： 鋼矢板圧入を<br>行っています |



作業状況



|                        |
|------------------------|
| 中原地区                   |
| その6工区 (株)大都建設          |
| 進捗率： 11 %              |
| 施工内容： 鋼矢板圧入を<br>行っています |



作業状況

