

緊急対策特定区間事業進捗

令和7年12月時点

江の川中下流域 地区毎の治水対策一覧(図)

令和3年8月大雨による浸水状況



令和2年7月豪雨による浸水状況




平成30年7月豪雨による浸水状況



八神地区(太田)～水害に強い八神地区を創る治水事業～

- 八神地区(太田地区)は、平成28年度より事業(用地買収)着手。
- 令和5～6年度に用地買収完了箇所で埋蔵文化財発掘調査を実施。
- 令和7年度は新設樋門、地盤改良工法の設計を実施中。

R2年4月撮影

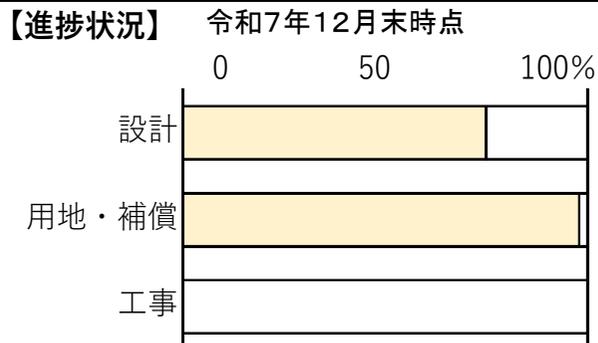

H30年7月豪雨浸水範囲

八神地区(下流)～水害に強い八神地区を創る治水事業～

- 令和5年12月に用地買収完了。
- 令和7年度は地区の上下流端部分の築堤盛土を実施中。樋門の扉体部分を残し令和7年度概成予定。

R7年12月撮影



【進捗状況】	令和7年12月末時点		
	0	50	100%
設計	100%		
用地・補償	100%		
工事	約80%		

八神地区(上流)～水害に強い八神地区を創る治水事業～

- 八神地区(八神上流地区)は、平成29年5月に用地買収完了。
- 令和3年3月に堤防部分完成。
- 令和4年3月に国道261号嵩上げ区間が完了し、一連区間の整備が完了。

R4年3月撮影



H30年7月洪水(写真①)



H30年7月洪水(写真②)





R4年3月撮影

田野・赤栗地区【家屋個別移転・防災集団移転】

➤ 令和5年度～令和10年度までに、家屋個別移転を実施予定。


R3年11月撮影

【進捗状況】	令和7年12月末時点		
	0	50	100%
用地・補償			

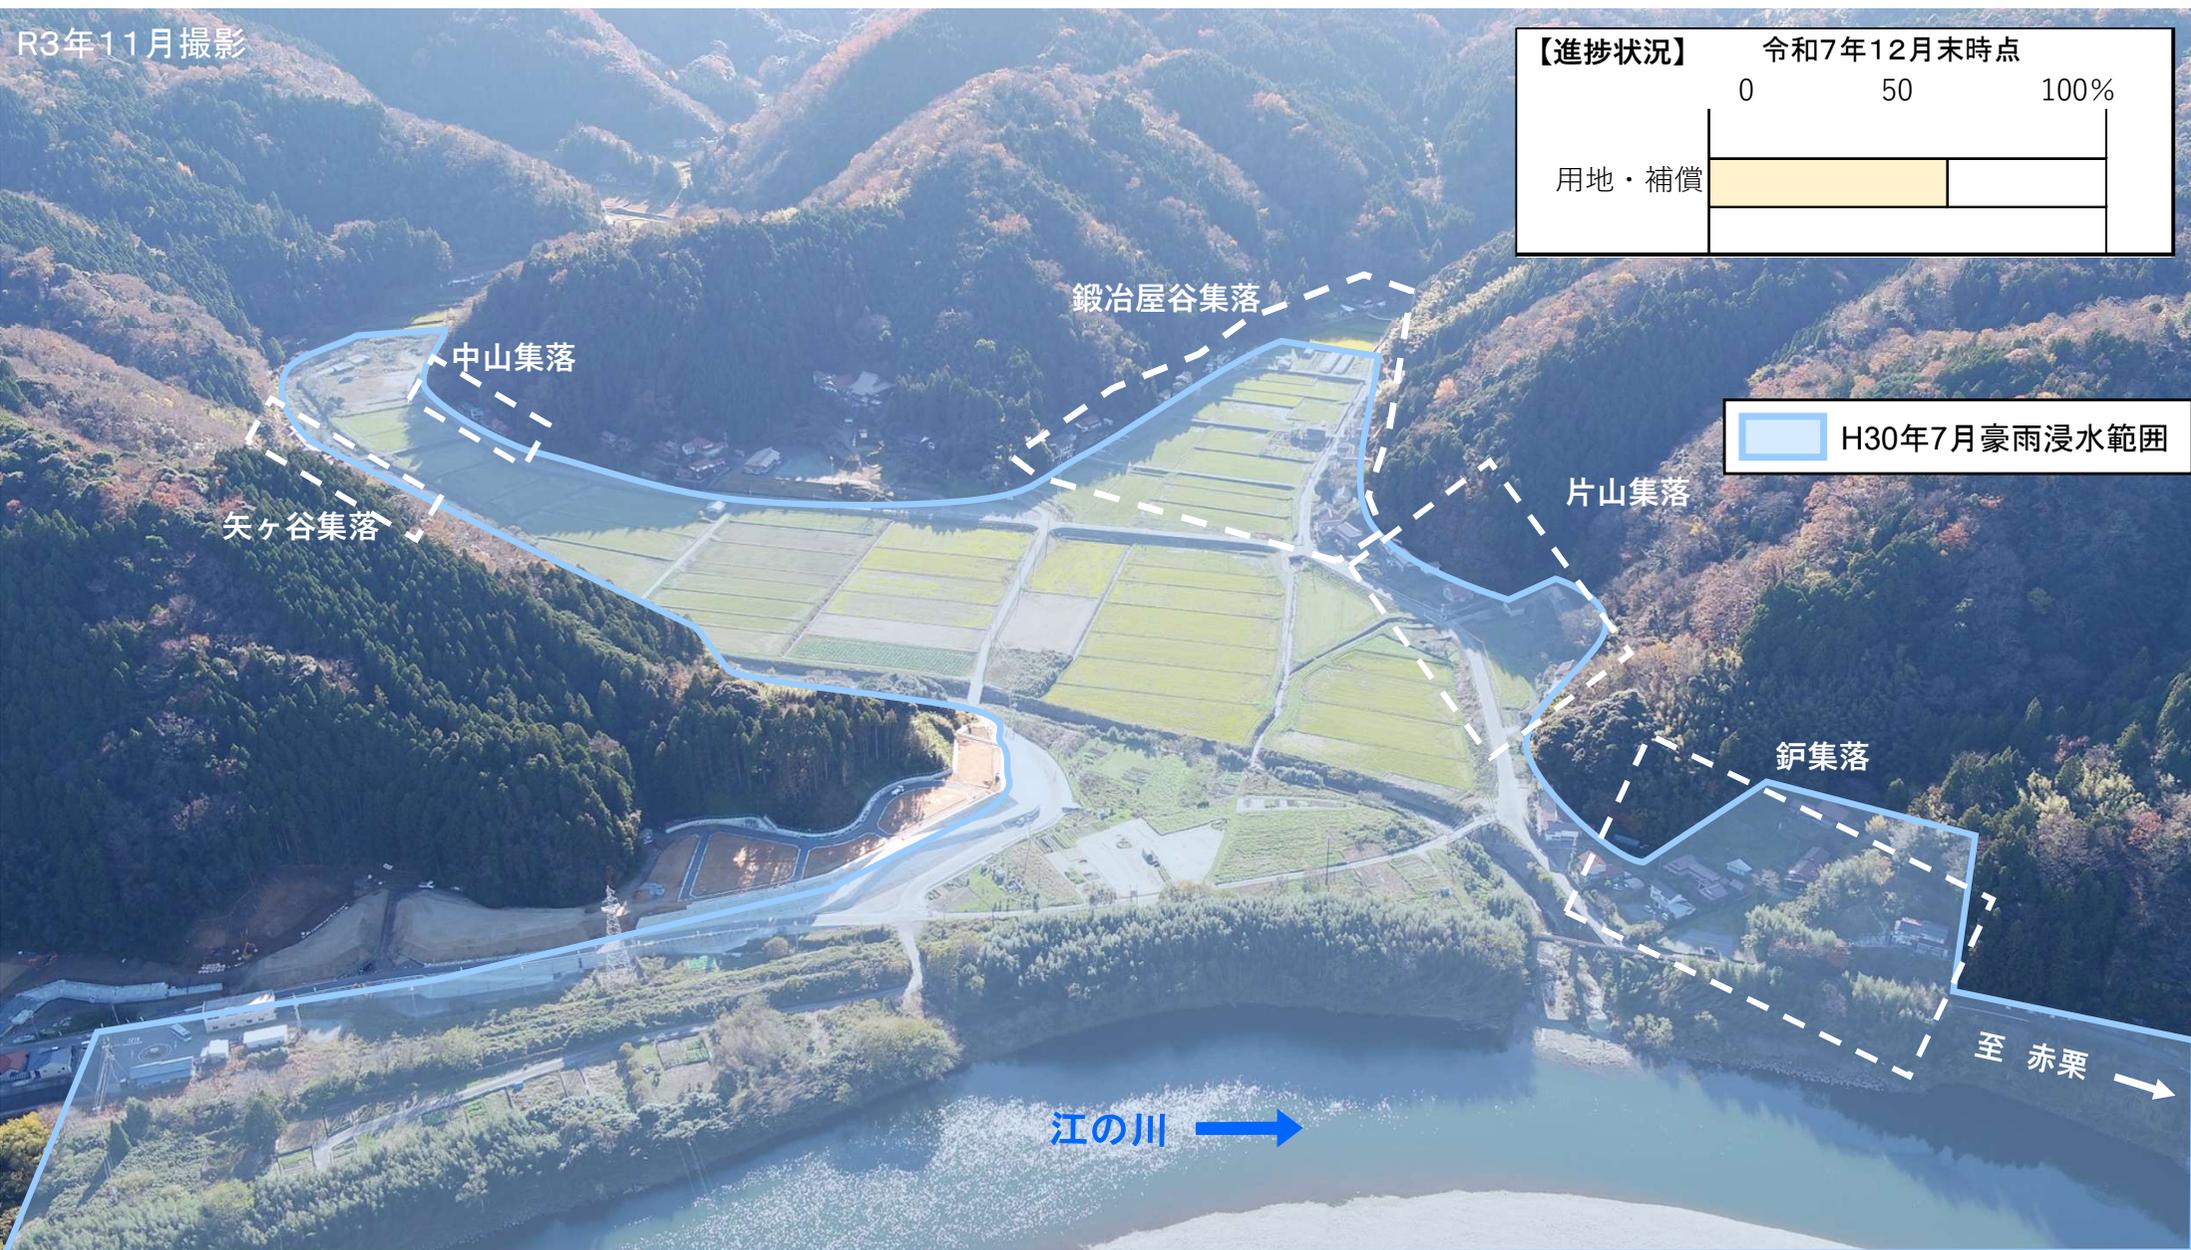


下大貫地区(久井谷・榎谷・元折)～水害に強い下大貫地区を創る治水事業～

- 元折地区は、令和7年度に家屋個別移転を実施済み。
- 堤防整備を行う久井谷・榎谷地区は、令和7年度から堤防の内水解析等を実施中。
- 榎谷地区については、令和8年度に埋蔵文化財の試掘調査を実施予定。

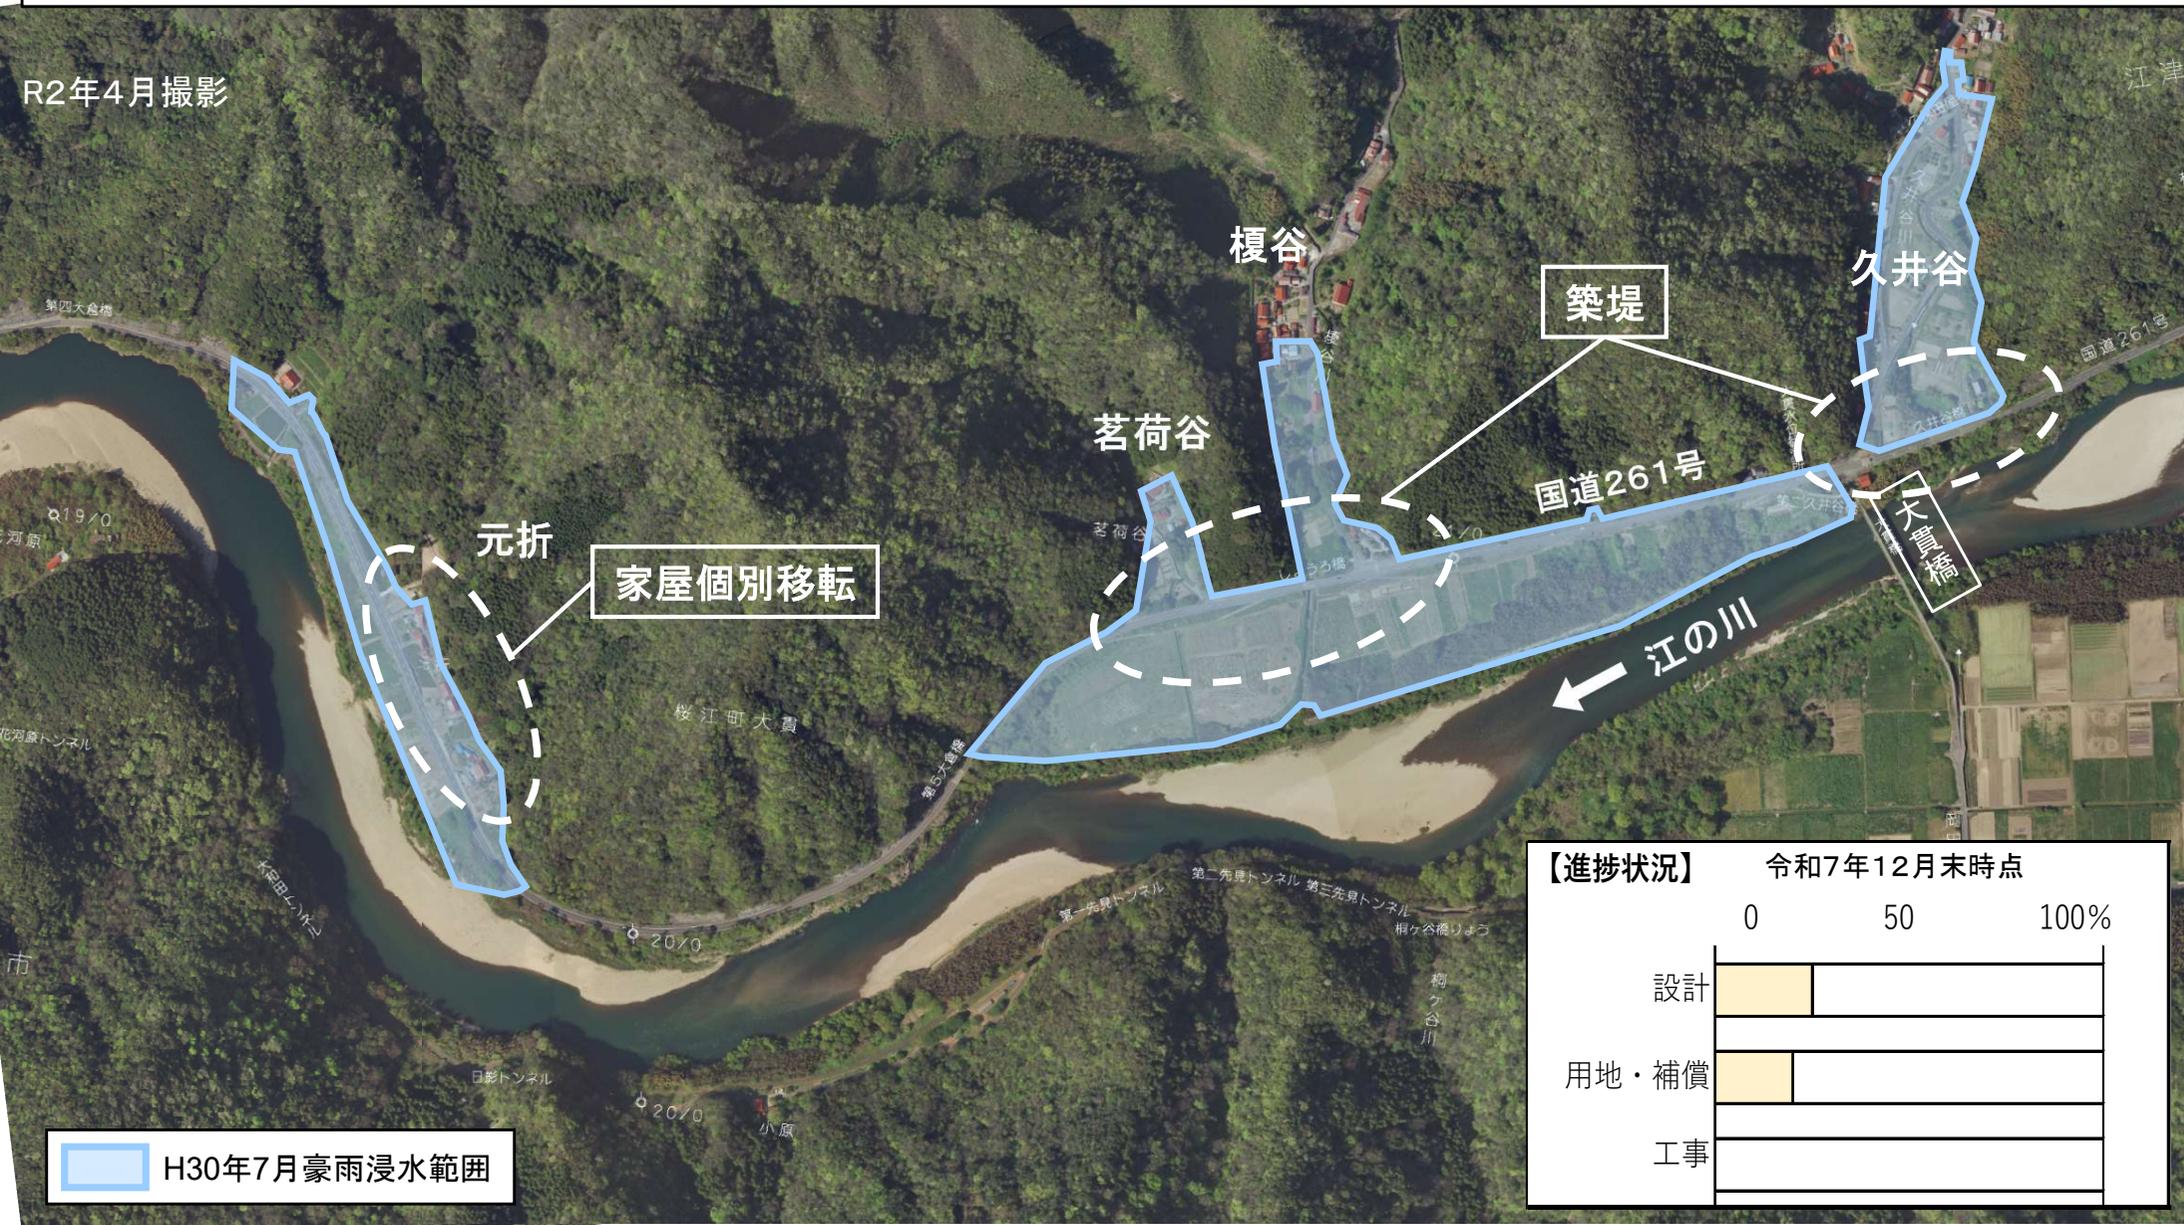


田津地区 ～水害に強い田津地区を創る治水事業～

- 令和7年度は、内水解析を実施中。また、用地調査を行い、上流側の用地買収を実施中。
- 工事用道路整備は令和6年度に着手し、約110m整備済。令和7年度においても引き続き実施中。

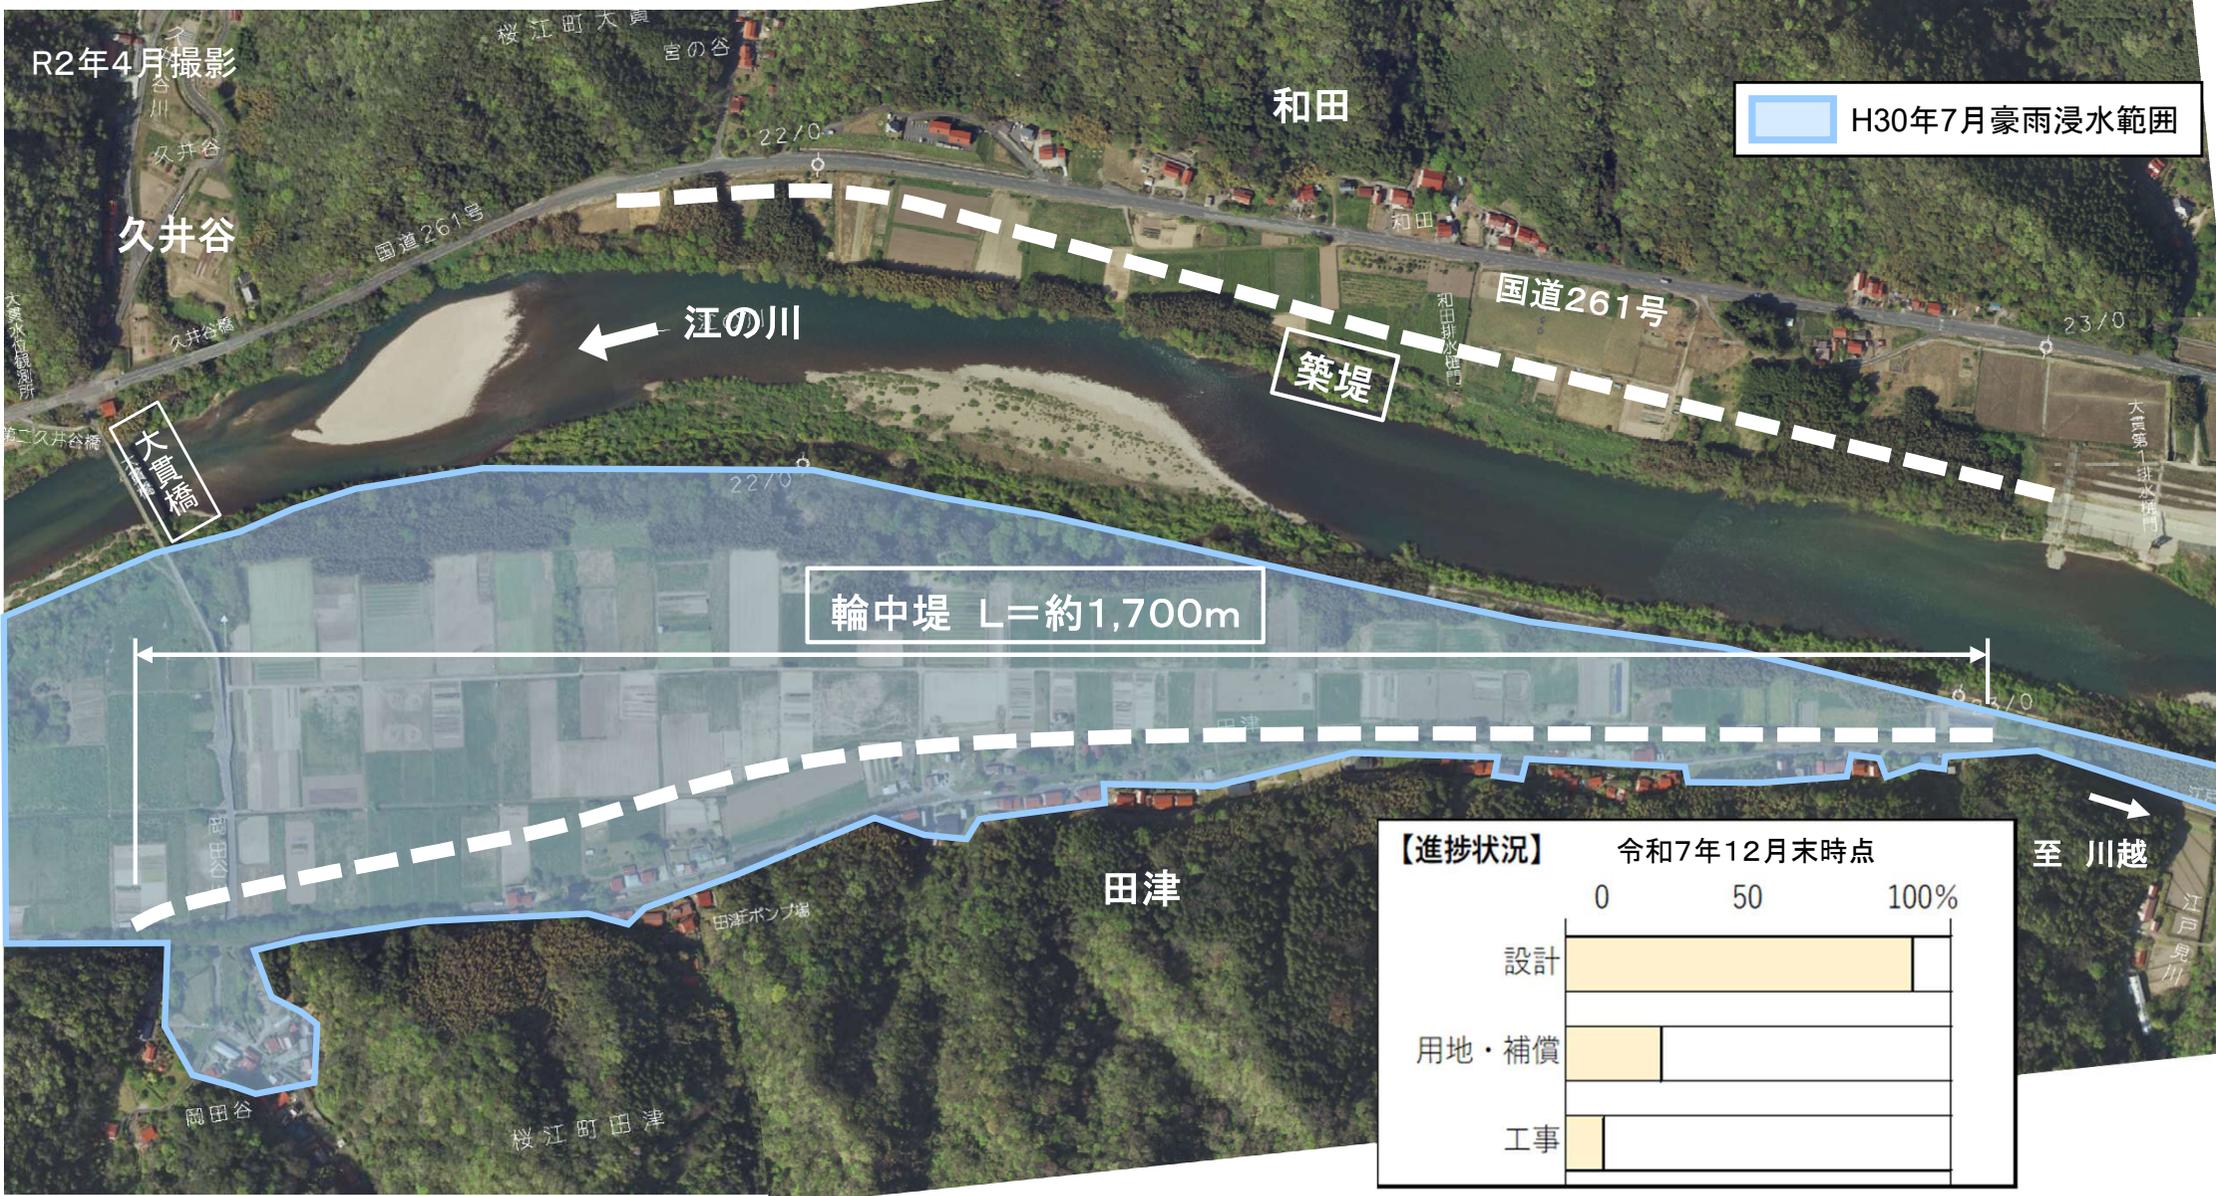


上大貫地区(大貫・和田)～水害に強い大貫・和田地区を創る治水事業～

- 平成8年に上流から工事着手し、約1,800mを整備済み。
- 令和7年度は、昨年度に引き続き約120mの区間を施工中。2基の樋門工事が令和7年6月に完了。

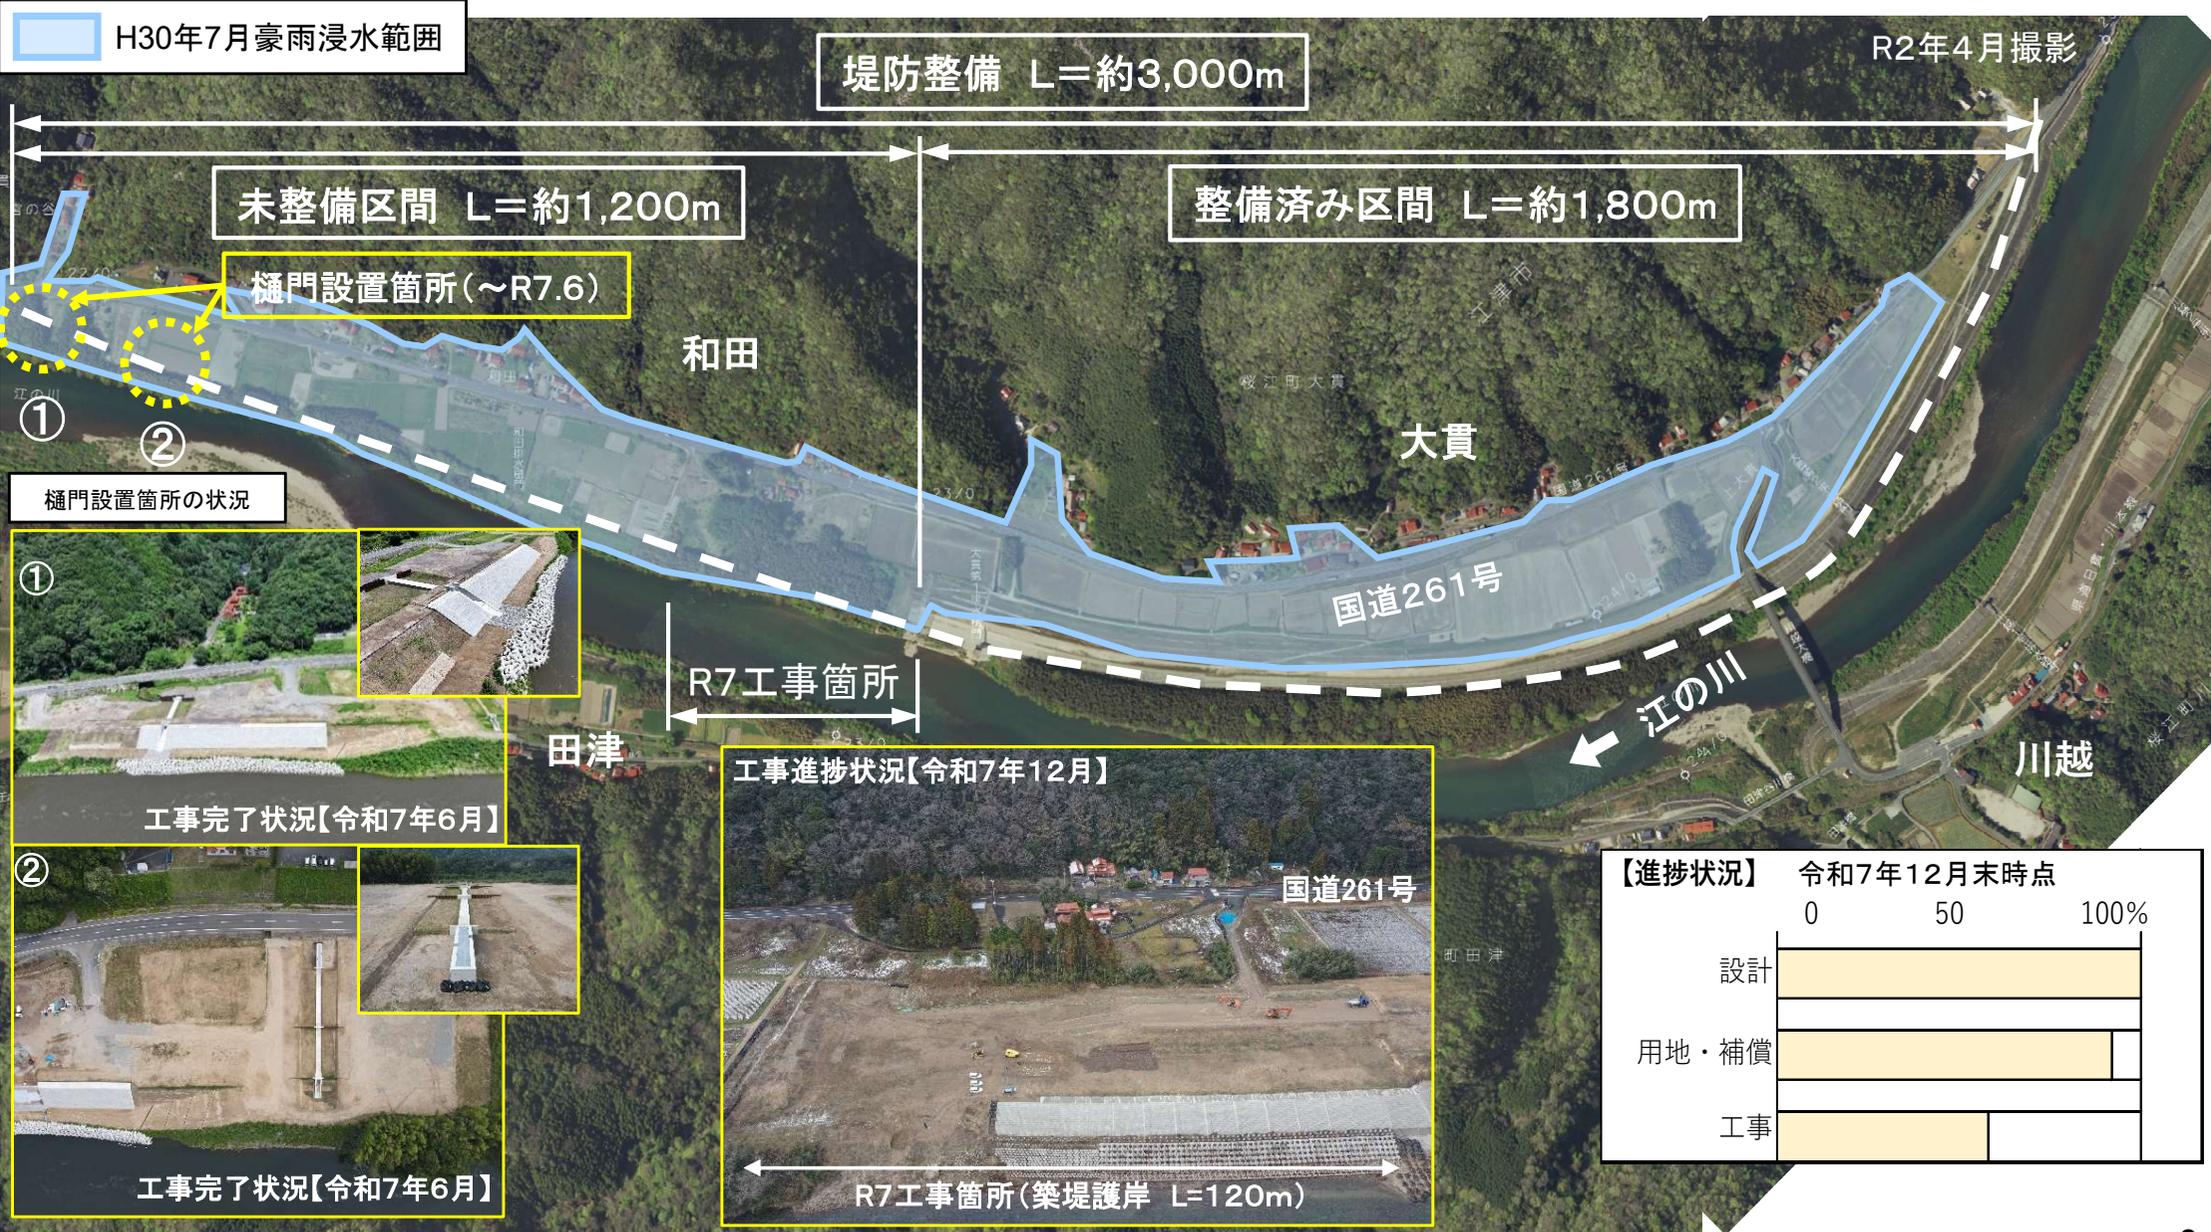

恵梨地区【家屋個別移転】

➤ 令和7年度に家屋個別移転を実施済み。

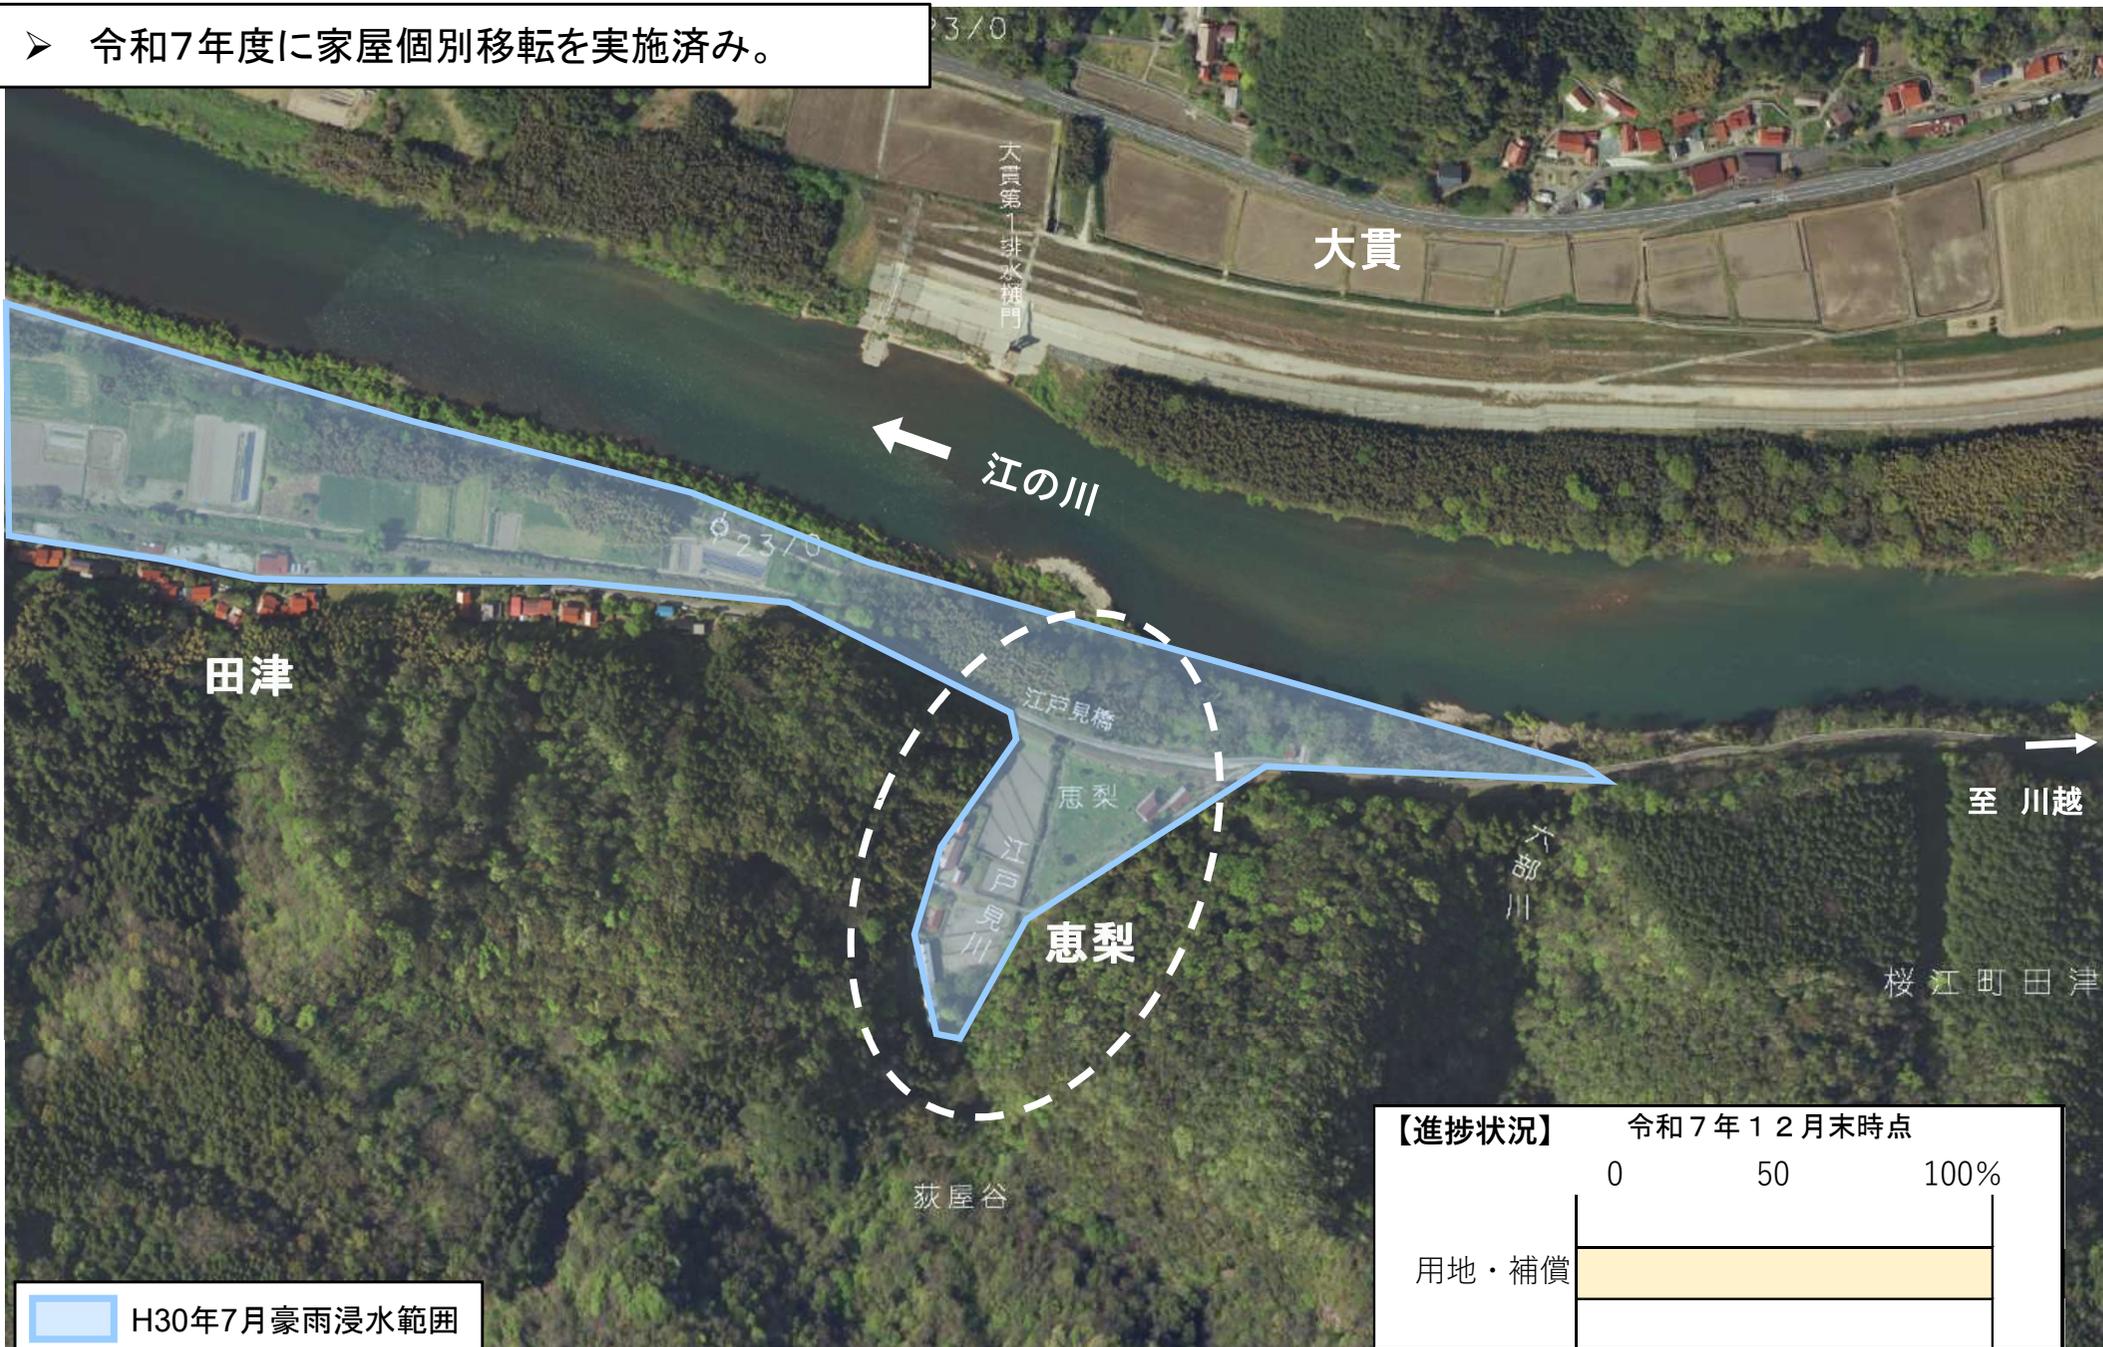


H30年7月豪雨浸水範囲

R2年4月撮影

川越地区 ～水害に強い川越地区を創る治水事業～

- 平成元年度に事業着手し、本川上流側の築堤は平成26年度に実施。
- 平成31年度に支川田津谷川の整備に着手。
- 令和6年度に一部護岸工事を実施。
- 令和7年度は、昨年度に引き続き用地買収、一部工事用道路整備を実施中。

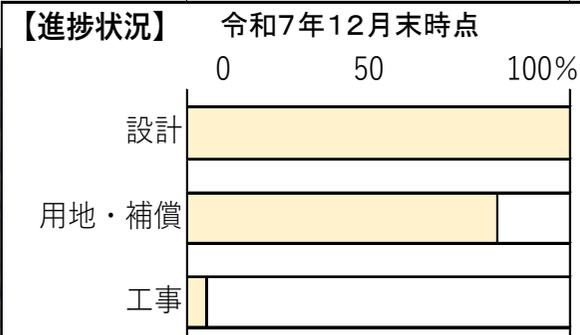

R2年4月撮影

川越

堤防整備
(H元年度～H26年度)

JR三江線

堤防整備
L=約600m

H30年7月豪雨浸水範囲

工事用道路整備箇所(R7～)

宅地の嵩上げ
(H5年度～H11年度)

田津谷川

至 田津

江の川

川越大橋
(H19.7竣工)


至 R261

大貫

瀬尻・久料谷地区 ～災害に強い瀬尻・久料谷地区を創るまちづくり事業～

- 令和5年度は国道261号迂回路施工を実施。
- 令和6年6月に用地買収完了。
- 令和7年度は、護岸工事を継続するとともに宅地嵩上げを実施中。

【完成イメージ図】

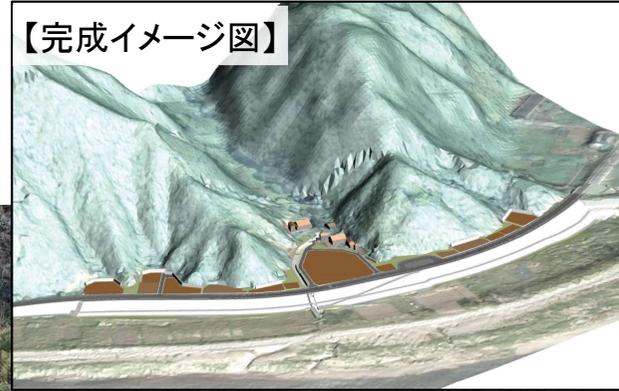


令和7年12月撮影

事業区間 L = 650m (国道261号嵩上げ・宅地嵩上げ)



【進捗状況】 令和7年12月末時点

	0	50	100%
設計	[Progress bar from 0 to 100%]		
用地・補償	[Progress bar from 0 to 100%]		
工事	[Progress bar from 0 to 50%]		

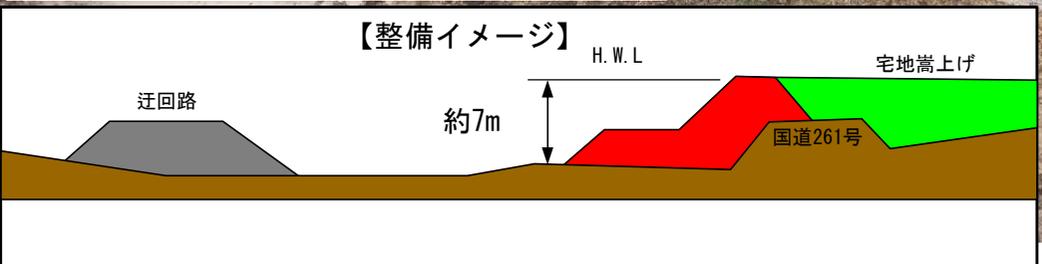

谷地区 ～災害に強い谷地区を創るまちづくり事業～


- 川本町の『まちづくり計画』を踏まえ、支川矢谷川上流まで、国・県で分担し事業を実施。
(矢谷川下流側:国施工、矢谷川上流側:県施工)
- 令和6年度より事業(用地買収)着手。
- 令和7年度は、橋梁架け替え設計、用地調査、用地買収を実施中。

R2年4月撮影

【進捗状況】	令和7年12月末時点		
	0	50	100%
設計	[Progress bar showing 100% completion]		
用地・補償	[Progress bar showing approximately 10% completion]		
工事	[Progress bar showing 0% completion]		

凡例

- 河川
- 護岸(ブロック積、ブロック張)
- 盛土
- 道路(県道、町道、管理用通路)
- 宅地
- 宅地外(空地)

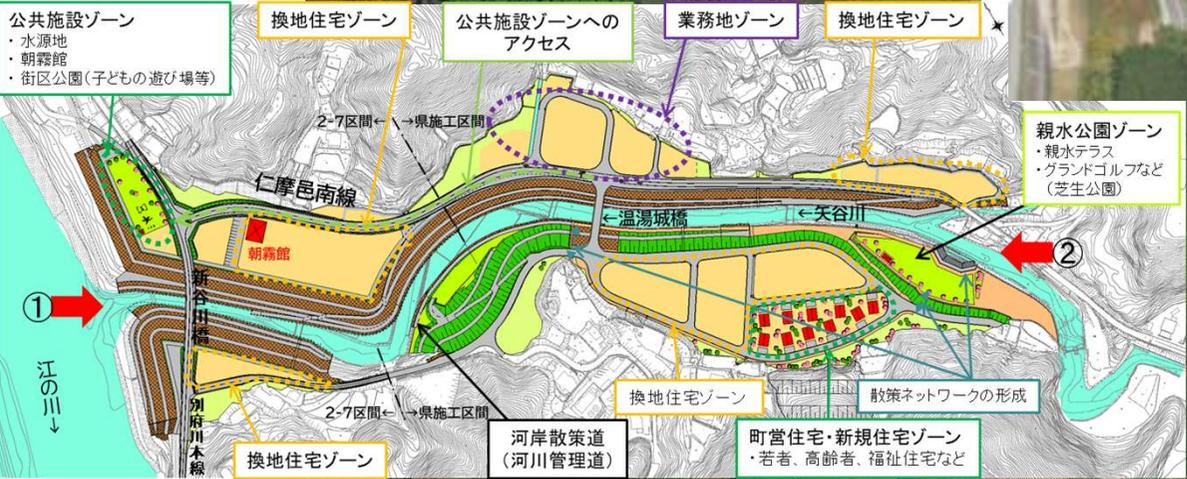

H30年7月豪雨浸水範囲

君谷湊地区【家屋個別移転・防災集団移転】

➤ 令和6年度末に家屋の移転が完了し、事業完了。

君谷湊	H30. 7豪雨	R2. 7豪雨	R3. 8出水
浸水面積	6. 2ha	6. 0ha	5. 5ha
浸水戸数	5戸	3戸	0戸
(床上)	(4戸)	(2戸)	(0戸)
(床下)	(1戸)	(1戸)	(0戸)



都賀西地区【築堤】

➤ 令和7年度は、継続して用地協議を実施中。

R2年4月撮影



【進捗状況】 令和7年12月末時点

	0	50	100%
設計	[Progress bar showing 100% completion]		
用地・補償	[Progress bar showing approximately 80% completion]		
工事	[Progress bar showing approximately 20% completion]		
