

清音古地箇所 3か年緊急対策進捗状況

【 目的 】

洪水を流下させるために必要な河道断面を確保します。


【 実施内容 】

河川内を掘削し、土砂を撤出します。

予定掘削土量 約 210,000 m³

【 整備イメージ 】

樹木伐採・河道掘削

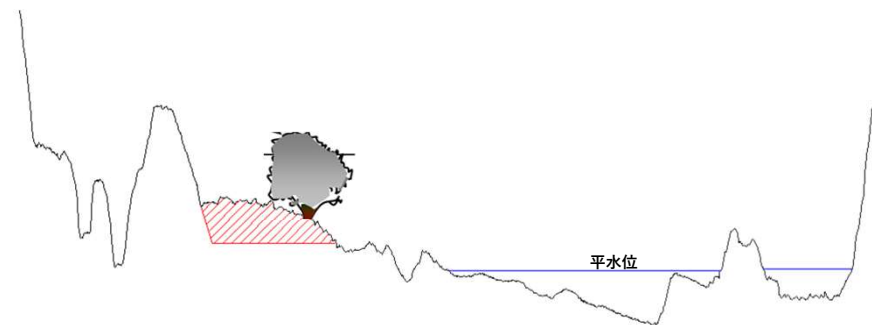

【 工事名 】 高梁川酒津河道整備外工事

対策前(令和元年6月)



整備状況(令和2年2月完成)



【 工 事 名 】 高梁川酒津河道整備外その3工事

対策前(令和元年2月)



整備状況(令和2年11月完成)

