

鳥越川1号砂防堰堤における土砂撤去完了状況（令和3年10月8日現在）

災害発生日：令和3年8月14日

崩壊状況：土石流捕捉量 約4,500m³

作業状況：8月17日から準備工（ポンプ設置）を開始。8月24日から土砂撤去作業に支障となる伐採等の場内仮設整備を実施。
9月4日から堰堤上流側に溜まった土砂等の撤去作業を開始。

10月4日土砂掘削作業完了（撤去土砂量 約4,300m³）。今後、堰堤下へ落とした土砂の搬出を行い全作業完了。

土石流発生前（H29. 3. 9撮影）



土石流発生直後（R3. 8. 15撮影）




土砂撤去完了（R3. 10. 8撮影）



土砂等撤去作業の状況（R3. 10. 8撮影）

【作業の流れ】

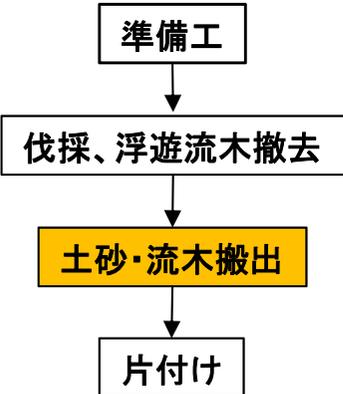

【堰堤上流側の掘削作業は完了】



【土砂の搬出状況】

大町5号砂防堰堤における土砂撤去状況（令和3年10月8日現在）

災害発生日：令和3年8月14日

崩壊状況：土石流捕捉量 約4,100m³

作業状況：9月6日から準備工としてクレーンヤードの設置に着手。


9月13日から土砂撤去作業を開始。（10月8日現在 約1,525m³撤去）

1日あたり約50～110m³の土砂を搬出中。

土石流発生直後 (R3. 8. 15撮影)



R3. 10. 8現在の状況

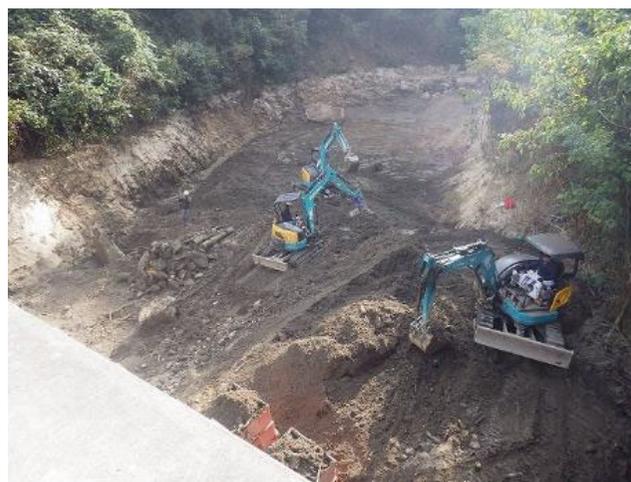

土砂撤去作業状況 (R3. 10. 8撮影)



【掘削状況(発生時から4m掘削)】



【土砂掘削状況】



【土砂積込状況】



【転石搬出状況】
