


3. 平成20年度のコスト縮減等の取り組み (志津見ダム)

■平成20年度事業予算の実施概要

H20事業費 47.5億円

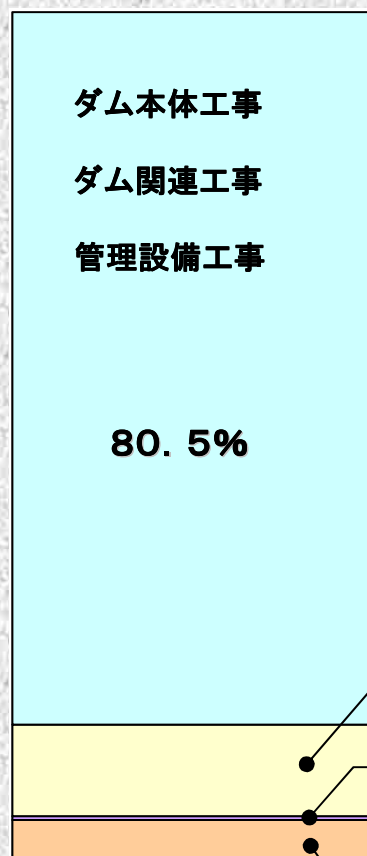

○ダム本体工事

コンクリート打設、基礎処理工、放流設備等)

○管理設備工事

管理庁舎、通信設備工事、放流警報設備工事、
ダム管理用機械設備工事等

○ダム関連工事

貯水池伐採等



○流量・水質観測等の継続的調査

○環境モニタリング調査

○ダム本体基礎処理評価

○各種検討・設計等

○電柱等の移転補償


○付替林道森脇線等の改良工事

伐採木材の有効活用

伐採木をチップ化し、法面のマルチング材として再利用することで処分費の縮減を図る。


当初計画(H13)

従来作業

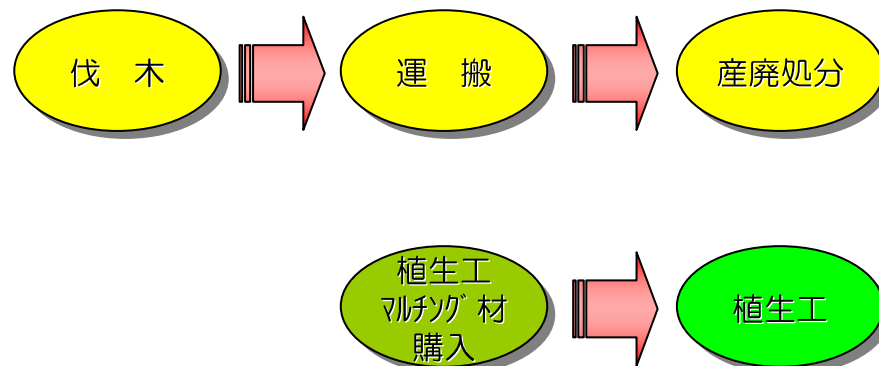

変更

伐採材の再利用

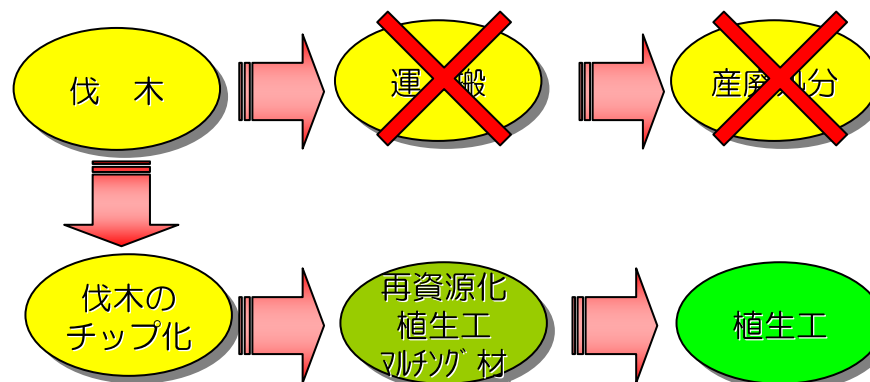

縮減額は現在精査中。次回委員会で報告します。



伐木材の粉碎状況



伐木材のチップ化



再生植生マルチング材使用状況
