

3. 踏切道の改良の取組状況の確認について

今立川踏切道(笠岡市富岡)

鉄道事業者	西日本旅客鉄道株式会社
鉄道路線名	山陽線
踏切道種別	第1種
道路管理者	笠岡市
市道名	市道青池小島屋線
改良工事完了予定	令和7年度末
改良後	自転車歩行者専用道路として利用



○今立川踏切道周辺工事の進捗状況

【①市道絵師26号線 新庄交差点改良 (右折レーン設置)】

・詳細設計の素案が完成。岡山県警と協議を行い、概ねこちらで考えている設計の通りで施工が可能な状況。来年度施工予定。

【②旧国道の安全対策】


・看板設置等を来年度施工予定。

【③踏切前後の安全対策】

・規制路線への防犯灯、防犯カメラの設置
・規制路線への防草コンクリートの設置
今年度中に施工予定。

「災害時の管理の方法を定めるべき踏切道」における
訓練の実施状況


R5 年度	令和6年1月17日 実施	R6 年度	令和7年2月 実施予定
----------	-----------------	----------	----------------

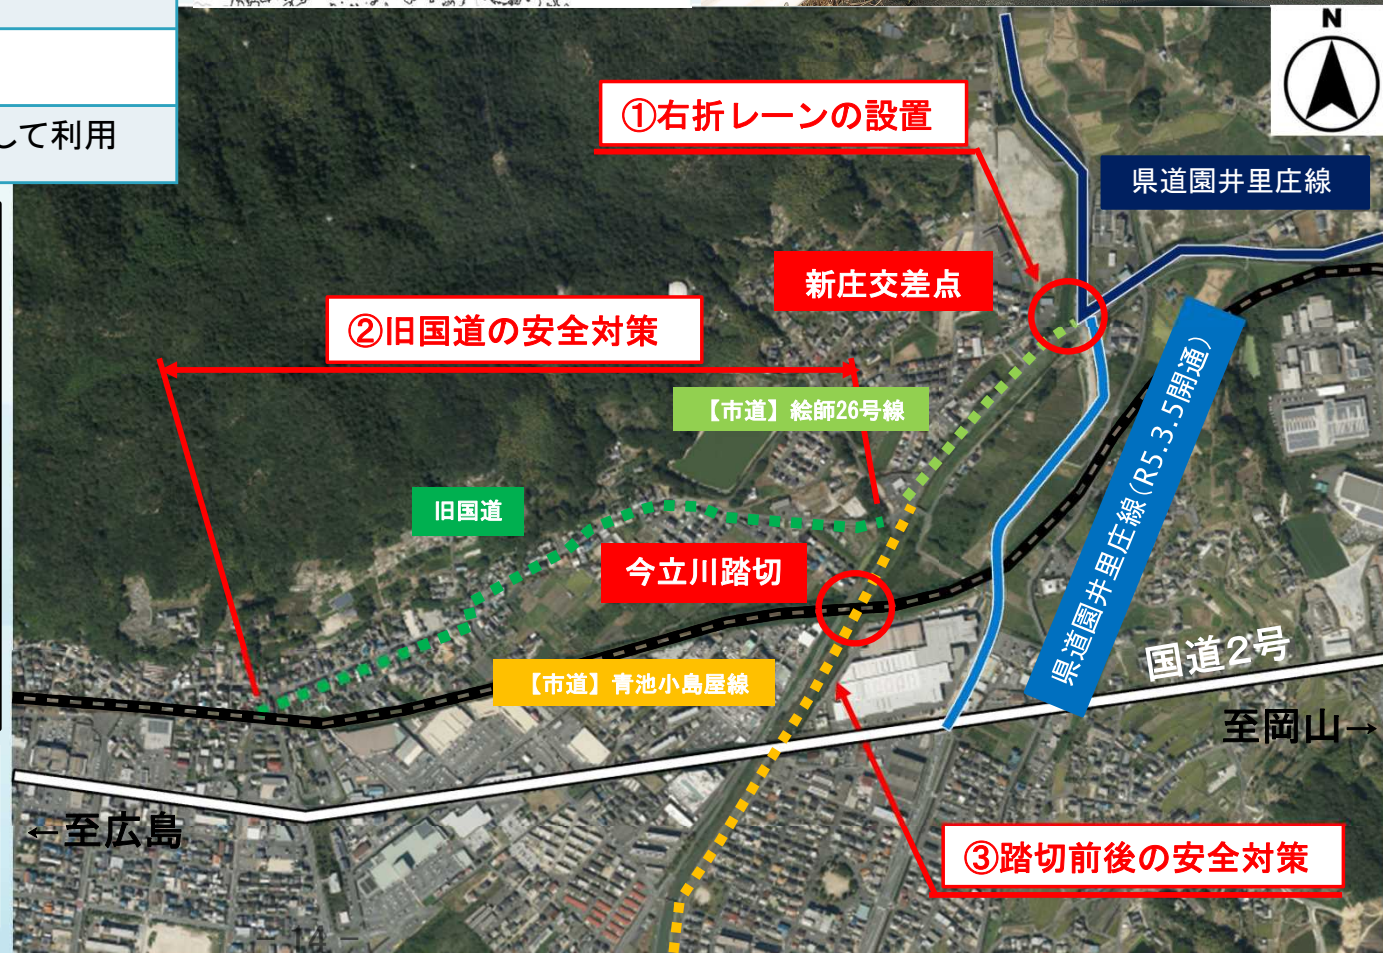

北方第一踏切 説明資料

鉄道交差部の円滑化に資する対策


- ・歩道新設（北方第一踏切）
- ・自由通路（岡山駅構内）
- ・駐輪場整備による東西口利用の適正化
- ・跨線橋の新設（岡山駅南側）

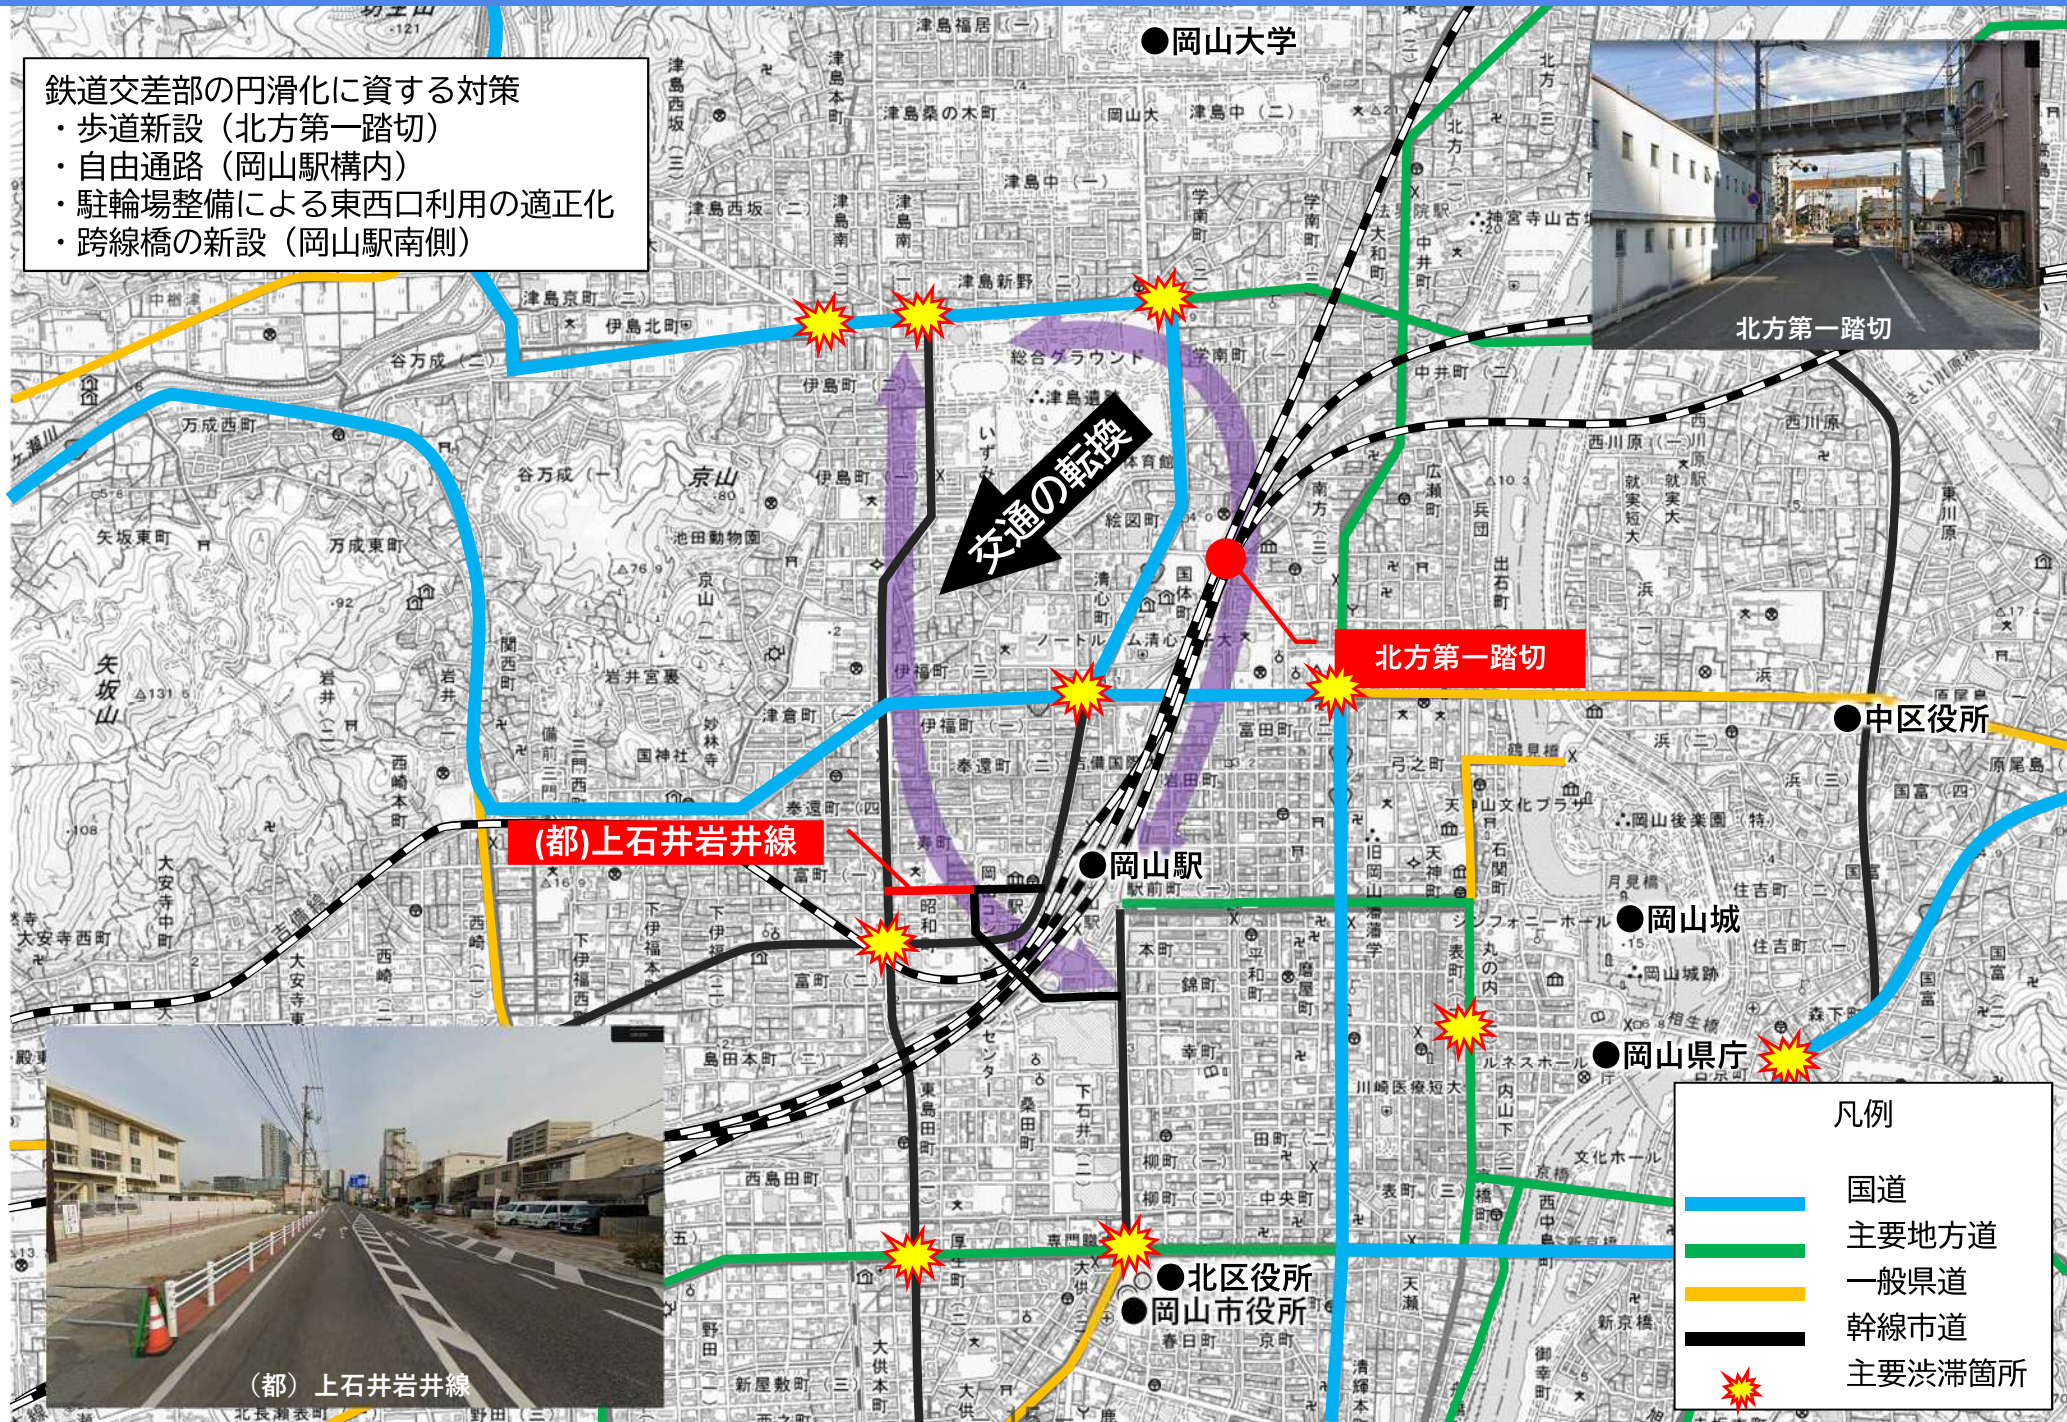

凡例	
	国道
	主要地方道
	一般県道
	幹線市道
	主要渋滞箇所

(都)上石井岩井線 概要


位置図

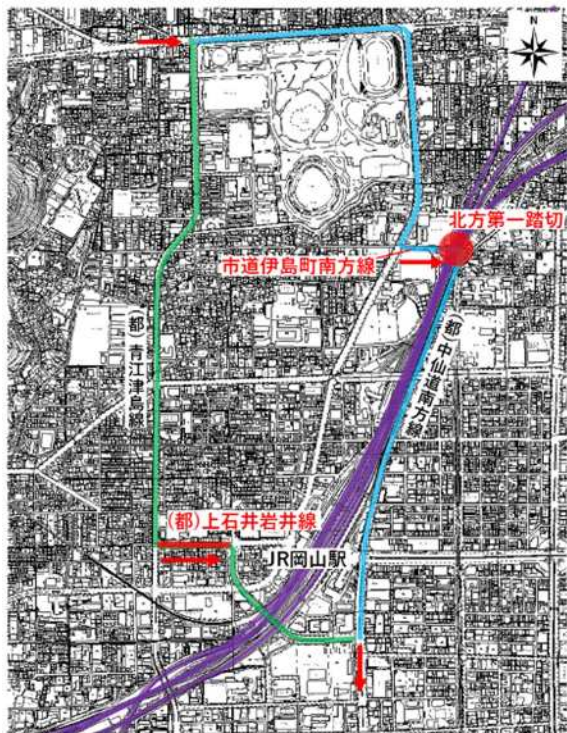

現況写真



標準断面図



(都)上石井岩井線 平面図

都市計画道路 上石井岩井線
 $L=210.0m$ $W=27.0m$

