

玉柏箇所 3か年緊急対策進捗状況

【 目的 】


洪水を流下させるために必要な河床掘削・樹木伐採を行います。

【 実施内容 】

河川内樹木を伐採、河床掘削を実施します。

予定樹木伐採面積	約 127,000 m ²
予定掘削土量	約 14,000 m ³

【 整備イメージ 】

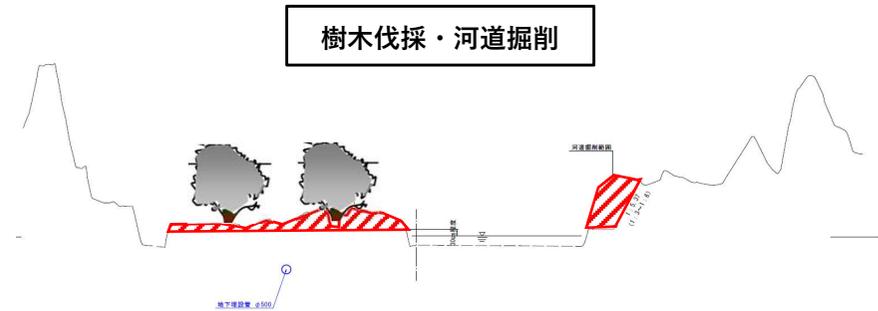

【 工事名 】 旭川玉柏河道整備外工事

対策前(令和元年9月)



整備状況(令和2年3月完成)

