

大町5号砂防堰堤における土砂撤去状況（令和3年10月25日現在）

災害発生日：令和3年8月14日

崩壊状況：土石流捕捉量 約4,100m³

作業状況：9月6日から準備工としてクレーンヤードの設置に着手。

9月13日から土砂撤去作業を開始。（10月25日現在 約2,445m³撤去）

1日あたり約50～110m³の土砂を搬出中。

土石流発生直後 (R3. 8. 15撮影)



R3. 10. 25現在の状況



土砂撤去作業状況 (R3. 10. 25撮影)




【掘削状況】



【掘削状況】



【土砂搬出状況】

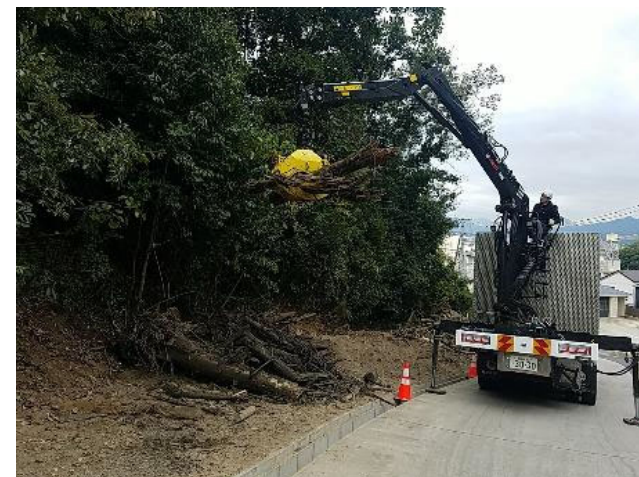

【流木搬出状況】
