踏切安全通行カルテ

中国－10

よみがな	ふるどてけんどう	道路名	県道出雲平田線
踏切道名	古土手県道	（道路管理者名）	島根県
		鉄道路線名	北松江線
所在地	出雲市平田町	（鉄道事業者名）	一畑電車㈱
地図 （広域及び狭域）	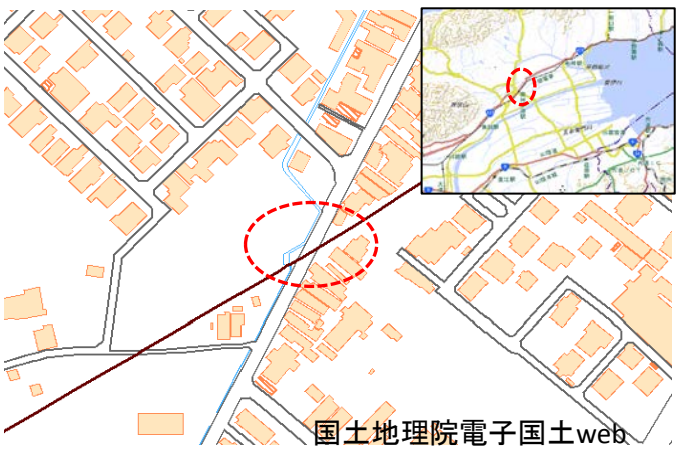	写真 （現況及び対策後）	

諸元・構造等

踏切種別	第1種	幅員(m)	歩道部（起点寄）	車道	歩道部（終点寄）	交通規制	交通規制なし
						（車両進入防護柵等）	
踏切長(m)	10.0	左道路	0.0	6.5	0.0	歩車道分離方法	なし
		踏切道	0.0	6.5	0.0	拡幅指針の該当：歩道のみ拡幅の場合	○
横断本数(本)	1	右道路	0.0	6.5	0.0	拡幅指針の該当：歩道+車道2車までの拡幅の場合	－
交差角(度)	33	迂回路（歩行者）	直近の迂回路	距離(m)		迂回路(自動車)	種類：両方共なし／距離(m)：－
			－	－			
道路線形 左道路	直線		直近のBF化迂回路	距離(m)	BF化状況	通学路指定状況	○
道路線形 右道路	直線		－	－	－		

緊急対策踏切の区分及び基準算定データ

開かずの踏切	－	ピーク時遮断時間(分)	－	通学路要対策踏切：○
自動車ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切	－	踏切自動車交通遮断量(台・時)	－	事故多発踏切：－
歩行者ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切	－	踏切歩行者等交通遮断量(人・時)	－	踏切自動車交通遮断量と踏切歩行者等交通遮断量の和：－

歩道狭隘踏切	－	前後道路の車道幅員(m)	前後歩道との幅員差(m) 起点寄(左)	終点寄(左)	自動車交通量（台/日）	歩行者交通量（人/日）
			起点寄(右)	終点寄(右)		
		左道路 6.5	0.0	0.0	4,988	51
		右道路 6.5	0.0	0.0		

踏切内の事故発生状況（過去5年）

事故別	件数	死者数	事故発生年：事故履歴	地域・利用者からの要望等
踏切事故	0	0	－	地域住民より歩道拡幅の要望がある。（通学路に指定されているが、歩道が狭小。H24年度に実施した通学路特別点検調査で危険個所として挙げられている。）
道路交通事故	0	0	－	

踏切保安設備設置状況

賢い踏切 設置の必要性	有無	設置年度	踏切支障報知装置（手動）	障害物検知装置	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ型警報装置	大型遮断装置	二段型遮断装置	法指定の状況	計画種別	構造の改良
									指定年	S57
無	－	－	○	－	－	－	－		対策状況（完了年）	S59

対策実施状況（H17年度以降）

当該踏切を除却する対策		H17年度以降に実施した全ての対策と今後実施予定の対策※）		
－	除却年度	－	完了年度	

今後の対策方針 対策推進上の課題

歩道踏切の詳細設計について、鉄道事業者である一畑電車㈱と協議を進める。

備考（協議状況等）

Ｈ２５．１２～Ｈ２６．９：中国運輸局、一畑電車㈱、島根県との協議　⇒　歩道踏切設置の方針決定
Ｈ２７．７～　：一畑電車㈱と島根県で歩道踏切の詳細設計に係る協議

※）平成28年度以降は、踏切周辺対策も記載。
