資料６－２

江の川直轄河川改修事業

河川改修事業の再評価項目調書

事業名（箇所名）	江の川直轄河川改修事業
実施箇所	江の川直轄管理区間　島根県（江津市、川本町、邑南町、美郷町） 広島県（三次市、安芸高田市）
該当基準	社会情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要性が生じた事業 （河川整備計画策定）
事業諸元	一般改修（堤防整備）、水防災対策（輪中堤整備、宅地嵩上げ）、河道掘削、樹木伐採、堤防質的整備 管理延長　江の川L=151.6km、馬洗川L=5.8km、西城川L=1.3km、神野瀬川L=5.5km
事業期間	江の川直轄河川改修事業　（整備期間30年）：平成28年度～平成57年度 当面想定している事業　（整備期間 6年）：平成28年度～平成33年度
総事業費（億円）	（整備期間 30年）　約664 （整備期間　6年）　約132
残事業費（億円）	（整備期間 30年）　約664 （整備期間　6年）　約132
目的・必要性	江の川流域は唯一陰陽を隔てる中国山地を貫流し、広島・島根の２県をまたぐ中国地方最大の河川であり、別名「中国太郎」と呼ばれている。 下流部には島根県の石央地域の中心都市である江津市、上流部には広島県の備北地域の中心都市である三次市が位置しており、既往最大の昭和47年7月洪水、昭和58年7月洪水、平成18年7月洪水、平成18年9月洪水等により、過去、幾多の甚大な被害が発生している。 江津市や三次市の都市機能の中枢性や人口・資産の集積状況を考慮した場合、堤防決壊による被害は深刻なものになることが予想される。このため、治水・利水・環境のバランスを考慮した江の川の計画的な治水対策を実施していく必要がある。 （洪水実績） ・昭和47年 7月洪水：家屋浸水戸数14,063戸、浸水面積10,278ha ・昭和58年 7月洪水：家屋浸水戸数 3,517戸、浸水面積 3,408ha ・平成18年 7月洪水：家屋浸水戸数　153戸、浸水面積　88ha ・平成18年 9月洪水：家屋浸水戸数　253戸、浸水面積　260ha （災害発生時の影響：浸水想定区域内） ○人　口：54,000 人 ○世 帯 数：20,710 世帯 ○重要な公共施設等：江津市桜江庁舎、川本町役場、江津邑智消防組合消防本部、川本消防署、三次市役所、三次警察署、安芸高田警察署、備北地区消防組合消防本部、ＪＲ山陰本線、ＪＲ三江線、ＪＲ芸備線、国道9号、261号線、54号、183号、375号、江津バイパス、江津港 ○災害弱者関連施設：三次地区医療センター、吉田総合病院（救急）
便益の主な根拠	年平均浸水軽減世帯数　250 世帯　（当面想定している事業　27 世帯） 年平均浸水軽減面積　104 ha　（当面想定している事業　19 ha）

事業全体の投資効率性

	B：総便益	（億円）	C:総費用	（億円）	B/C	B-C	EIRR	基準年度
全体の事業	総便益	1,580	総費用	412	3.8	1,168	14.7%	H27
当面想定している事業（整備期間６年）	総便益	272	総費用	118	2.3	153	10.3%	H27

事業の効果等	1/30確率の降雨を対象にした場合、事業を実施した箇所の浸水被害を軽減する。 浸水世帯数　2,466世帯　⇒　80世帯 浸水面積　1,339ha　⇒　327ha 被 害 額　1,533億円　⇒　68億円

社会情勢等の変化	＜地域状況＞ ・流域内人口・世帯ともに減少傾向であるが、高齢化率が上昇しており災害弱者の割合が高くなっている。また、山間狭隘部の河岸段丘に小集落が点在しており、洪水時には水位が急上昇、集落の孤立化が懸念される。 ・近年（平成18年7月洪水、平成18年9月洪水）においても洪水被害を受けており、治水事業の要望が強い。 ＜事業に関わる地域の人口、資産等の変化＞ 【主要自治体（島根県江津市）指標】 ○人　口　　：0.93倍（25,697人／27,774人）　〈H22年数値／H17年数値〉 内高齢者率：1.06倍（33.2%／31.2%）　〈H22年数値／H17年数値〉 ○世 帯 数　：0.96倍（10,320世帯／10,769世帯）　〈H22年数値／H17年数値〉 ○事 業 所　：0.93倍（1,332事業所／1,440事業所）　〈H24年数値／H21年数値〉 ○従 業 者　：0.87倍（9,474人／10,852人）　〈H24年数値／H21年数値〉 【主要自治体（広島県三次市）指標】 ○人　口　　：0.95倍（56,605人/59,314人）　〈H22年数値／H17年数値〉 内高齢者率：1.05倍（31.4%/29.9%）　〈H22年数値／H17年数値〉 ○世 帯 数　：0.99倍（21,786世帯/21,968世帯）　〈H22年数値／H17年数値〉 ○事 業 所　：0.91倍（3,092事業所/3,412事業所）　〈H24年数値／H21年数値〉 ○従 業 者　：0.88倍（24,938人/28,477人）　〈H24年数値／H21年数値〉 ※H24年の事業所数、従業者数の調査は全産業分類調査されていないため、調査されていない産業分類の公務はH21年の調査結果を用いた。
事業の進捗状況	・八神箇所、川平箇所、大貫箇所、川越箇所、都賀西箇所、門田箇所は現在事業中であり、早期完成への要望は強い。
事業の進捗の見込み	・本事業は地域住民からも要望があることから、円滑な事業進捗が見込まれる。 ・八神箇所、川平箇所、大貫箇所、川越箇所、都賀西箇所、門田箇所については着手しており、順調に進捗している。
コスト縮減や代替案立案等の可能性	【コスト縮減や代替案立案等の可能性】 ・新技術・新工法を活用するとともに、河道掘削等により発生した土砂を築堤盛土に有効活用し、コスト縮減に努める。
対 応 方 針(原案)	継続
対 応 方 針 理 由	・江の川流域の治水安全度向上のため事業継続が妥当 ・昭和47年（戦後最大）の洪水から守るためには、早期の完成が必要。 ・今後の詳細な設計段階において、さらなるコスト縮減を図るとともに、環境にも配慮して事業を進め、より一層の事業効果の発現に努める。
そ の 他	－

江の川直轄河川改修事業

平成28年8月23日

国土交通省 中国地方整備局

今回の事業評価説明の進め方（平成28年度第1回事業評価監視委員会）

国土交通省

① 河川整備基本方針と河川整備計画、河川整備計画と事業評価、
江の川水系河川整備計画の策定作業について

② 流域の概要、江の川水系河川整備基本方針の概要、事業の目的・必要性

③ 河川整備計画の実施内容、コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

④ 事業の費用対効果分析

江の川直轄河川改修事業

⑤ 江の川直轄河川改修事業（全体事業）【 H28 ～ H57 】
・便益の算出方法、費用便益比（Ｂ／Ｃ）算出、事業効果

⑥ 江の川直轄河川改修事業（当面６年間）【 H28 ～ H33 】
・便益の算出方法、費用便益比（Ｂ／Ｃ）算出、事業効果

⑦ 貨幣換算が困難な効果等による評価

河川整備基本方針と河川整備計画

国土交通省

	河川整備基本方針（長期的な基本方針）	河川整備計画（20～30年の具体的・段階的な計画）
内容	1．河川の総合的な保全と利用に関する基本方針 2．河川の整備の基本となる事項 ・基本高水並びにその河道及び洪水調節施設への配分に関する事項 ・主要な地点の計画高水流量に関する事項 ・主要な地点の計画高水位、計画横断形に係る川幅に関する事項 ・主要な地点の流水の正常な機能を維持するために必要な流量に関する事項	1．河川整備の目標に関する事項 2．河川の整備の実施に関する事項 ・河川工事の目的、種類及び実施の場所、設置される河川管理施設の機能の概要 ・維持の目的、種類及び実施の場所
手続等	河川整備基本方針(案)の作成 ↓ 河川整備基本方針の作成・公表 ←意見 社会資本整備審議会（一級水系） 都道府県河川審議会※（二級水系） ※都道府県河川審議会がある場合 国土交通大臣　が策定	原　案 ↓ 河川整備計画(案)の決定 ↓ 河川整備計画の決定・公表 ←学識経験者の意見聴取 ←公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置 ←地方公共団体の長の意見聴取 地方整備局長等　または　都道府県知事　が策定
	水系毎に策定	一連の河川整備の効果が発現する単位 ・一級河川の指定区間外は、水系毎 ・一級河川の指定区間は、水系毎又は本川及び一次支川の流域毎 ・二級河川は概ね水系毎

河川整備計画と事業評価

国土交通省

国土交通省所管公共事業の再評価実施要領

第４　再評価の実施及び結果等の公表及び関係資料の保存

１　再評価の実施手続

(4)　河川事業、ダム事業については、河川法に基づき、学識経験者等から構成される委員会等での審議を経て、河川整備計画の策定・変更を行った場合には、再評価の手続きが行われたものとして位置付けるものとする。

第５　再評価の手法

４　対応方針又は対応方針（案）決定の考え方

④河川事業、ダム事業については、河川整備計画の策定・変更にあたり、学識経験者等から構成される委員会が設置され、審議中である場合には、その審議状況を踏まえて、当面の事業の対応方針について判断するものとする。

河川及びダム事業の再評価実施要領細目

第６　事業評価監視委員会

実施要領第４の１（４）又は第６の６の規定に基づいて審議が行われた場合には、その結果を事業評価監視委員会に報告するものとする。

江の川水系河川整備計画の策定作業

国土交通省

■江の川水系河川整備計画原案に対し住民から約136件の意見を聴取。（住民説明会、事務所HP、縦覧により聴取。）
■学識経験者による懇談会「江の川河川整備懇談会」を設置し、専門分野に関する意見を伺った上で江の川水系河川整備計画（案）を決定。
■その後関係機関及び地方公共団体の長に意見を伺った上で平成28年2月24日に江の川水系河川整備計画を策定・公表。

策定フロー

江の川のこれからを考える会（住民説明会）の開催（3市3町で延べ15回開催）

事務所HP、縦覧

江の川河川整備懇談会の開催

江の川水系河川整備計画原案に対する意見
意見数：約136件

江の川水系河川整備計画原案

学識経験者の意見聴取

公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置

江の川水系河川整備計画(案)の決定

地方公共団体の長の意見聴取

江の川水系河川整備計画の策定・公表
（H28年2月24日）

学識経験者による懇談会「江の川河川整備懇談会」

「江の川河川整備懇談会」で得られた主な意見

■江の川水系河川整備計画（原案）について
・島根県側中下流域の治水が遅れているため、重点的に取り組む必要がある。
・気候変動の適応策について、ソフト対策でできる部分については積極的に取り組んで頂きたい。
・長寿命化について、何を管理し、何で評価するのかを明確にするべき。

■江の川水系河川整備計画（案）における費用便益分析について
・治水に対するB/Cの結果は了解した。

江の川河川整備懇談会　委員名簿　（平成27年10月時点）

氏　名	職　名	専門分野
岩本 浩史（いわもと ひろし）	島根県立大学総合政策学部准教授	法律
裏戸 勉（うらと つとむ）	松江工業高等専門学校名誉教授	河川
河原 能久（かわはら よしひさ）	広島大学大学院工学研究科教授	河川
関 太郎（せき たろう）	広島大学名誉教授	環境（植物）
中林 光生（なかばやし みつお）	広島女学院大学名誉教授	環境（鳥類）
中村 幹雄（なかむら みきお）	元島根県内水面水産試験場長	環境（魚類）関係漁業
長束 勇（なつか いさむ）	島根大学生物資源科学部教授	関係水利
林 秀司（はやし しゅうじ）	島根県立大学総合政策学部教授	地域計画
藤原 眞砂（ふじわら まさご）	島根県立大学総合政策学部教授	経済・事業評価
村上 勇（むらかみ いさむ）	島根県文化財保護審議委員（奥田元宋・小由女美術館館長）	文化財
村上 恭祥（むらかみ やすよし）	元広島県水産試験場長	環境（魚類）関係漁業
山崎 禅雄（やまさき ぜんゆう）	日笠寺住職（元桜江町教育委員長）	民俗学・地理

（敬称略　五十音順）

江の川流域の概要

国土交通省

■唯一陰陽を隔てる中国山地を貫流し、広島・島根の２県をまたぐ中国地方最大の河川、別名「中国太郎」と呼ばれる。
■河口の狭小な沖積平野（江津市街地：人口2.4万人）と上流盆地（三次市街地：人口5.4万人）に人口資産が集中し、その間の中下流の山間狭窄部は河岸段丘に小集落が点在する。
■三次盆地で同規模の3本の川が合流した後の中流部は、山間狭窄部となり洪水時には水位が急上昇する。

流域の概要

流域及び氾濫域の諸元
流域面積（集水面積）：3,900km²
幹川流路延長　　：194km
想定氾濫域内人口　：約5万人

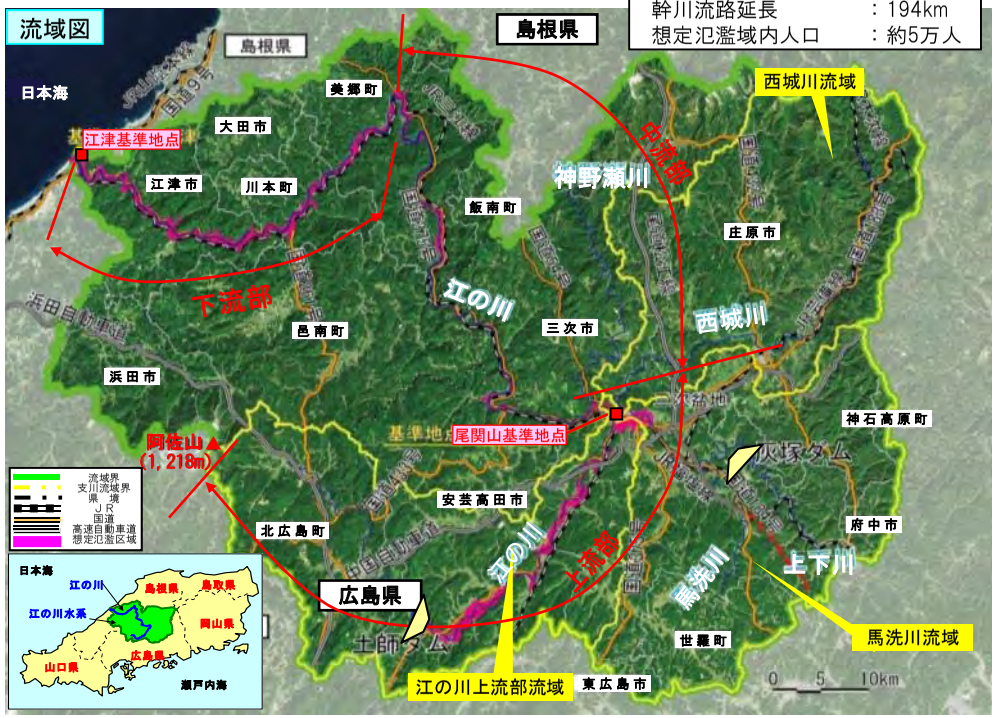

地形特性

・江の川・馬洗川・西城川の三川が合流し、三次盆地を形成している。
・中下流の山間部は狭窄部となっており洪水時に水位が急上昇する。





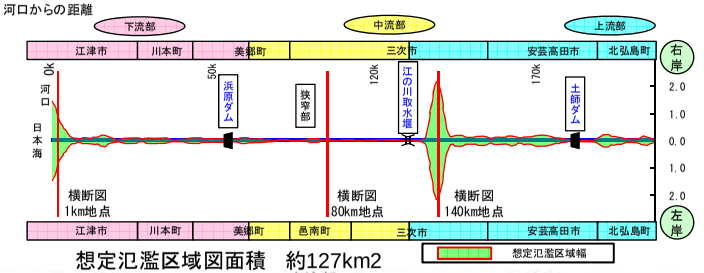

想定氾濫区域図面積　約127km2



土地利用

・流域の土地利用は約92%が山地、約7%が田畑等で 宅地等は1%未満
・人口資産は河口部の江津市と上流三次盆地の三次市周辺に集積



江の川流域の土地利用割合(H8)
出典：広島県「市町村税の概要」
島根県「土地に関する概要調査報告書」

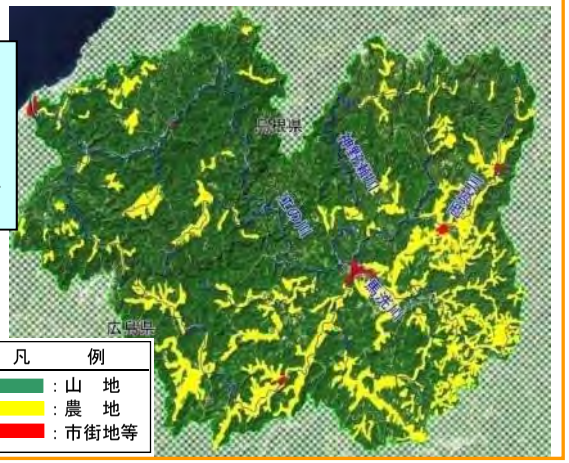

江の川水系河川整備基本方針の概要（平成19年11月策定）

国土交通省

災害の発生の防止又は軽減

■工事実施基本計画策定後に計画を変更するような洪水は発生しておらず、流量データによる確率からの検討、既往洪水からの検証等を総合的に判断し、基本方針においても既定計画と同様に基本高水のピーク流量を基準地点江津で14,500m³/s、尾関山で10,200m³/sと設定

流量配分図

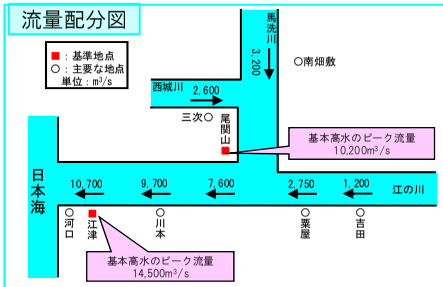

◎昭和47年 7月洪水により、全川で家屋浸水約14000戸の被害が発生。特に三次市をはじめとした上流部は甚大な被害を受けたため、中下流部と比較して改修が進捗している。そのため、上流有堤区間の整備の進捗を踏まえつつ、上下流のバランスを考慮した河川整備を実施

○上流部においては、河道掘削や河道内樹木群の計画的な伐開等により流下能力を確保

○中下流部の山間狭窄部においては、住民との合意形成を図るとともに、関係機関と連携・調整を図りつつ、適切な役割分担のもと、輪中堤や宅地の嵩上げ等により効率的に洪水被害の軽減を図る

○河道の対応で不足する流量については、既設ダム及び新たな洪水調節施設で対応

○水害防備林は、モニタリング調査により下流に対する洪水の伝播の抑制や河岸の流速の低減等の機能を評価し、縦断方向の連続性を確保しながら保全する

土地利用一体型水防災事業



土地利用一体型水防災事業のイメージ

既設ダム

土師ダム
（S49.3完成）

灰塚ダム
（H19.3完成）

水害防備林

河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持

■広域的かつ合理的な水利用の促進を図るなど、今後とも関係機関と連携して必要な流量の確保に努める

■尾関山地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量は、概ね16m³/sとし、以て流水の適正な管理、円滑な水利使用、河川環境の保全等に資するものとする

正常流量の基準地点

基準地点は、以下の点を勘案し**尾関山地点**とする

①支川馬洗川、西城川合流後の流況を代表でき、流量の管理・監視が行いやすい地点

②昭和32年から流量観測が行われており、流量資料の蓄積がある

③上流の比較的規模の大きな農業用水等取水後の代表地点である

動植物の生息地・生育地の状況

【馬洗川合流直下】：必要流量16.1m³/s

・魚類(サクラマス)の移動に必要な流量

河川環境の整備と保全

■オオサンショウウオが生息する水域環境や、オヤニラミが生息する水際植生、キシツツジやツメレンゲが生育する崖地や岩場、イシドジョウが生息する砂礫底の淵などの良好な河川環境を保全するなど、改修に当たっては、環境への配慮に努める

■サケ、サクラマスやアユ等の回遊性魚類の遡上・産卵環境の保全・改善や、水際と緑の連続性等を確保することにより、動植物の生息・生育・繁殖環境の保全に努める

■鵜飼いやカヌーなどの水面を利用した活動や河川敷を利用したイベントやレクリエーション活動等、水辺空間とのふれあいを体験できる施策を関係機関や住民等と連携して推進することにより人と川との関係の再構築に努める

流域内に多く生息するオオサンショウウオ

江の川カヌー公園さくぎ

支川濁川の断魚渓(左)とサケ産卵場(下)

三次市無形文化財の鵜飼

事業の目的・必要性（江の川の特徴）

国土交通省

■江津市街地や三次市街地の大部分は、地盤高が江の川の洪水時の河川水位より低く、人口・資産等が集中しているため、氾濫時には甚大な被害が発生するとともに、消防等や行政機関などの防災拠点に影響が及ぶ
■三川合流点下流から続く中流部の山間狭隘部は、氾濫源が高い堤防で囲まれるとともに、洪水時には水位が急上昇
■国管理は、上流三次市、下流江津市からはじまり、昭和47年7月洪水を契機に中流部を延伸、S53に県境区間を編入し、河口から土師ダムまでの一連がつながり一元管理となる

江津市街地

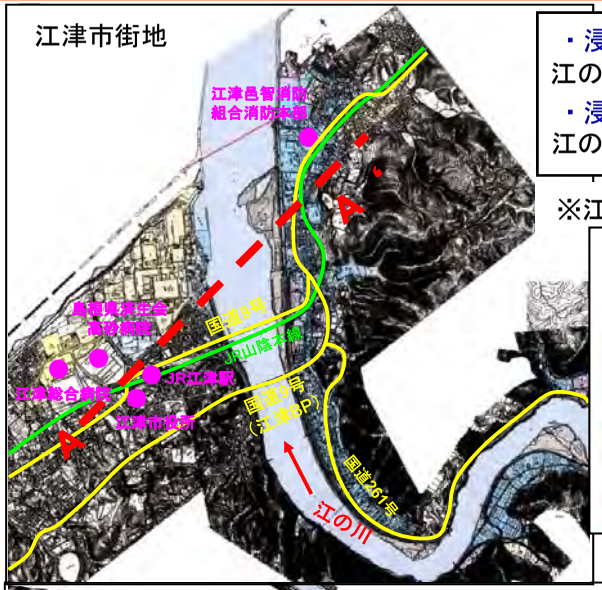

・浸水面積
江の川水系全体：4,800ha
・浸水人口
江の川水系全体：54,000人

※江の川浸水想定区域図

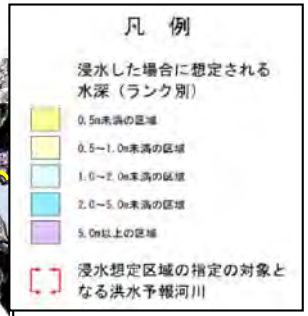

重要な公共施設等
・行政機関
桜江庁舎、川本町役場、
江津邑智消防組合消防本部、川本消防署
三次市役所、三次警察署、安芸高田警察署
備北地区消防組合消防本部
・医療・福祉施設
三次地区医療センター、吉田総合病院（救急）
・交通網
ＪＲ山陰本線、ＪＲ三江線、ＪＲ芸備線
国道9号、261号、 54号、183号、375号
江津バイパス、江津港

国管理区間の変遷

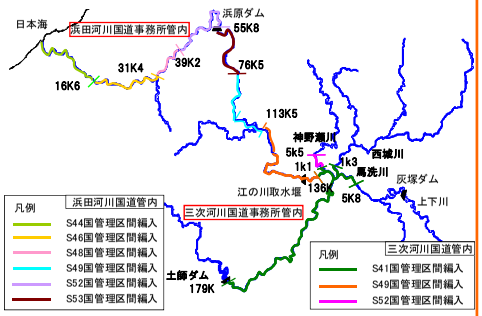

三次市街地

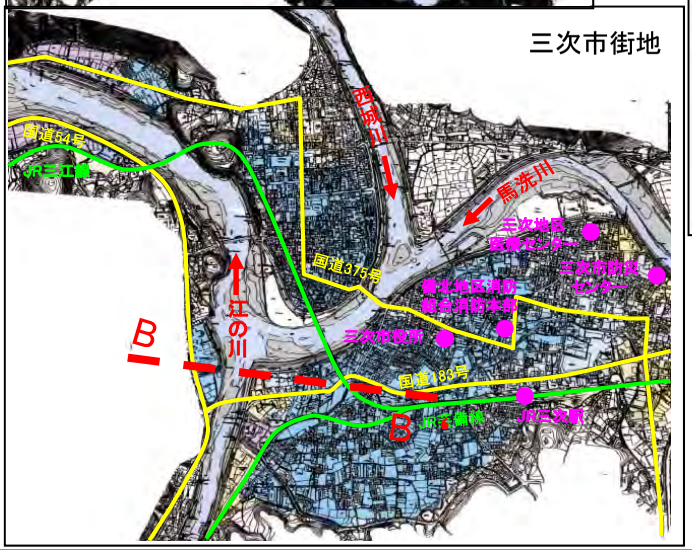

A－A'断面

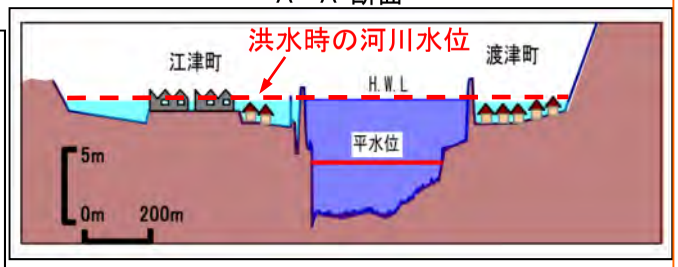

B－B'断面

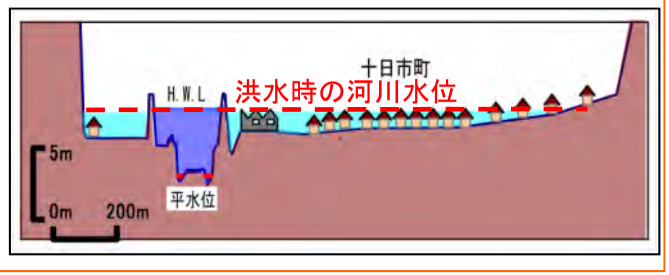

江の川狭窄部

中流部の高い堤防

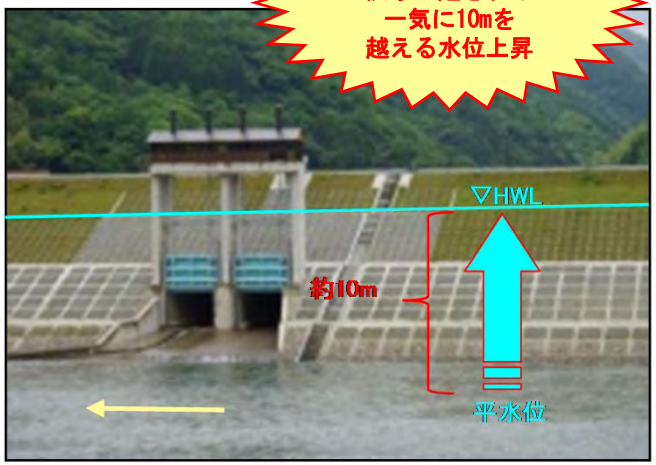

事業の目的・必要性（過去の洪水被害）

国土交通省

■戦後最大の昭和47年7月洪水では、14,000戸を超える家屋浸水被害が発生。三次市街地では堤防の決壊により甚大な被害が発生
■近年においても平成18年7月、9月、平成22年7月洪水により、家屋浸水被害が頻発

【主な洪水被害】

【家屋被害の出典】
S47.7：昭和47年7月豪雨災害誌
その他：水害統計

洪水名	2日間雨量（mm）		最大流量（m^3/s）		全壊・半壊流失家屋数（棟）	浸水家屋数（棟）			備考欄
	江津	尾関山	江津（川平）	尾関山		合計	床上浸水	床下浸水	
昭和47年7月	362	346	10,200	6,900	3,960	14,063	6,202	7,861	
昭和58年7月	202	158	7,500	4,600	206	3,517	1,115	2,402	昭和49年土師ダム完成
平成11年6月	144	134	6,300	5,200	－	288	35	253	
平成18年7月	177	149	6,700	3,400	－	153	8	145	
平成18年9月	104	132	3,200	2,400	3	253	77	176	
平成22年7月	168	178	5,800	3,700	－	57	21	36	平成18年灰塚ダム完成

昭和58年7月洪水　江津市桜江町

平成22年7月洪水　三次市旭地区

昭和47年7月洪水　三次市十日市地区

平成18年9月洪水　安芸高田市国司地区

河川整備計画の整備目標・期間・実施内容①

国土交通省

■計画高水流量は、江の川水系河川整備基本方針において基準地点尾関山において7,600m³/s、江津において10,700m³/sと設定

■長期的な治水目標である河川整備基本方針に定めた目標に向けて、上下流及び本支川の治水安全度バランスを確保しつつ段階的かつ着実に河川整備を実施することとする。

洪水対策の諸元

江の川水系河川整備基本方針：平成19年11月

■計画高水流量に関する事項

・計画高水流量は、粟屋において2,750m³/s、尾関山において7,600m³/sとし、江津において10,700m³/sとし、その下流は河口まで同流量とする。

・支川馬洗川及び西城川については、南畑敷、三次における計画高水流量を3,200m³/s、2,600m³/sとする。

計画高水流量配分図

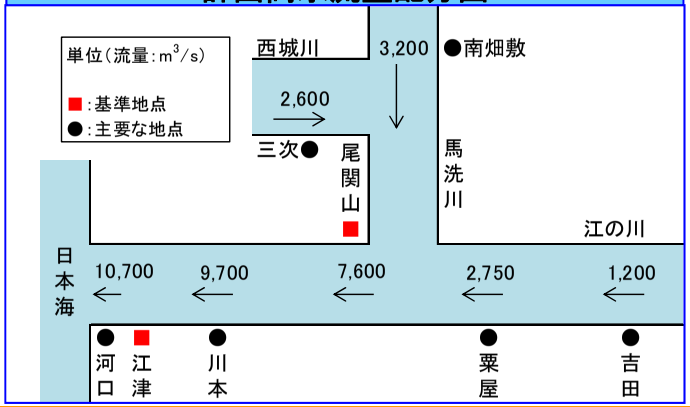

江の川水系河川整備計画

■整備目標

・江の川及び馬洗川においては戦後最大の被害をもたらした昭和47年7月洪水と同規模の洪水に対して、洪水氾濫による家屋の浸水被害防止を図る。また、西城川については戦後第２位の洪水である昭和58年7月洪水と同規模の洪水に対して、洪水氾濫による家屋の浸水被害防止を図る。

基準点江津目標流量	基準点尾関山目標流量	
基本方針：10,700m³/s（14,500m³/s）	基本方針：7,600m³/s（10,200m³/s）	
整備目標：10,400m³/s（11,100m³/s）	整備目標：6,800m³/s（7,800m³/s）	※（　）書きは洪水調節施設によるカット前

■整備期間

整備目標を達成するために必要な期間として概ね30年間を整備期間として設定

■実施内容

整備期間内に目標を達成するために必要な事業箇所を選定

河川整備計画の整備目標・期間・実施内容②

国土交通省

浜田河川国道事務所管内（島根県）

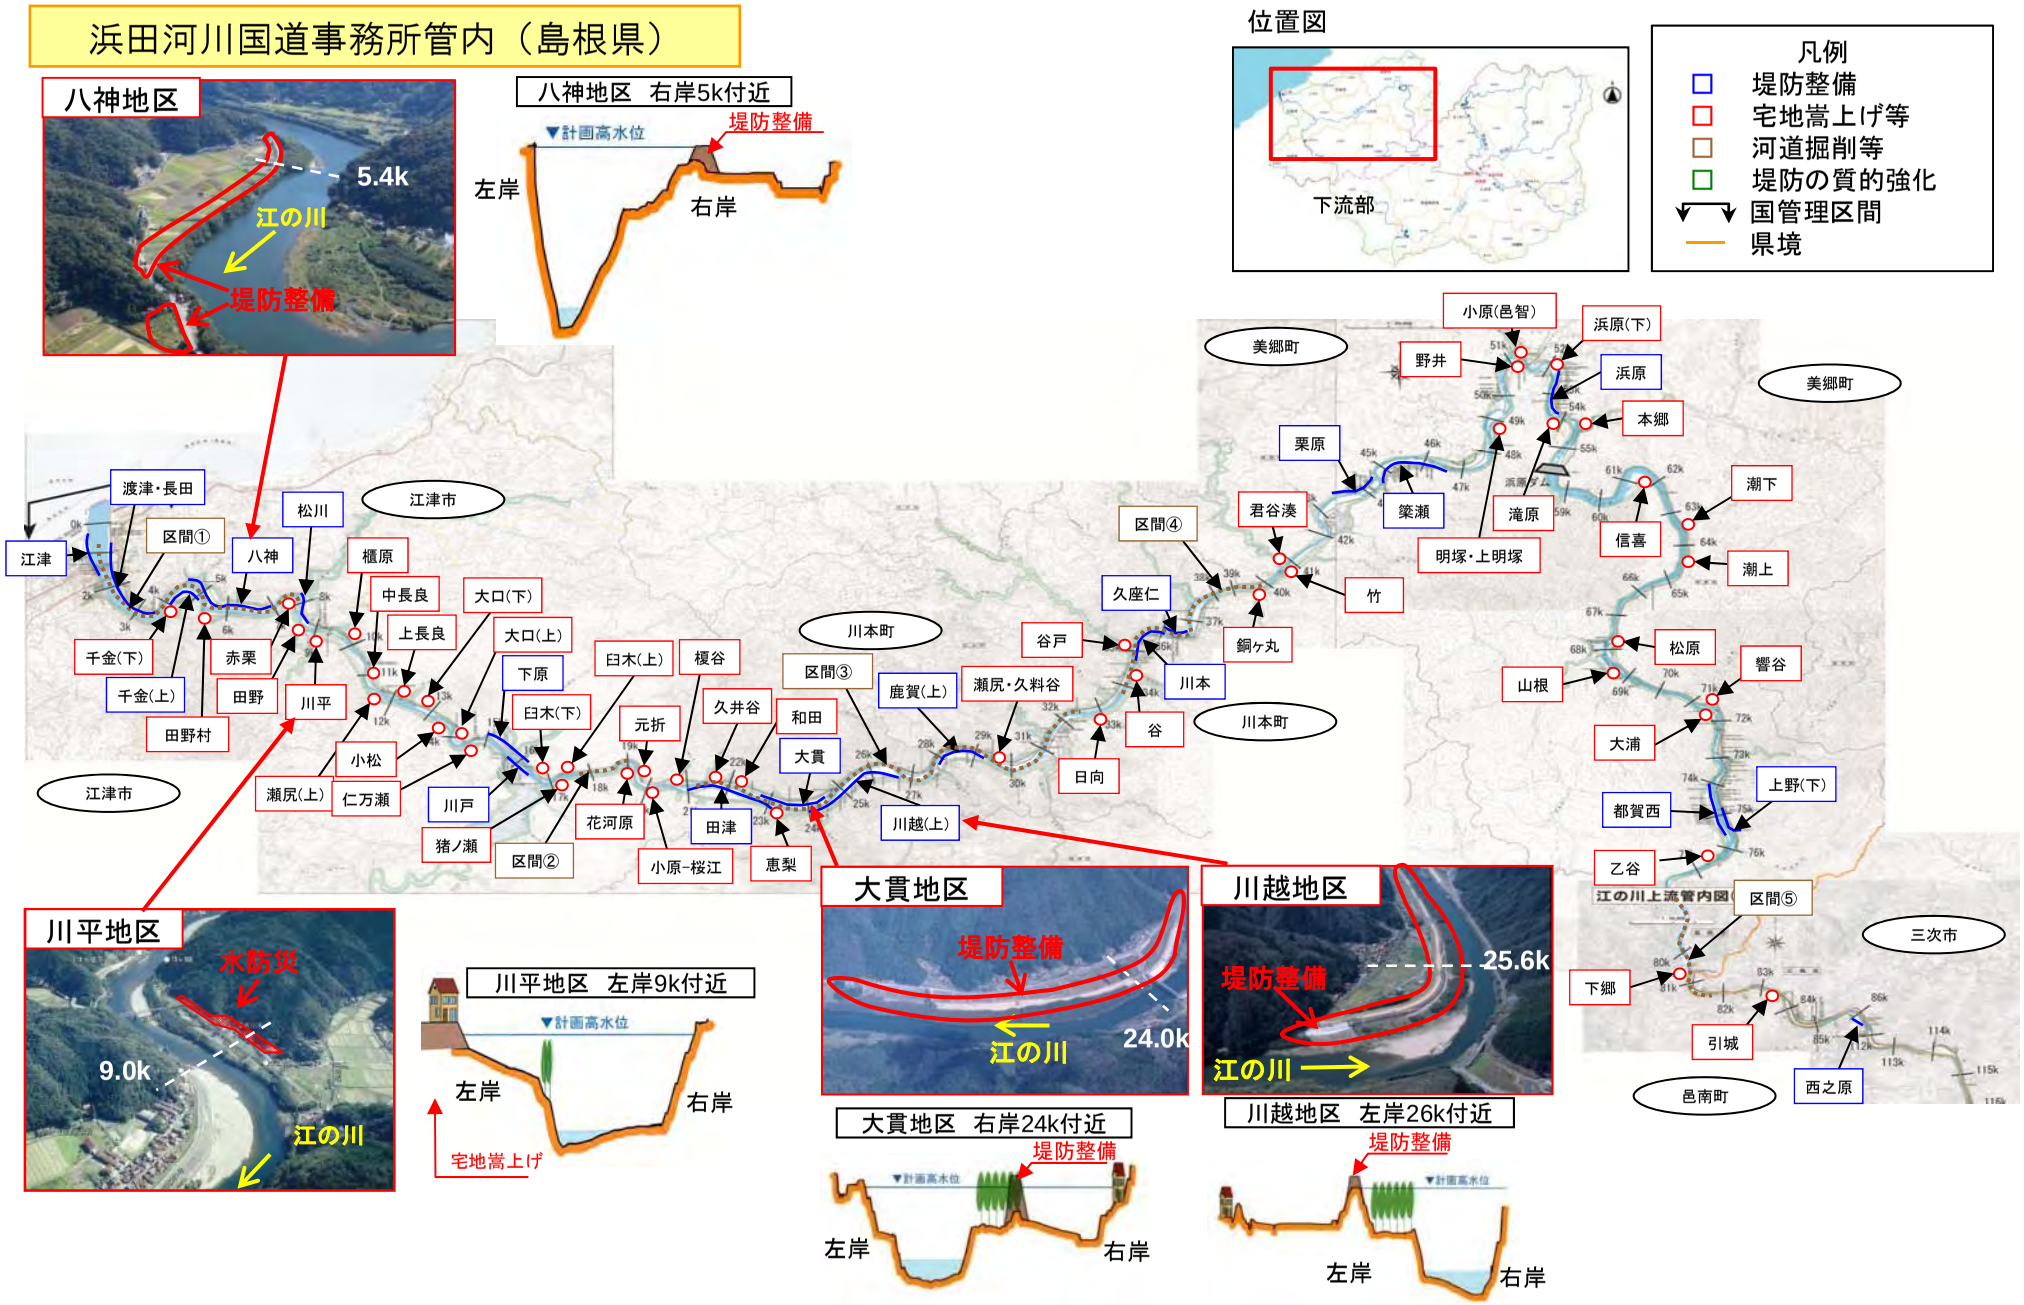

河川整備計画の整備目標・期間・実施内容③

国土交通省

三次河川国道事務所管内（広島県）

門田地区　右岸125k付近

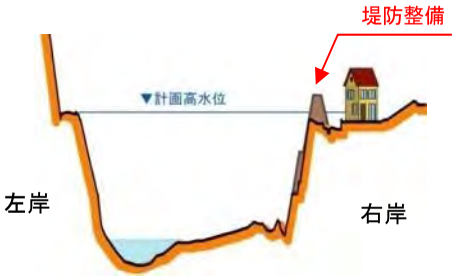

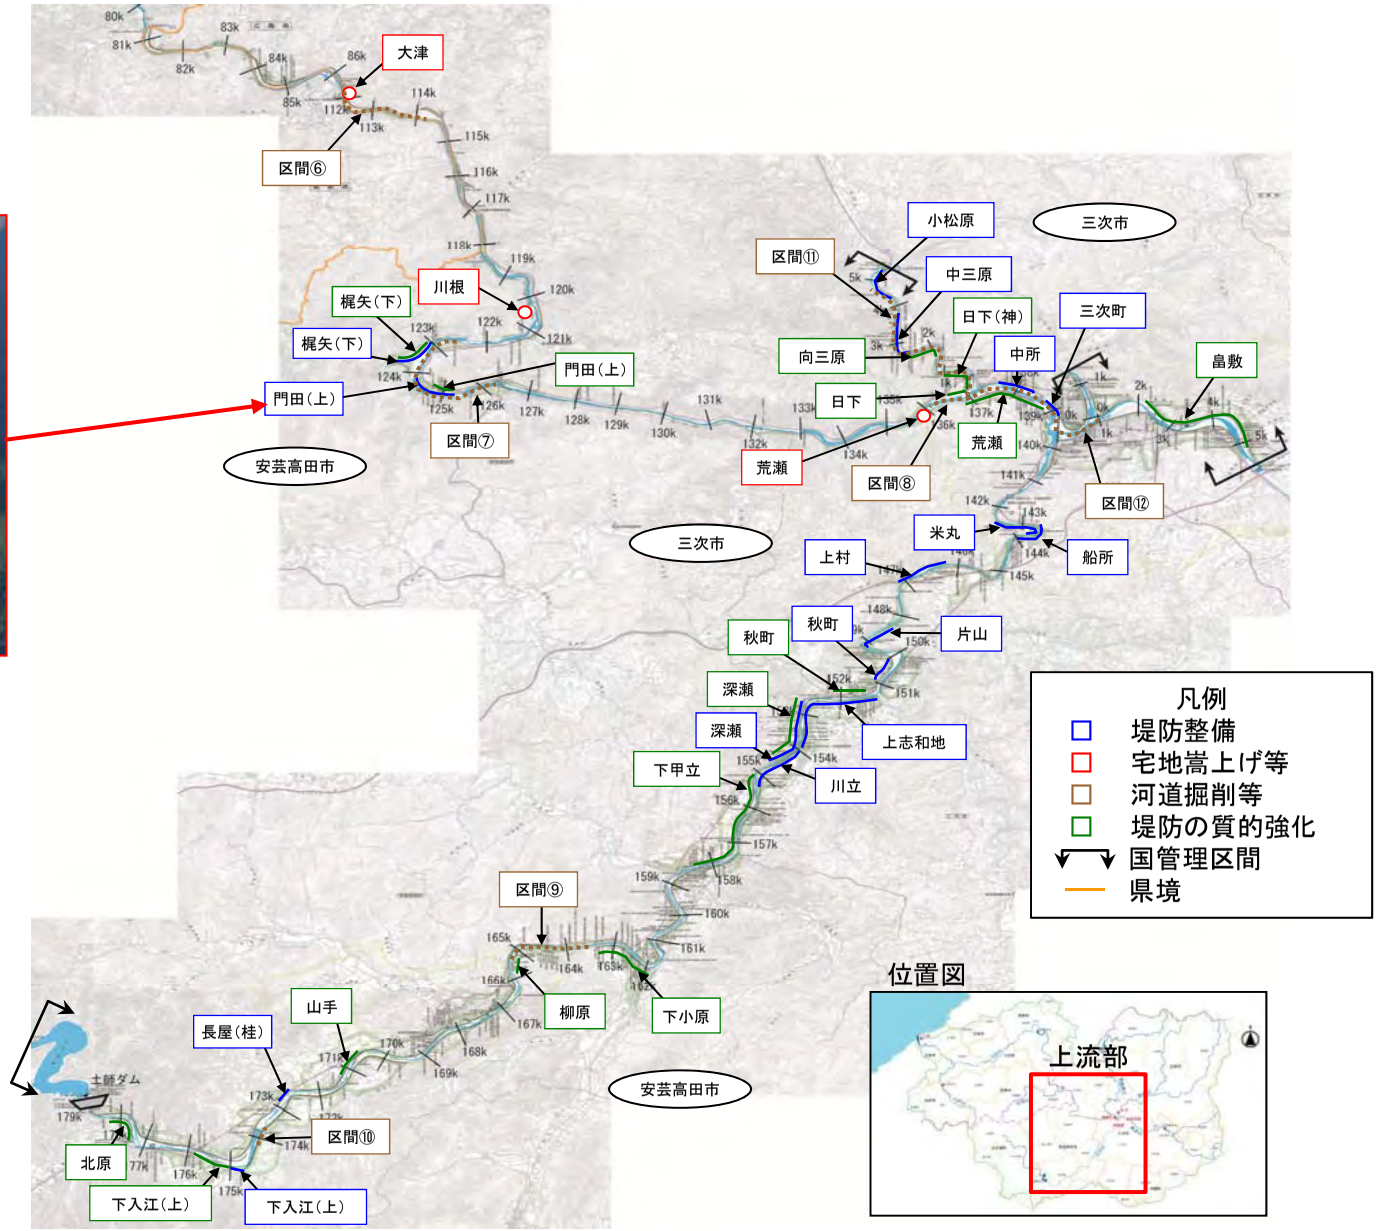

コスト縮減や代替案立案等の可能性

国土交通省

■コスト縮減：江の川の河床掘削に伴い発生した土を築堤材料として再利用することや他の事業との連携を模索し、残土処分費用等のコスト縮減を図る。

■代替案立案等の可能性：山間狭窄部の家屋が点在する小集落等では土地利用形態等を考慮し、宅地嵩上げや輪中堤等の治水対策を検討

築堤盛土への有効利用

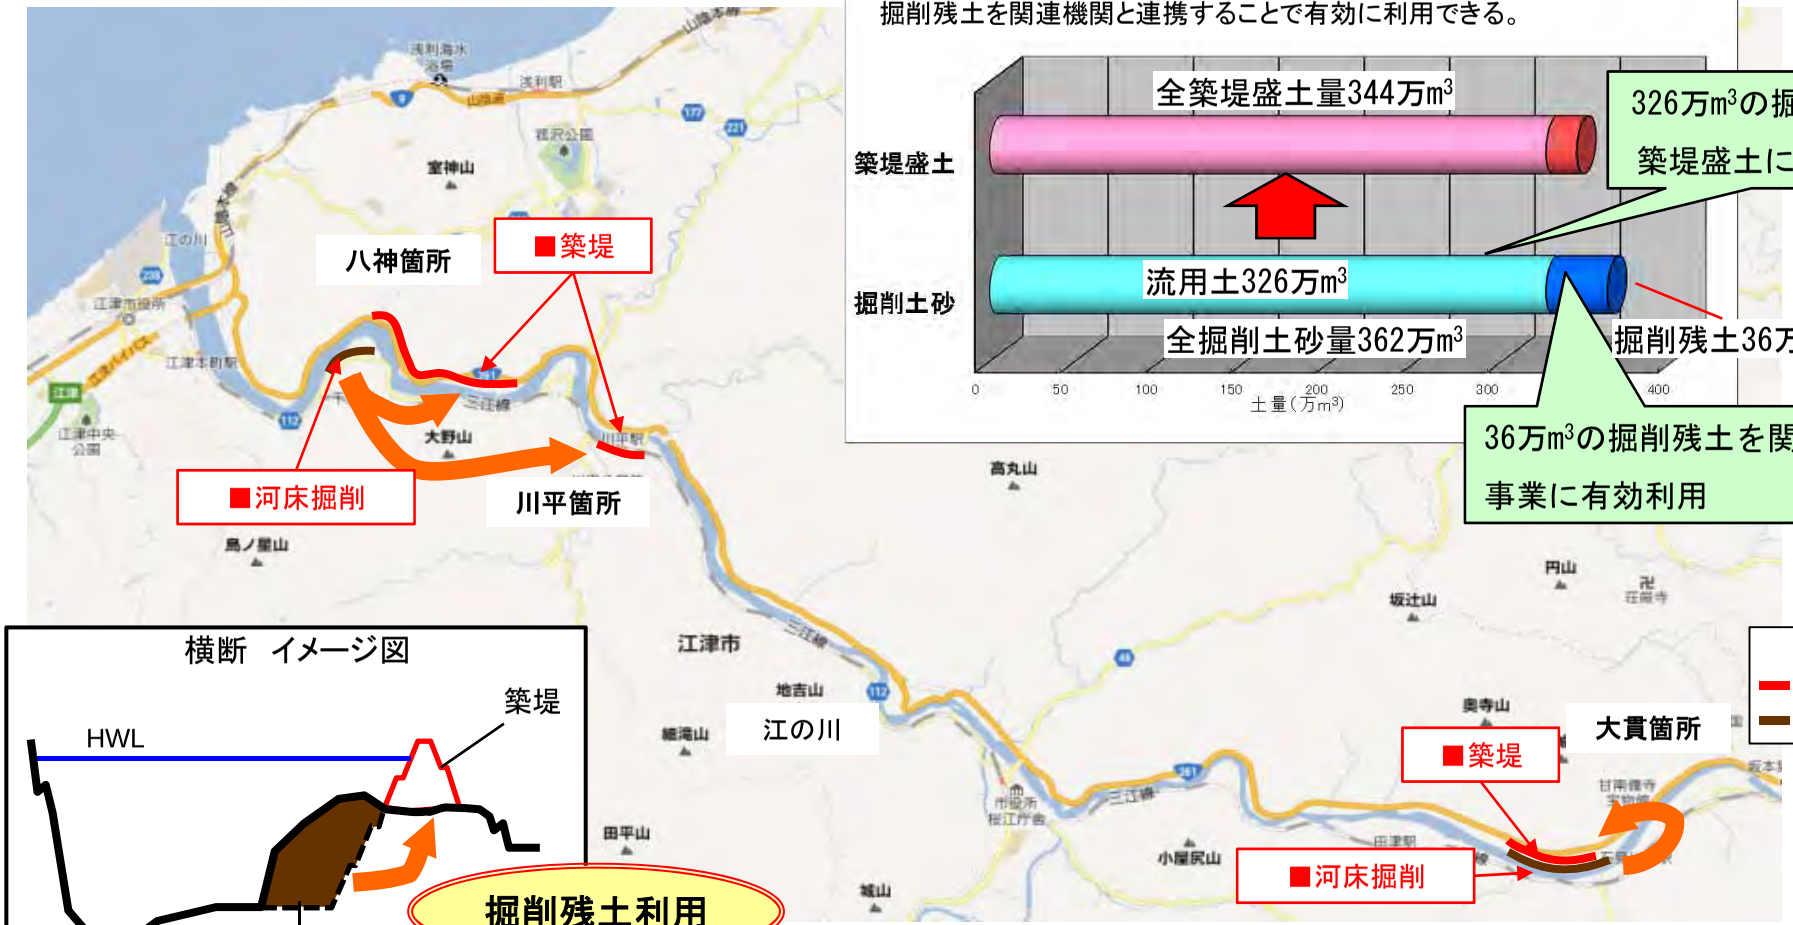

掘削土砂を最大限活用することでコストを縮減でき、
掘削残土を関連機関と連携することで有効に利用できる。

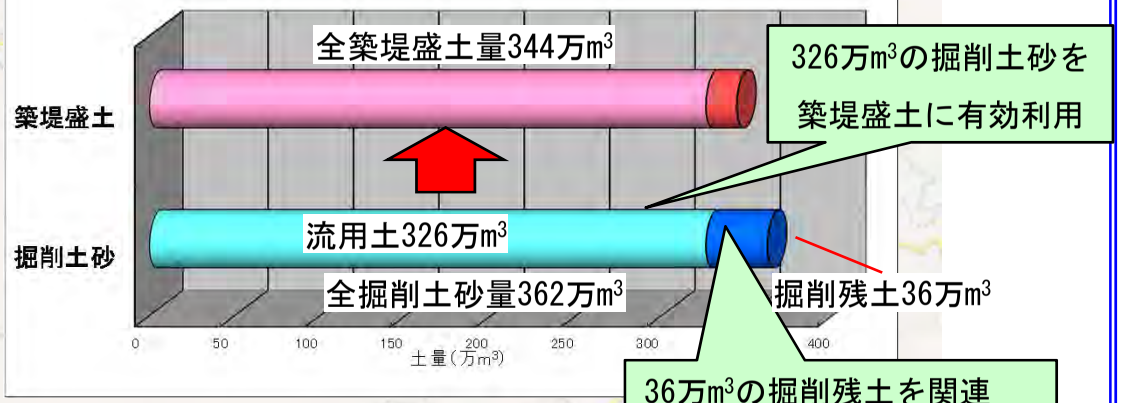

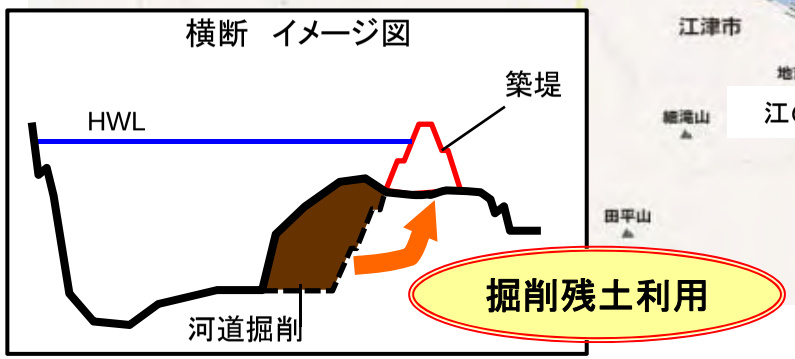

事業の費用対効果分析

費用便益比（B/C）算出の流れ

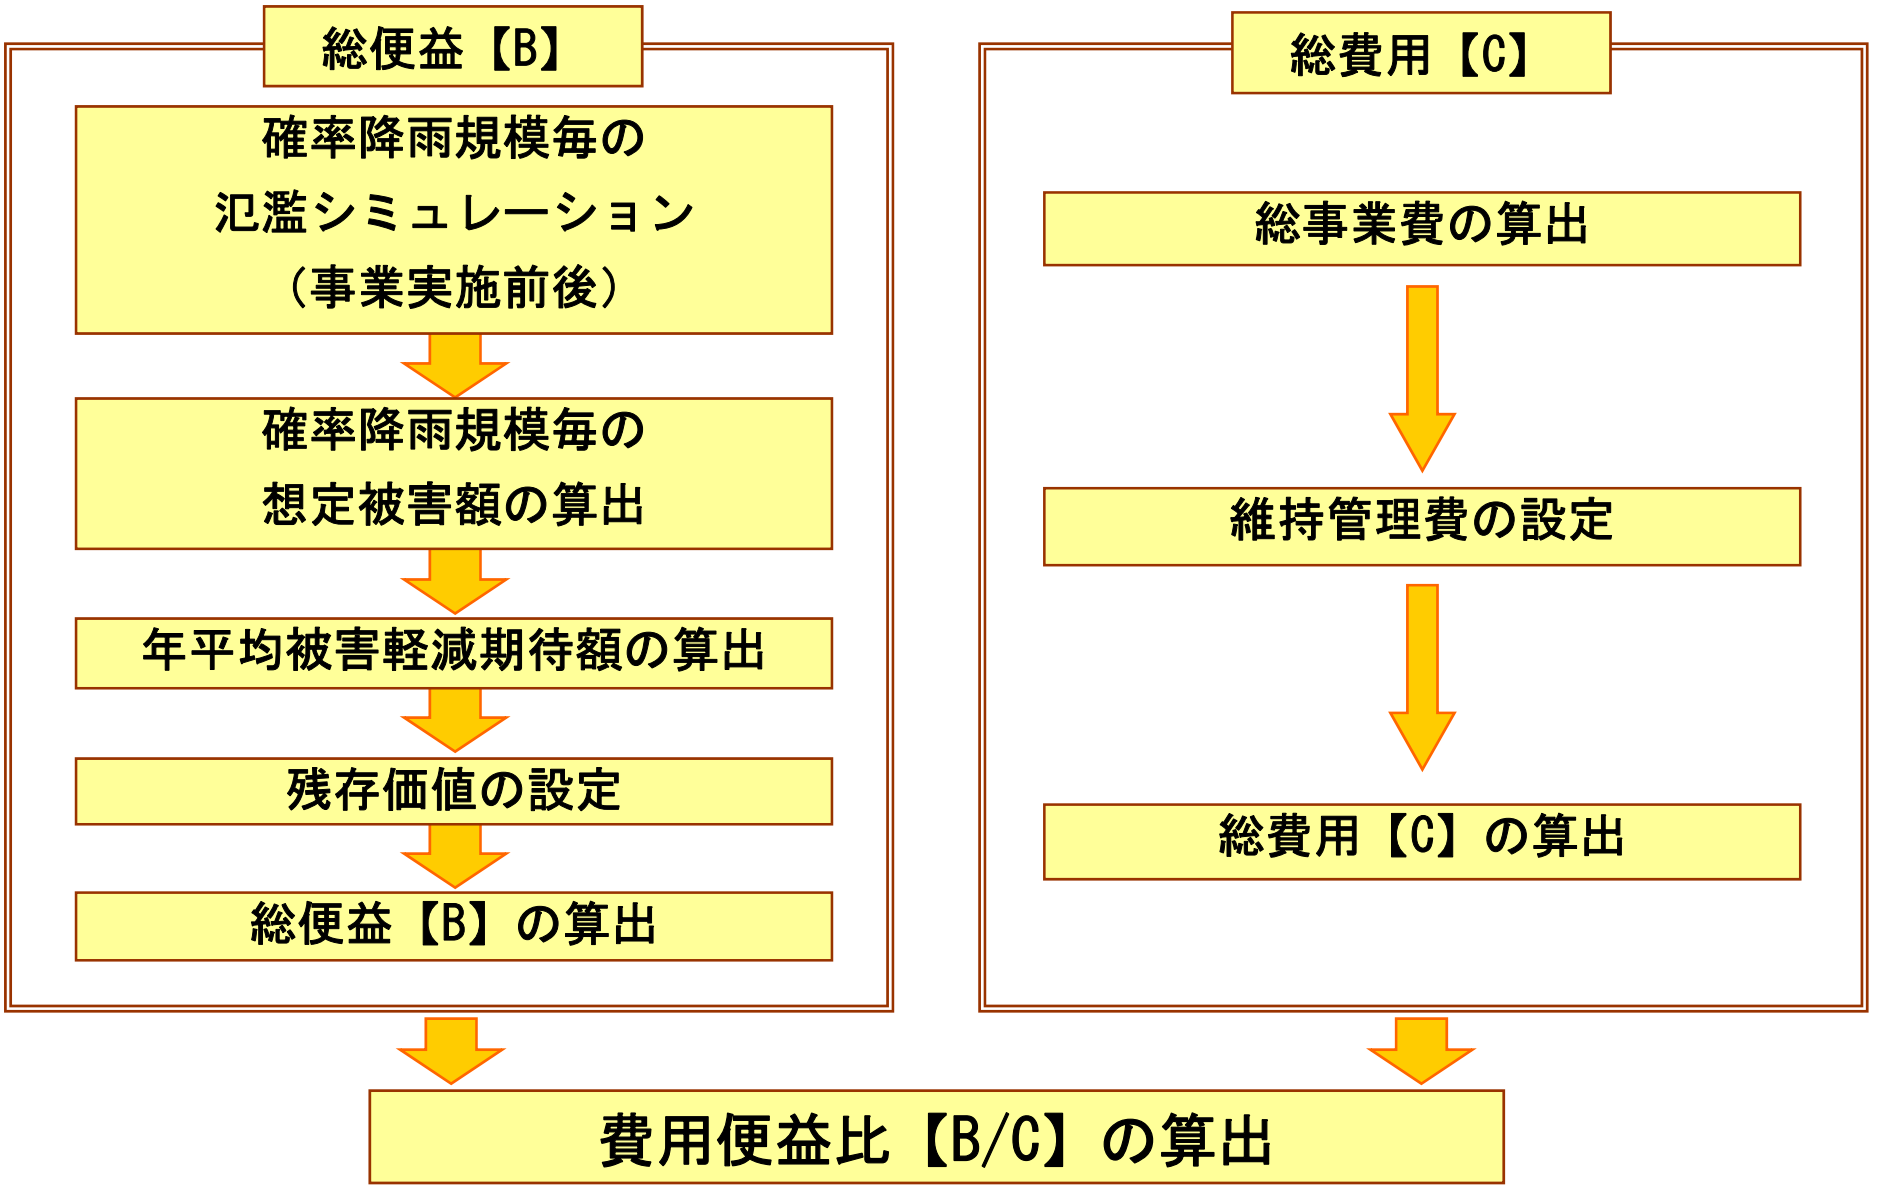

河川整備計画に対する被害額計上について

国土交通省

治水事業における便益算定にあたっては、『治水経済調査マニュアル（案）』（平成17年4月）により実施している。

治水事業の便益は、事業実施の有無による氾濫シミュレーションを実施し、被害額の差分より求めており、その被害額については、右表のとおりである。

具体的には、家屋（居住用・事業用建物の被害）や家庭用品（家具・自動車等の浸水被害）等の直接被害と、事業所営業停止被害（浸水した事業所の精算の停止・停滞）等の間接被害を浸水深に応じて算出している。

事業実施前

事業実施後

治水事業のストック効果

出典：治水経済調査マニュアル（案）平成17年4月

分類					効果（被害）の内容
被害防止便益	直接被害	資産被害抑止効果	一般資産被害	家　屋	居住用・事業用建物の被害
				家庭用品	家具・自動車等の浸水被害
				事業所償却資産	事業所固定資産のうち，土地・建物を除いた償却資産の浸水被害
				事業所在庫資産	事業所在庫品の浸水被害
				農漁家償却資産	農漁業生産に係わる農漁家の固定資産のうち，土地・建物を除いた償却資産の浸水被害
				農漁家在庫資産	農漁家の在庫品の浸水被害
			農産物被害		浸水による農作物の被害
			公共土木施設等被害		公共土木施設，公益事業施設，農地，農業用施設の浸水被害
		人身被害抑止効果			人命損傷
	間接被害	稼動被害抑止効果	営業停止被害	家　計	浸水した世帯の平時の家事労働，余暇活動等が阻害される被害
				事　業　所	浸水した事業所の生産の停止・停滞（生産高の減少）
				公共・公益サービス	公共・公益サービスの停止・停滞
		事後的被害抑止効果	応急対策費用	家　計	浸水世帯の清掃等の事後活動，飲料水等の代替品購入に伴う新たな出費等の被害
				事　業　所	家計と同様の被害
				国・地方公共団体	家計と同様の被害および市町村等が交付する緊急的な融資の利子や見舞金等
			交通途絶による波及被害	道路，鉄道，空港，港湾等	道路や鉄道等の交通の途絶に伴う周辺地域を含めた波及被害
			ライフライン切断による波及被害	電力，水道，ガス，通信等	電力，ガス，水道等の供給停止に伴う周辺地域を含めた波及被害
			営業停止波及被害		中間産品の不足による周辺事業所の生産量の減少や病院等の公共・公益サービスの停止等による周辺地域を含めた波及被害
		精神的被害抑止効果	資産被害に伴うもの		資産の被害による精神的打撃
			稼動被害に伴うもの		稼動被害に伴う精神的打撃
			人身被害に伴うもの		人身被害に伴う精神的打撃
			事後的被害に伴うもの		清掃労働等による精神的打撃
			波及被害に伴うもの		波及被害に伴う精神的打撃
		リスクプレミアム			被災可能性に対する不安
高度化便益					治水安全度の向上による地価の上昇等

※地下街が浸水することによる被害等、その他の被害抑止効果も存在する。
（表中の□は、本マニュアル（案）で被害率や被害単価を明示した項目）

表中の□は、治水経済調査マニュアル（案）で被害率や被害単価が明示されており、今回の費用対効果分析において被害額を算定している項目。

江の川直轄河川改修事業(全体事業)【 H28 ～ H57 】

国土交通省

①便益の算出方法

■計画規模1/100年確率を最大として７ケース検討（無害流量、1/5年、1/10年、1/30年、1/50年、1/80年、1/100年）

■年平均被害軽減期待額　約１２１億円

年平均被害軽減期待額

計画1/100の区間

（単位：百万円）

確率規模	年平均超過確率	被害額 事業を実施しない場合 ①	被害額 事業を実施した場合 ②	被害額 被害軽減額 (①－②) ③	区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/2 (無害流量)	0.50000	0	0	0	－－	－－	－－	0
1/5	0.20000	4,501	6	4,495	2,248	0.3000	674	674
1/10	0.10000	31,215	414	30,801	17,648	0.1000	1,765	2,439
1/30	0.03333	139,094	6,736	132,358	81,580	0.0667	5,441	7,880
1/50	0.02000	247,603	117,242	130,361	131,360	0.0133	1,747	9,627
1/80	0.01250	544,294	370,725	173,569	151,965	0.0075	1,140	10,767
1/100	0.01000	655,590	413,715	241,875	207,722	0.0025	519	11,286

計画1/80の区間

（単位：百万円）

確率規模	年平均超過確率	被害額 事業を実施しない場合 ①	被害額 事業を実施した場合 ②	被害額 被害軽減額 (①－②) ③	区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/2 (無害流量)	0.50000	0	0	0	－－	－－	－－	0
1/5	0.20000	79	0	79	40	0.3000	12	12
1/10	0.10000	849	2	847	463	0.1000	46	58
1/30	0.03333	14,215	85	14,130	7,489	0.0667	499	557
1/50	0.02000	18,577	13,810	4,767	9,449	0.0133	126	683
1/80	0.01250	52,421	19,230	33,191	18,979	0.0075	142	825

年平均被害の合計　11,286+825=12,111









江の川直轄河川改修事業(全体事業)【 H28 ～ H57 】

国土交通省

②費用便益比(B／C)の算出

■便益の整理

・①で算出した評価期間中に発現する便益を、社会的割引率(４%)で割り引いた上で集計

・評価期間後に生じる残存価値を算定

■費用の整理

・今後見込まれる事業費、維持管理費については社会的割引率(4%)によって割り引いた上で集計

項　目	全体事業
便益(B1)	1,574億円
残存価値(B2)	6億円
総便益(B=B1+B2)	1,580億円
建設費(C1)	393億円
維持管理費(C2)	19億円
総費用(C=C1+C2)	412億円
便益費(B/C)	3.8

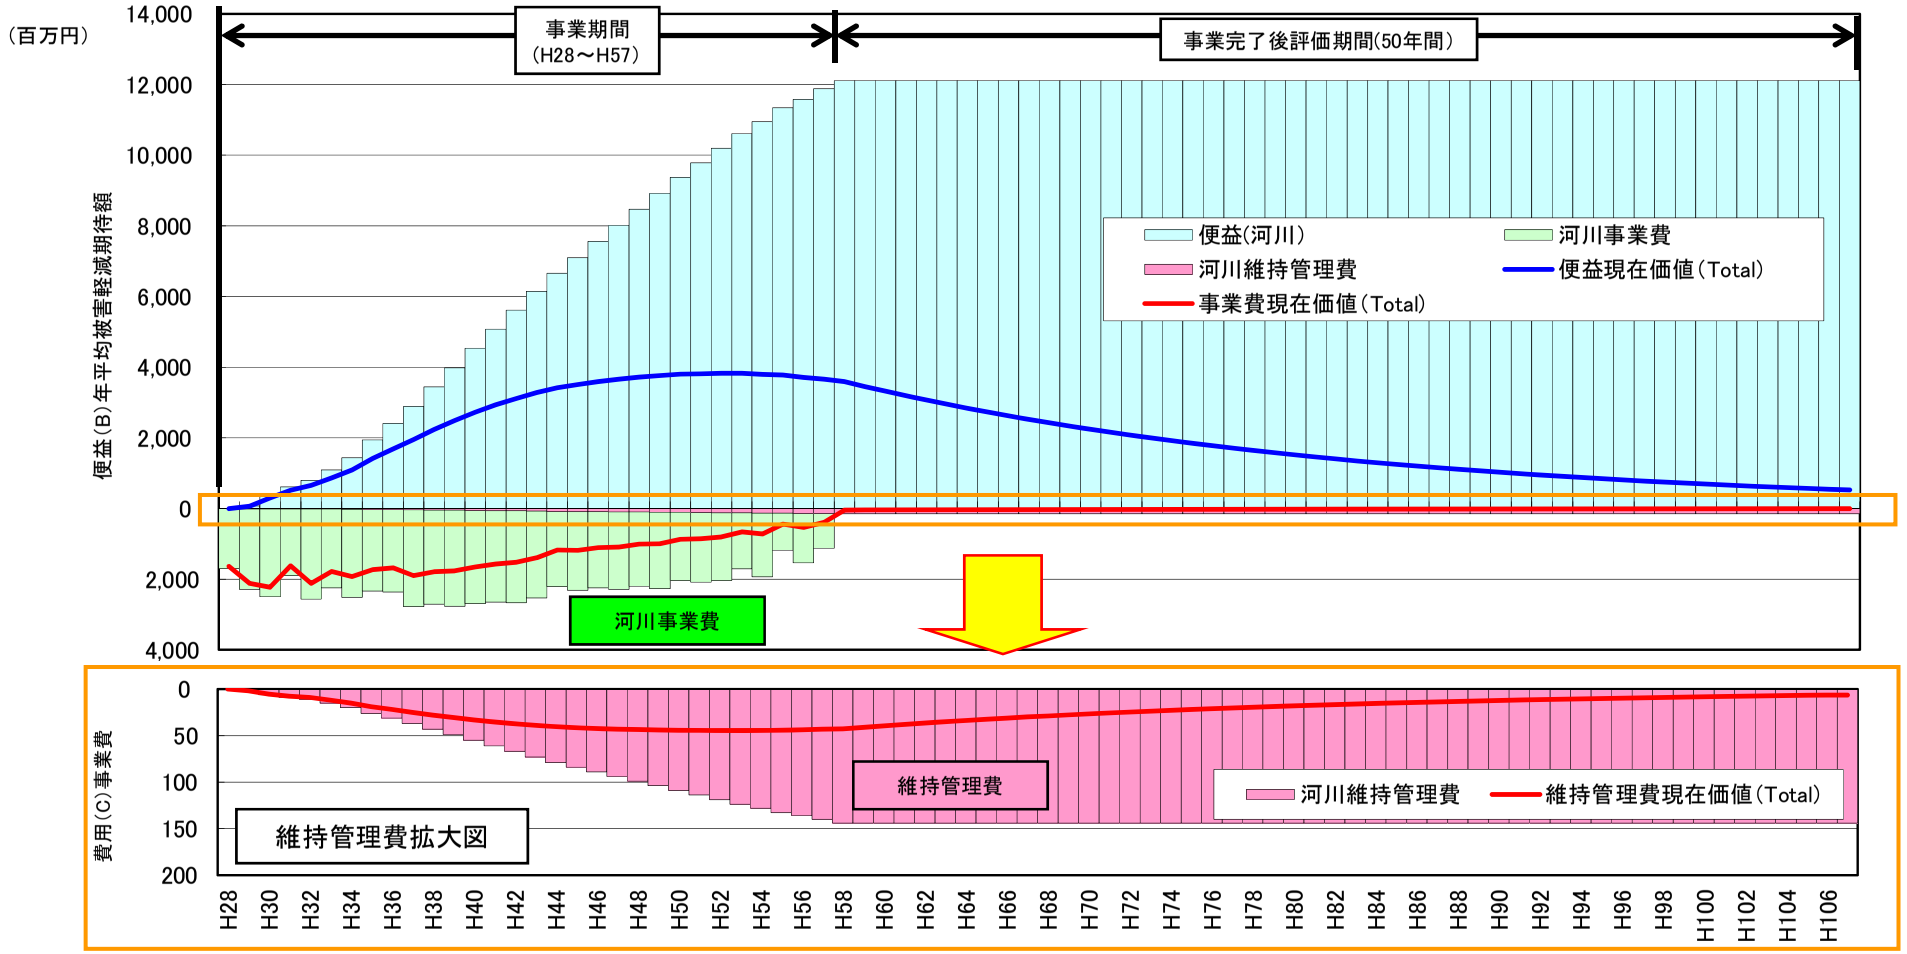

江の川直轄河川改修事業(全体事業)【 H28 ～ H57 】

国土交通省

③事業効果

■（例）1/30確率相当洪水が発生した場合における、現状と全体事業完成後との発生被害を比較

事業実施前

浸水世帯数	2,466世帯
浸水面積	1,339ha
被害額	1,533億円

注意:1/30確率の場合の被害想定

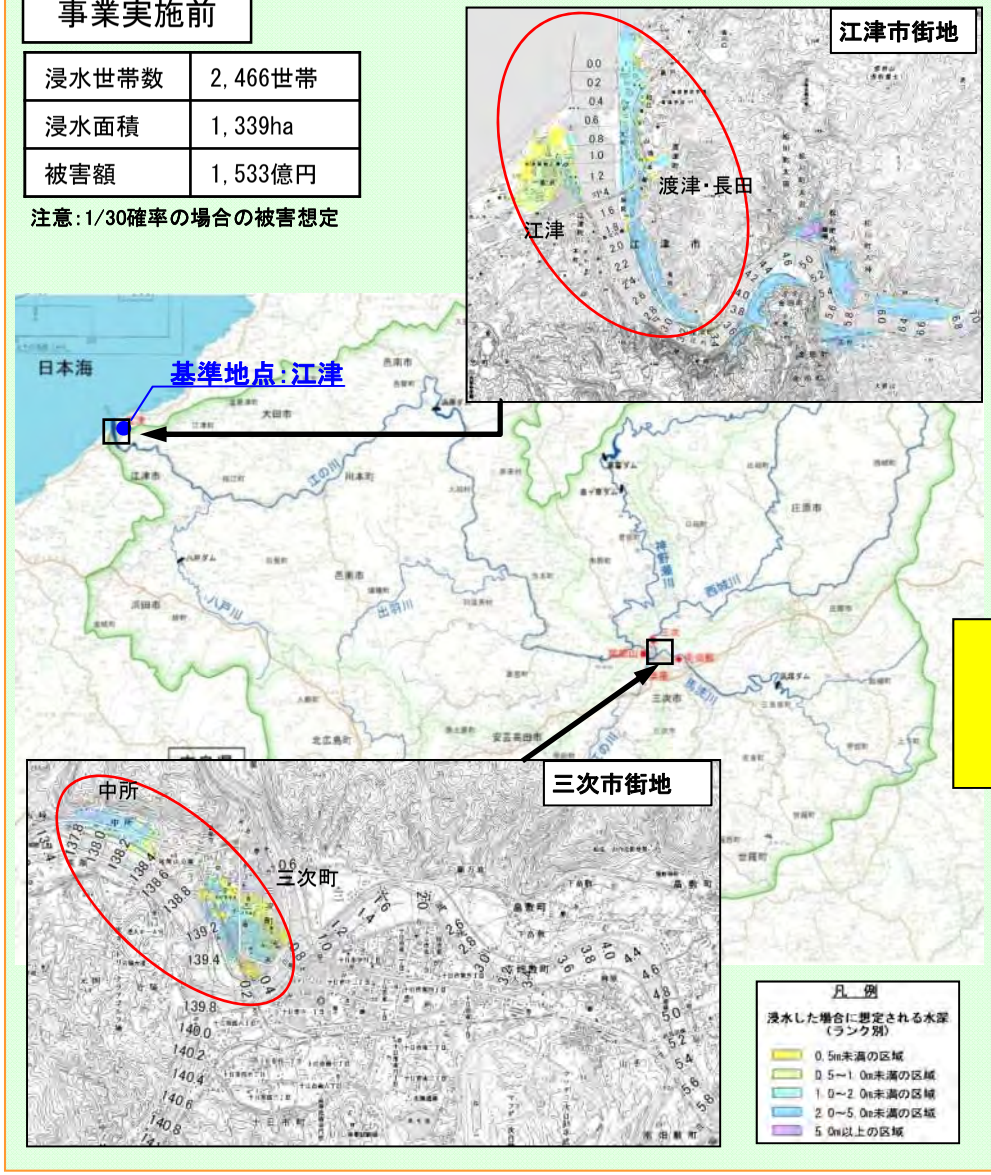

事業実施後

浸水世帯数	80世帯
浸水面積	327ha
被害額	68億円

注意:1/30確率の場合の被害想定

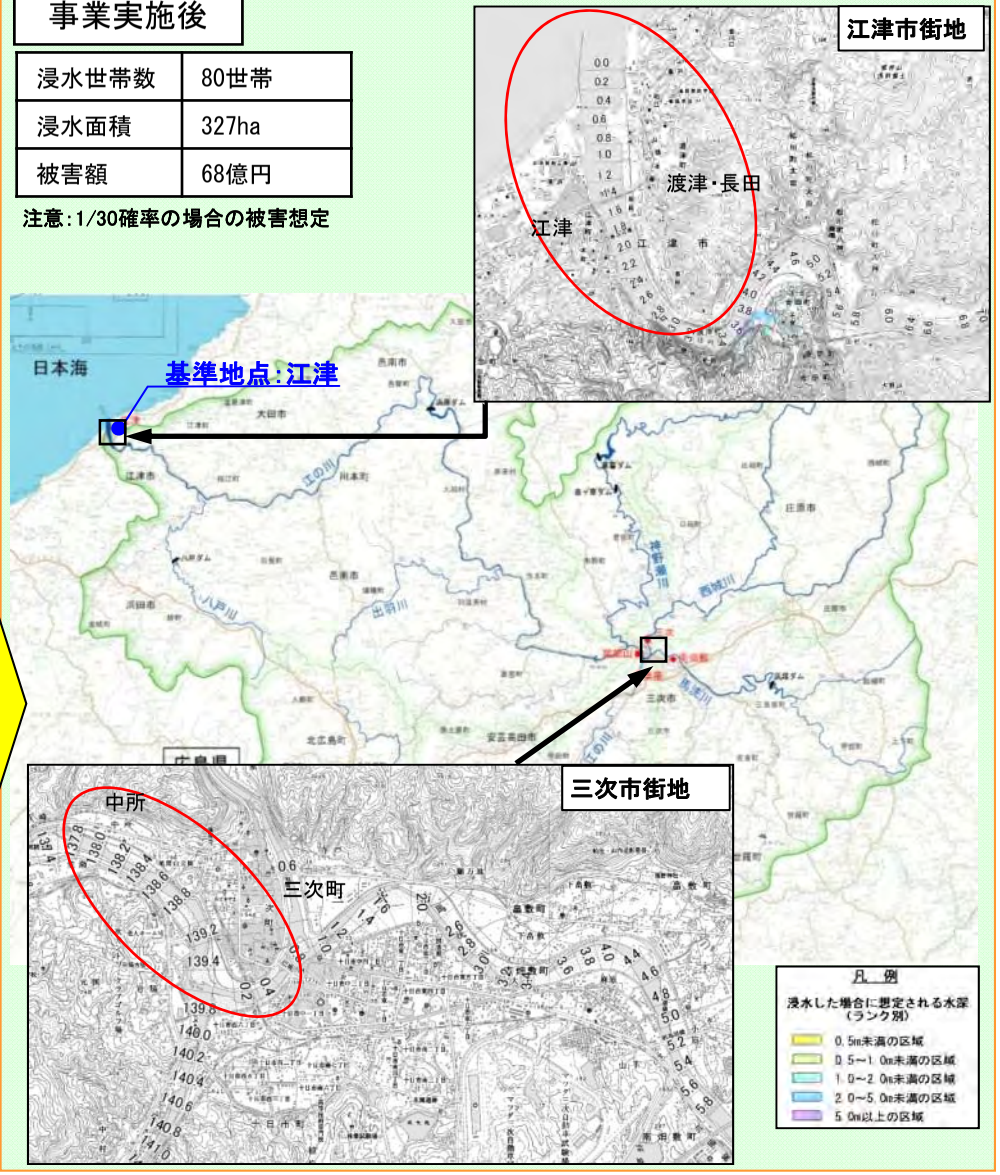

江の川直轄河川改修事業（当面6年間）【 H28 ～ H33 】

国土交通省

①便益の算出方法

■計画規模1/100年確率を最大として７ケース検討（無害流量、1/5年、1/10年、1/30年、1/50年、1/80年、1/100年）

■年平均被害軽減期待額　約１４億円

年平均被害軽減期待額

計画1/100の区間　（単位：百万円）

確率規模	年平均超過確率	被害額 事業を実施しない場合 ①	被害額 事業を実施した場合 ②	被害額 被害軽減額（①－②） ③	区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/2（無害流量）	0.50000	0	0	0	－－	－－	－－	0
1/5	0.20000	4,501	3,988	513	257	0.3000	77	77
1/10	0.10000	31,215	23,325	7,890	4,202	0.1000	420	497
1/30	0.03333	139,094	124,727	14,367	11,129	0.0667	742	1,239
1/50	0.02000	247,603	241,286	6,317	10,342	0.0133	138	1,377
1/80	0.01250	544,294	542,705	1,589	3,953	0.0075	30	1,407
1/100	0.01000	655,590	654,781	809	1,199	0.0025	3	1,410

計画1/80の区間　（単位：百万円）

確率規模	年平均超過確率	被害額 事業を実施しない場合 ①	被害額 事業を実施した場合 ②	被害額 被害軽減額（①－②） ③	区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/2（無害流量）	0.50000	0	0	0	－－	－－	－－	0
1/5	0.20000	79	78	1	1	0.3000	0	0
1/10	0.10000	849	796	53	27	0.1000	3	3
1/30	0.03333	14,215	13,803	412	233	0.0667	16	19
1/50	0.02000	18,577	18,359	218	315	0.0133	4	23
1/80	0.01250	52,421	52,186	235	227	0.0075	2	25

年平均被害の合計　1,410+25=1,435









国土交通省

②費用便益比（B／C）の算出

■便益の整理
- ①で算出した評価期間中に発現する便益を、社会的割引率（４％）で割り引いた上で集計
- 評価期間後に生じる残存価値を算定

■費用の整理
- 今後見込まれる事業費、維持管理費については社会的割引率（4%）によって割り引いた上で集計

項　目	当面事業
便益(B1)	268億円
残存価値(B2)	4億円
総便益(B=B1+B2)	272億円
建設費(C1)	115億円
維持管理費(C2)	4億円
総費用(C=C1+C2)	118億円
便益費(B/C)	2.3

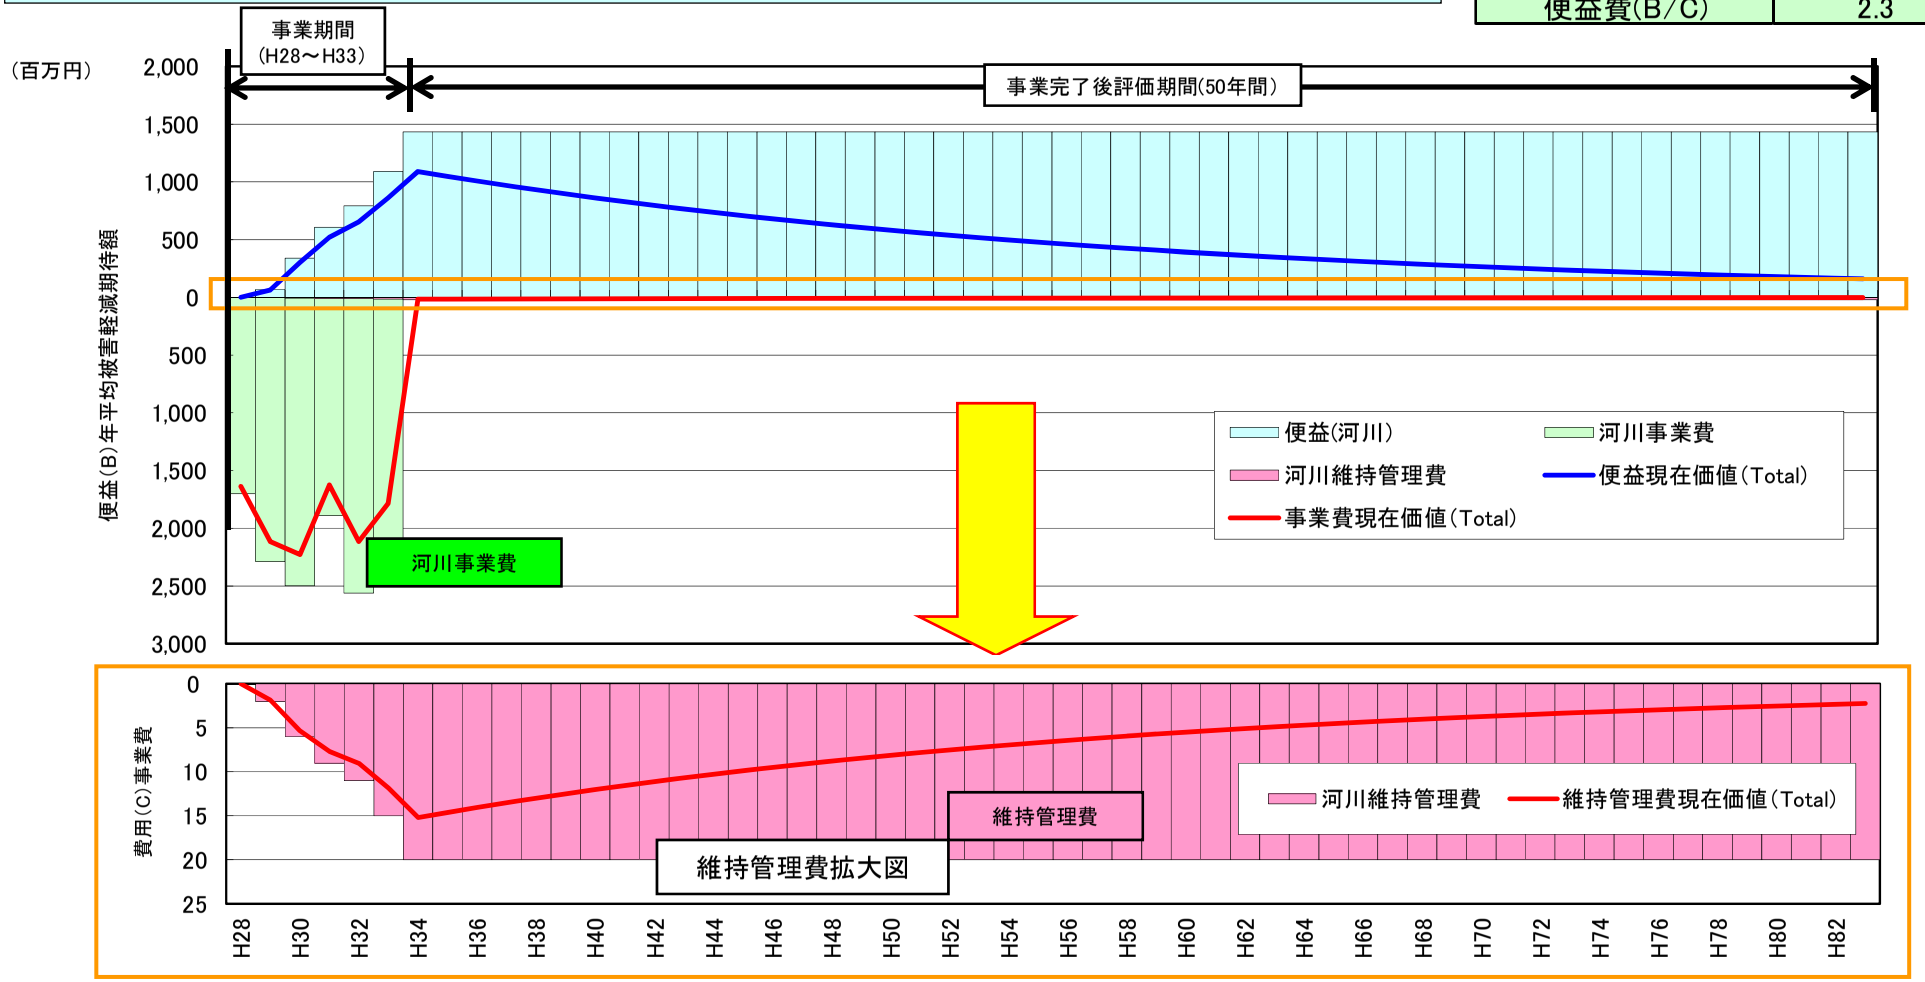

江の川直轄河川改修事業（当面6年間）【 H28 ～ H33 】

国土交通省

③事業効果

■ （例）1/30確率相当洪水が発生した場合における、現状と当面６年間完成後との発生被害を比較

事業実施前

浸水世帯数	2, 466世帯
浸水面積	1, 339ha
被害額	1, 533億円

注意：1/30確率の場合の被害想定

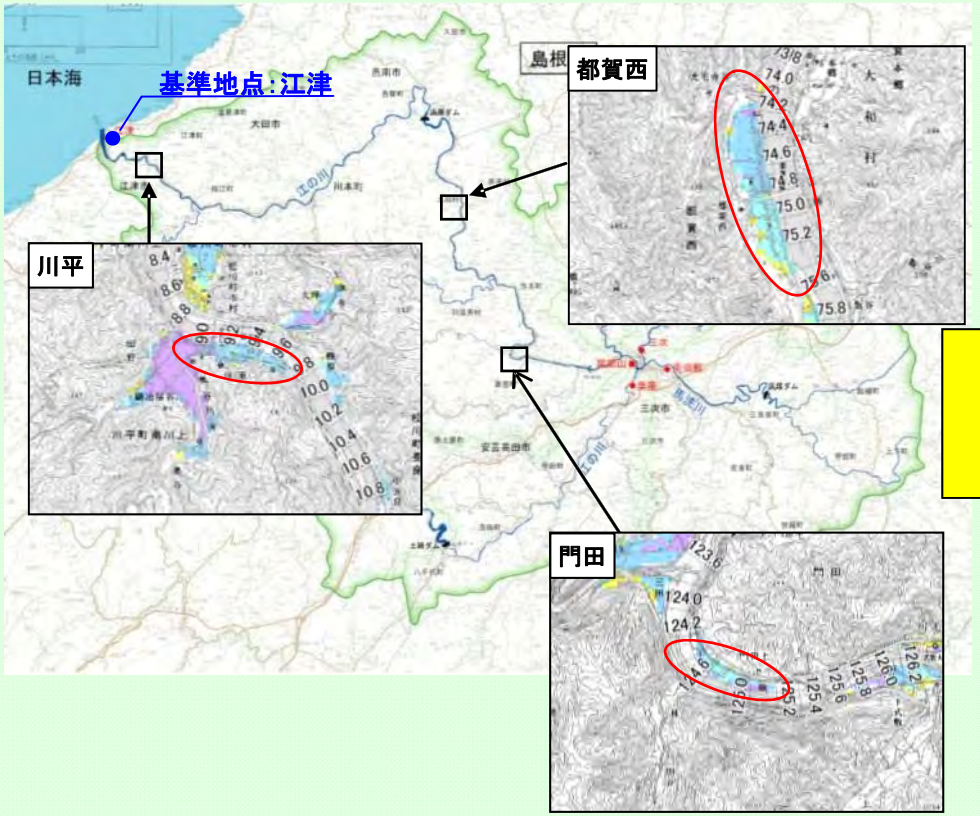

事業実施後

浸水世帯数	2, 240世帯
浸水面積	1, 201ha
被害額	1, 385億円

注意：1/30確率の場合の被害想定

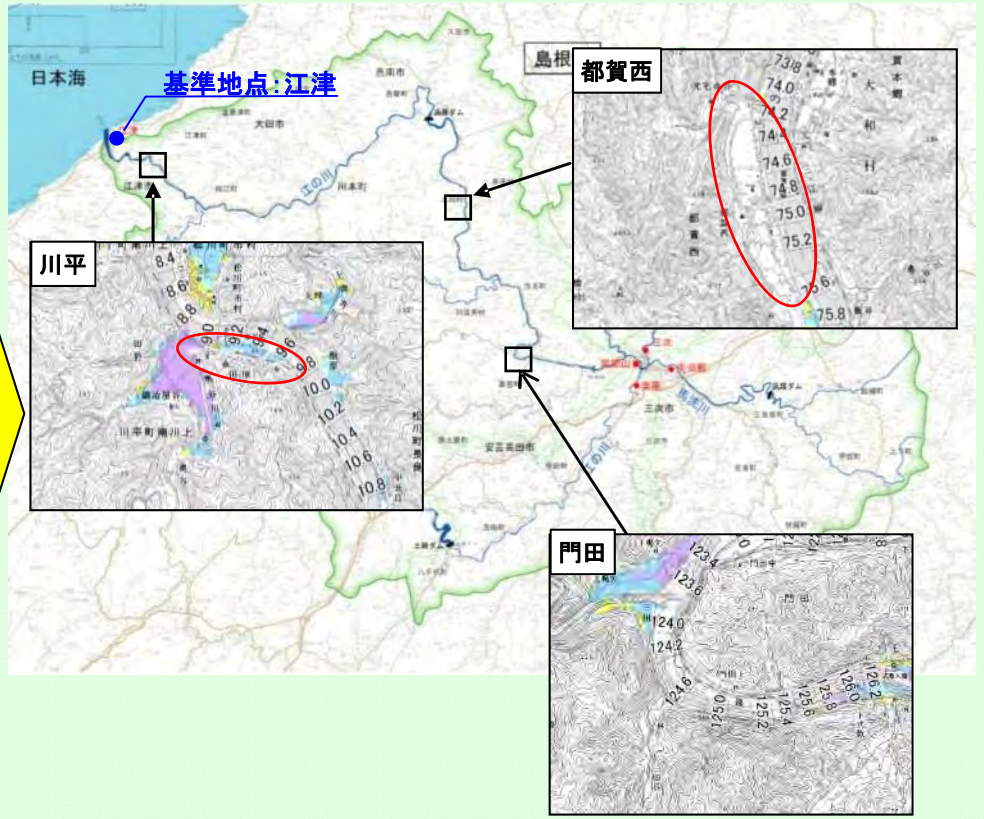

貨幣換算が困難な効果等による評価

国土交通省

■「水害の被害指標分析の手引き」に準じて河川整備による「人的被害」の軽減効果を算定
■対象洪水は、整備目標流量の洪水に対して評価を実施
■整備目標流量の洪水が発生した場合、江の川流域で想定死者数が381人（避難率40%）と想定されるが、事業実施により軽減される

「想定死者数」の考え方

浸水による想定死者数を避難率別に推計する。

・計算メッシュごとに、年齢別（65歳以上、未満）、居住する住宅の階数別（1階、2階、3階以上）に分類した人口に危険度を乗じた値の総和から想定死者数を算出する。
・既往水害における避難率は大きな幅があるため、避難率は0%、40%、80%の3つのケースを設定する。

整備目標流量の洪水における想定死者数

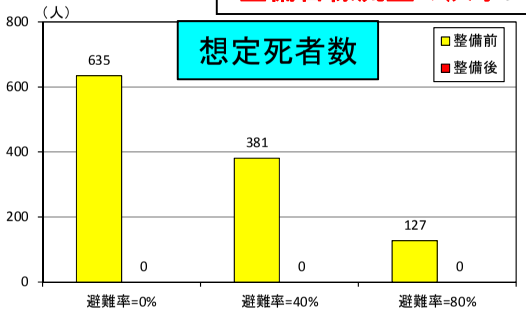

浸水面積

整備前	1,339ha
整備後	327ha

注意：1/30確率の場合の被害想定

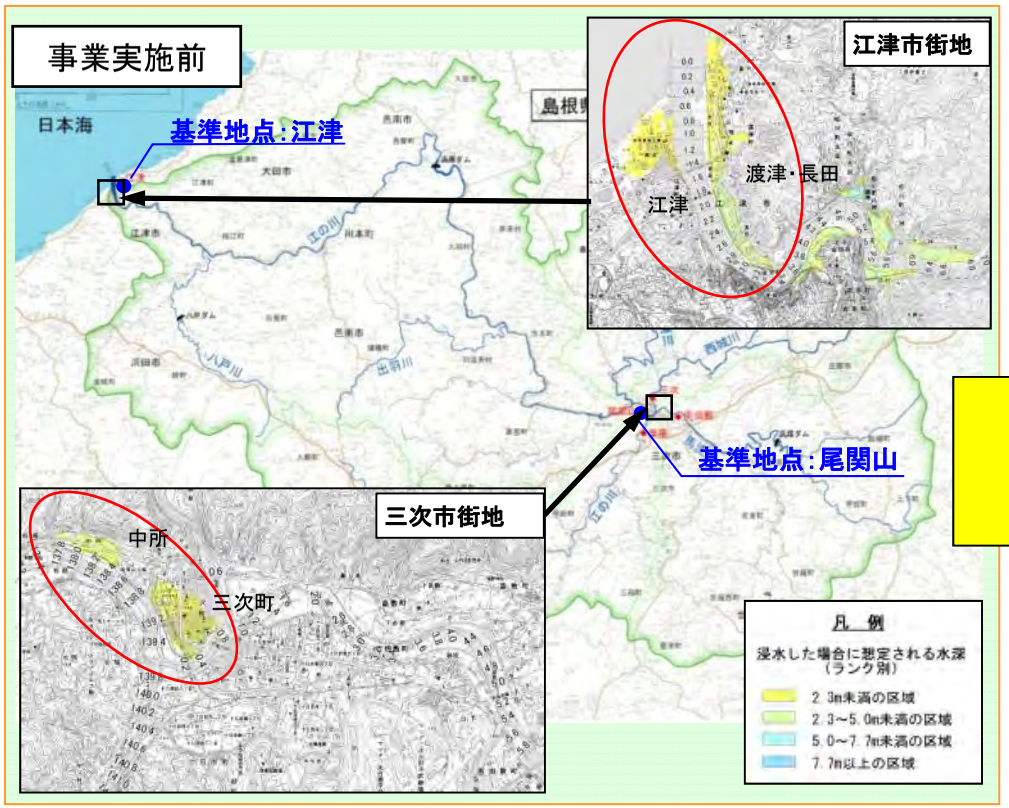

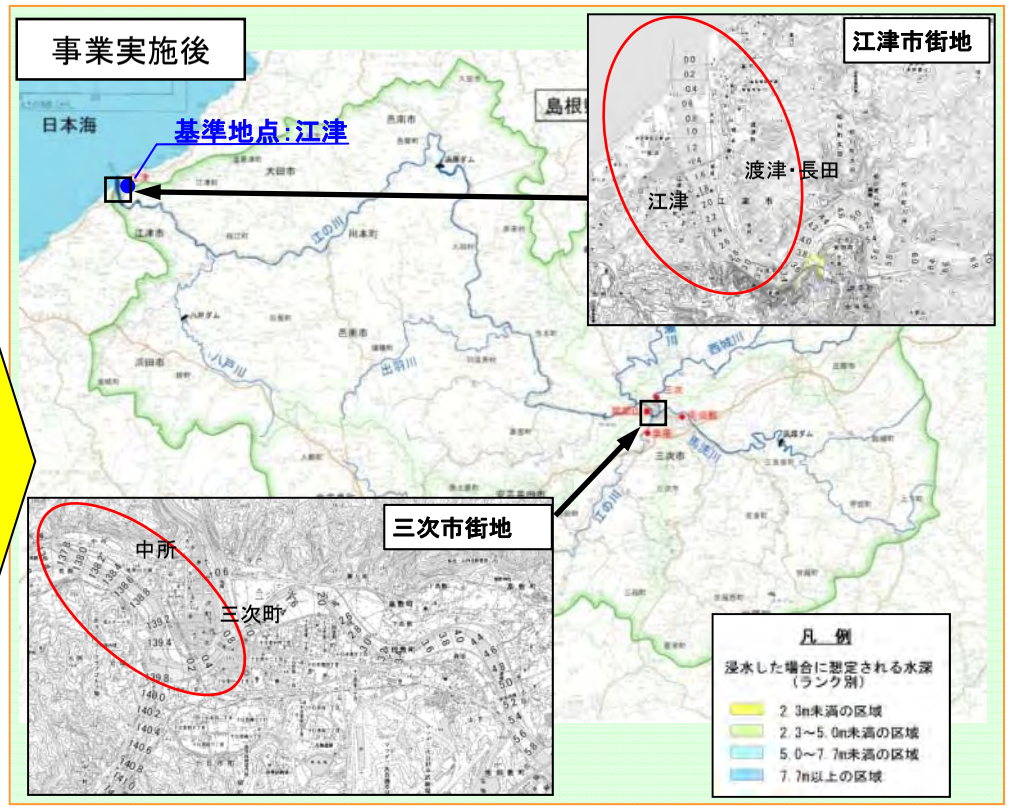

貨幣換算が困難な効果等による評価

国土交通省

■「水害の被害指標分析の手引き」に準じて河川整備による「ライフライン停止による波及被害」の軽減効果を算定
■対象洪水は、整備目標流量の洪水に対して評価を実施
■整備目標流量の洪水が発生した場合、江の川流域で電力の停止による影響人口が5,098人と想定されるが、事業実施により軽減される

「電力が停止する浸水深」の考え方

浸水により停電が発生する住宅等の居住者数を推計する。

・浸水深70cmでコンセント（床高50cm＋コンセント設置高20cm）に達し、屋内配線が停電する。
・浸水深100cm以上で、地上に設置された受変電設備（6,600V等の高圧で受電した電気を使用に適した電圧まで降下させる設備）及び地中線と接続された路上開閉器が浸水するため、集合住宅等の棟全体が停電する場合がある。
・浸水深340cm以上で、受変電設備等の浸水により棟全体が停電とならない集合住宅においては、浸水深に応じて階数毎に停電が発生する。

整備目標流量の洪水における電力停止による影響人数

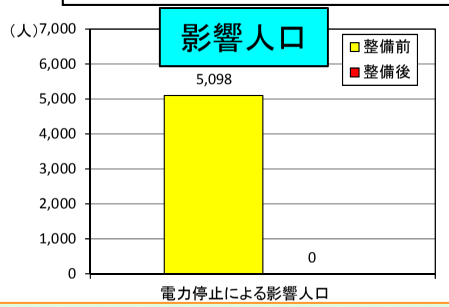

浸水面積

整備前	1,339ha
整備後	327ha

注意：1/30確率の場合の被害想定

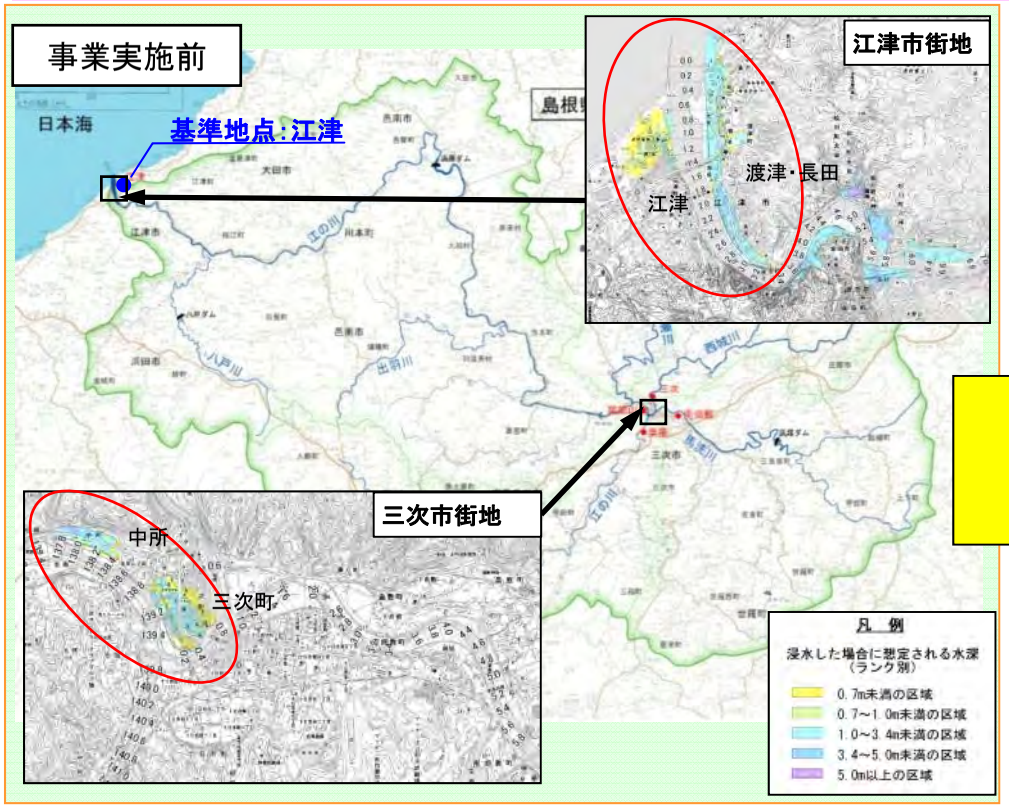

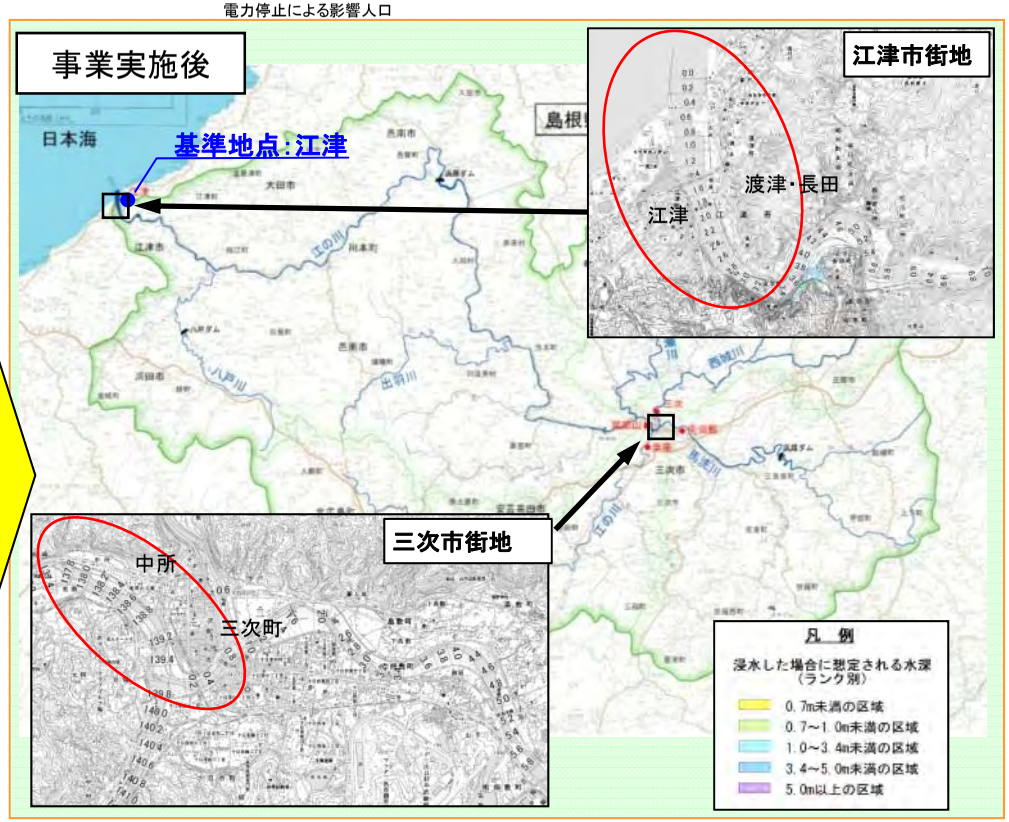

今後の対応方針

国土交通省

①事業の必要性等の視点

1)事業を巡る社会経済情勢等の変化

○江の川流域において、昭和47年、昭和58年、平成11年、平成18年、平成22年に洪水被害を受けており、改修の要望が強い

2)事業の投資効果

○当面６年間で実施を予定している事業の費用便益比（B/C）＝2.3
○江の川直轄河川改修事業（３０年間）の費用便益比（B/C）＝3.8

3)事業の進捗状況

○八神箇所、川平箇所、大貫箇所、川越箇所、都賀西箇所、門田箇所は現在事業中であり、早期完成への要望は強い。

②事業の進捗の見込み

○本事業は地域住民からも要望があることから、円滑な事業進捗が見込まれる。
○八神箇所、川平箇所、大貫箇所、川越箇所、都賀西箇所、門田箇所については着手しており、順調に進捗している。

③コスト縮減や代替案立案等の可能性

○新技術・新工法を活用するとともに、河道掘削等により発生した土砂を築堤盛土に有効活用し、コスト縮減に努める。

④対応方針

○江の川水系河川整備計画に基づき、**事業実施することは妥当**と考える。

江の川直轄河川改修事業の費用対効果分析（感度分析）

国土交通省

◆残事業費、残工期、資産を個別に±10%変動させて、費用便益比（B/C）を算定し、感度分析を行った。

	江の川直轄河川改修事業の費用便益比（B／C）						
	基本	残事業費		残工期		資産	
		+10%	−10%	+10%	−10%	+10%	−10%
全体事業	3.8	3.50	4.24	3.84	3.83	4.23	3.50
当面6年間の事業	2.3	2.09	2.54	2.30	2.30	2.51	2.08

江の川直轄河川改修事業
[費用便益比(B／C)算定等資料]

様式－1　氾濫ブロック分割図（1／4）

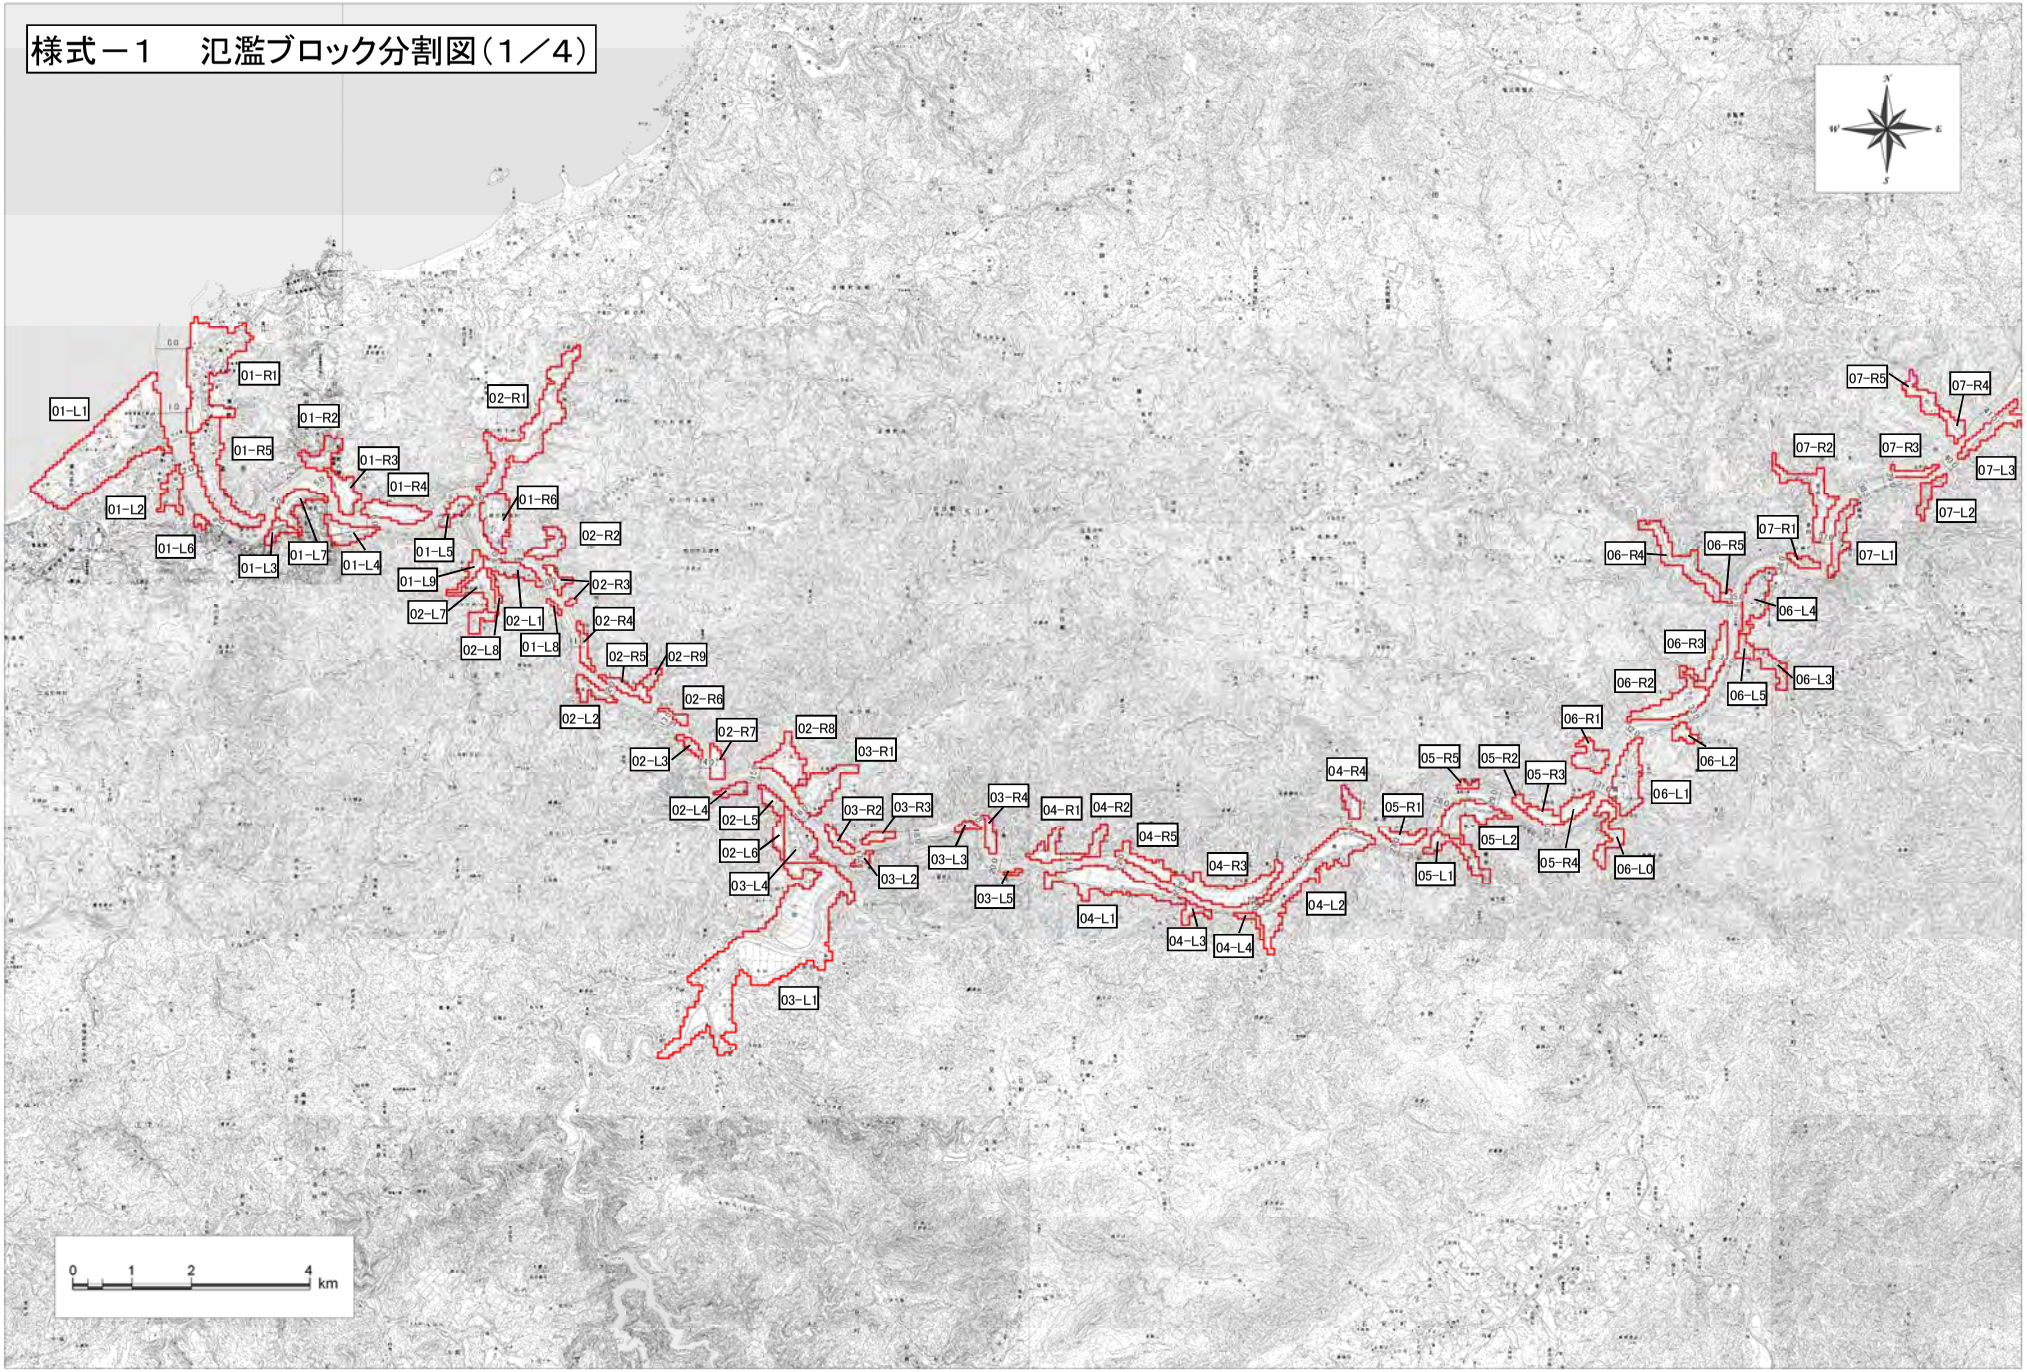

様式－1　氾濫ブロック分割図（2／4）

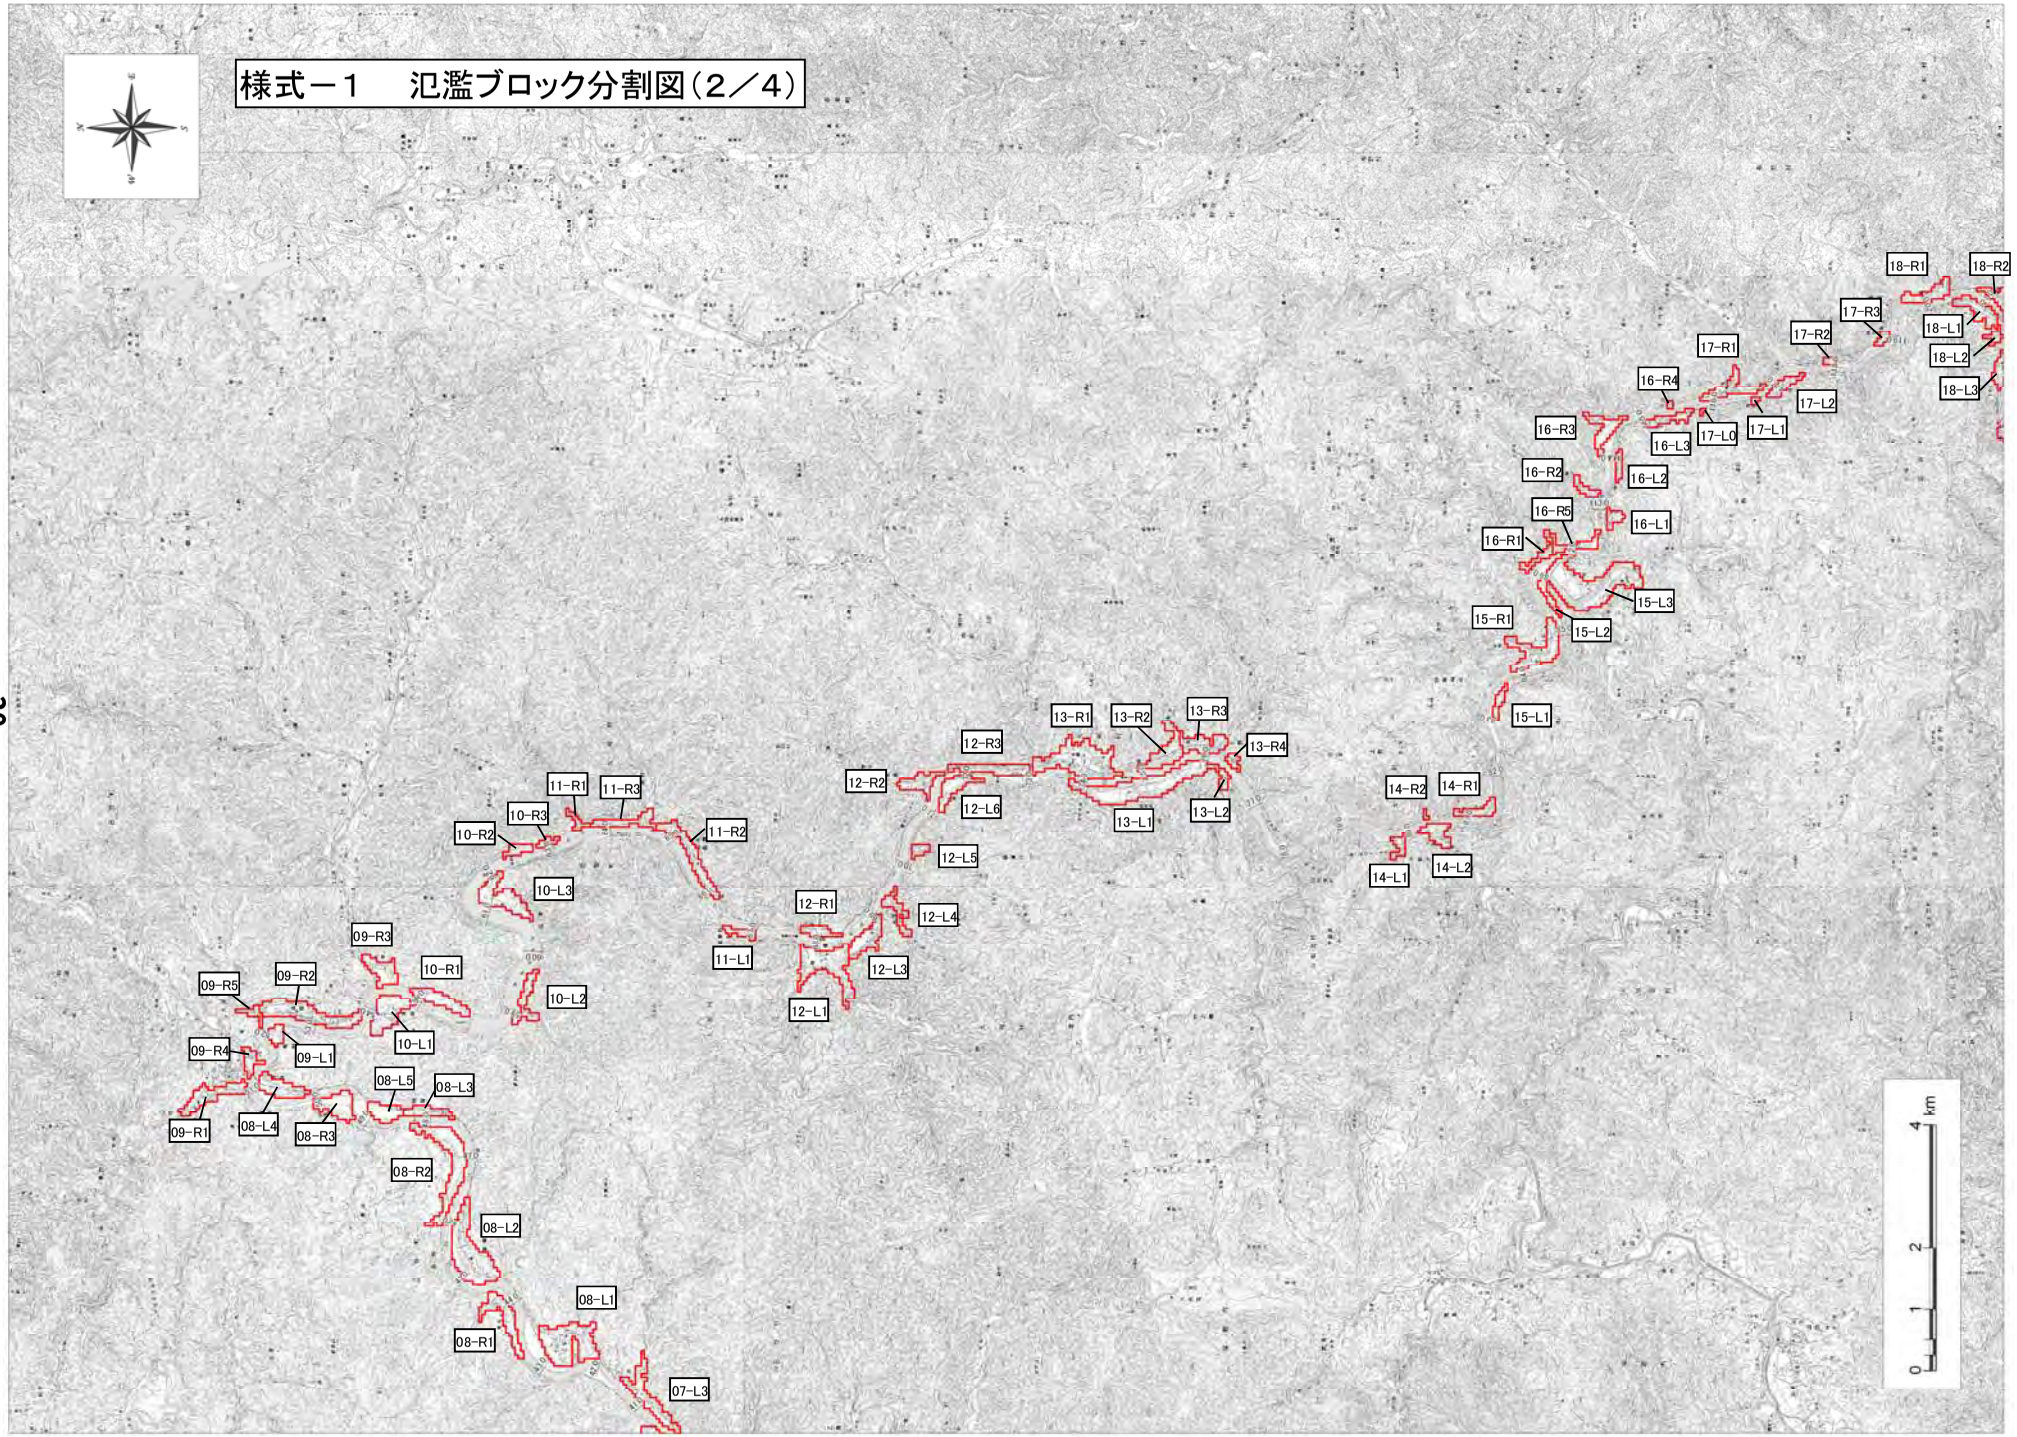

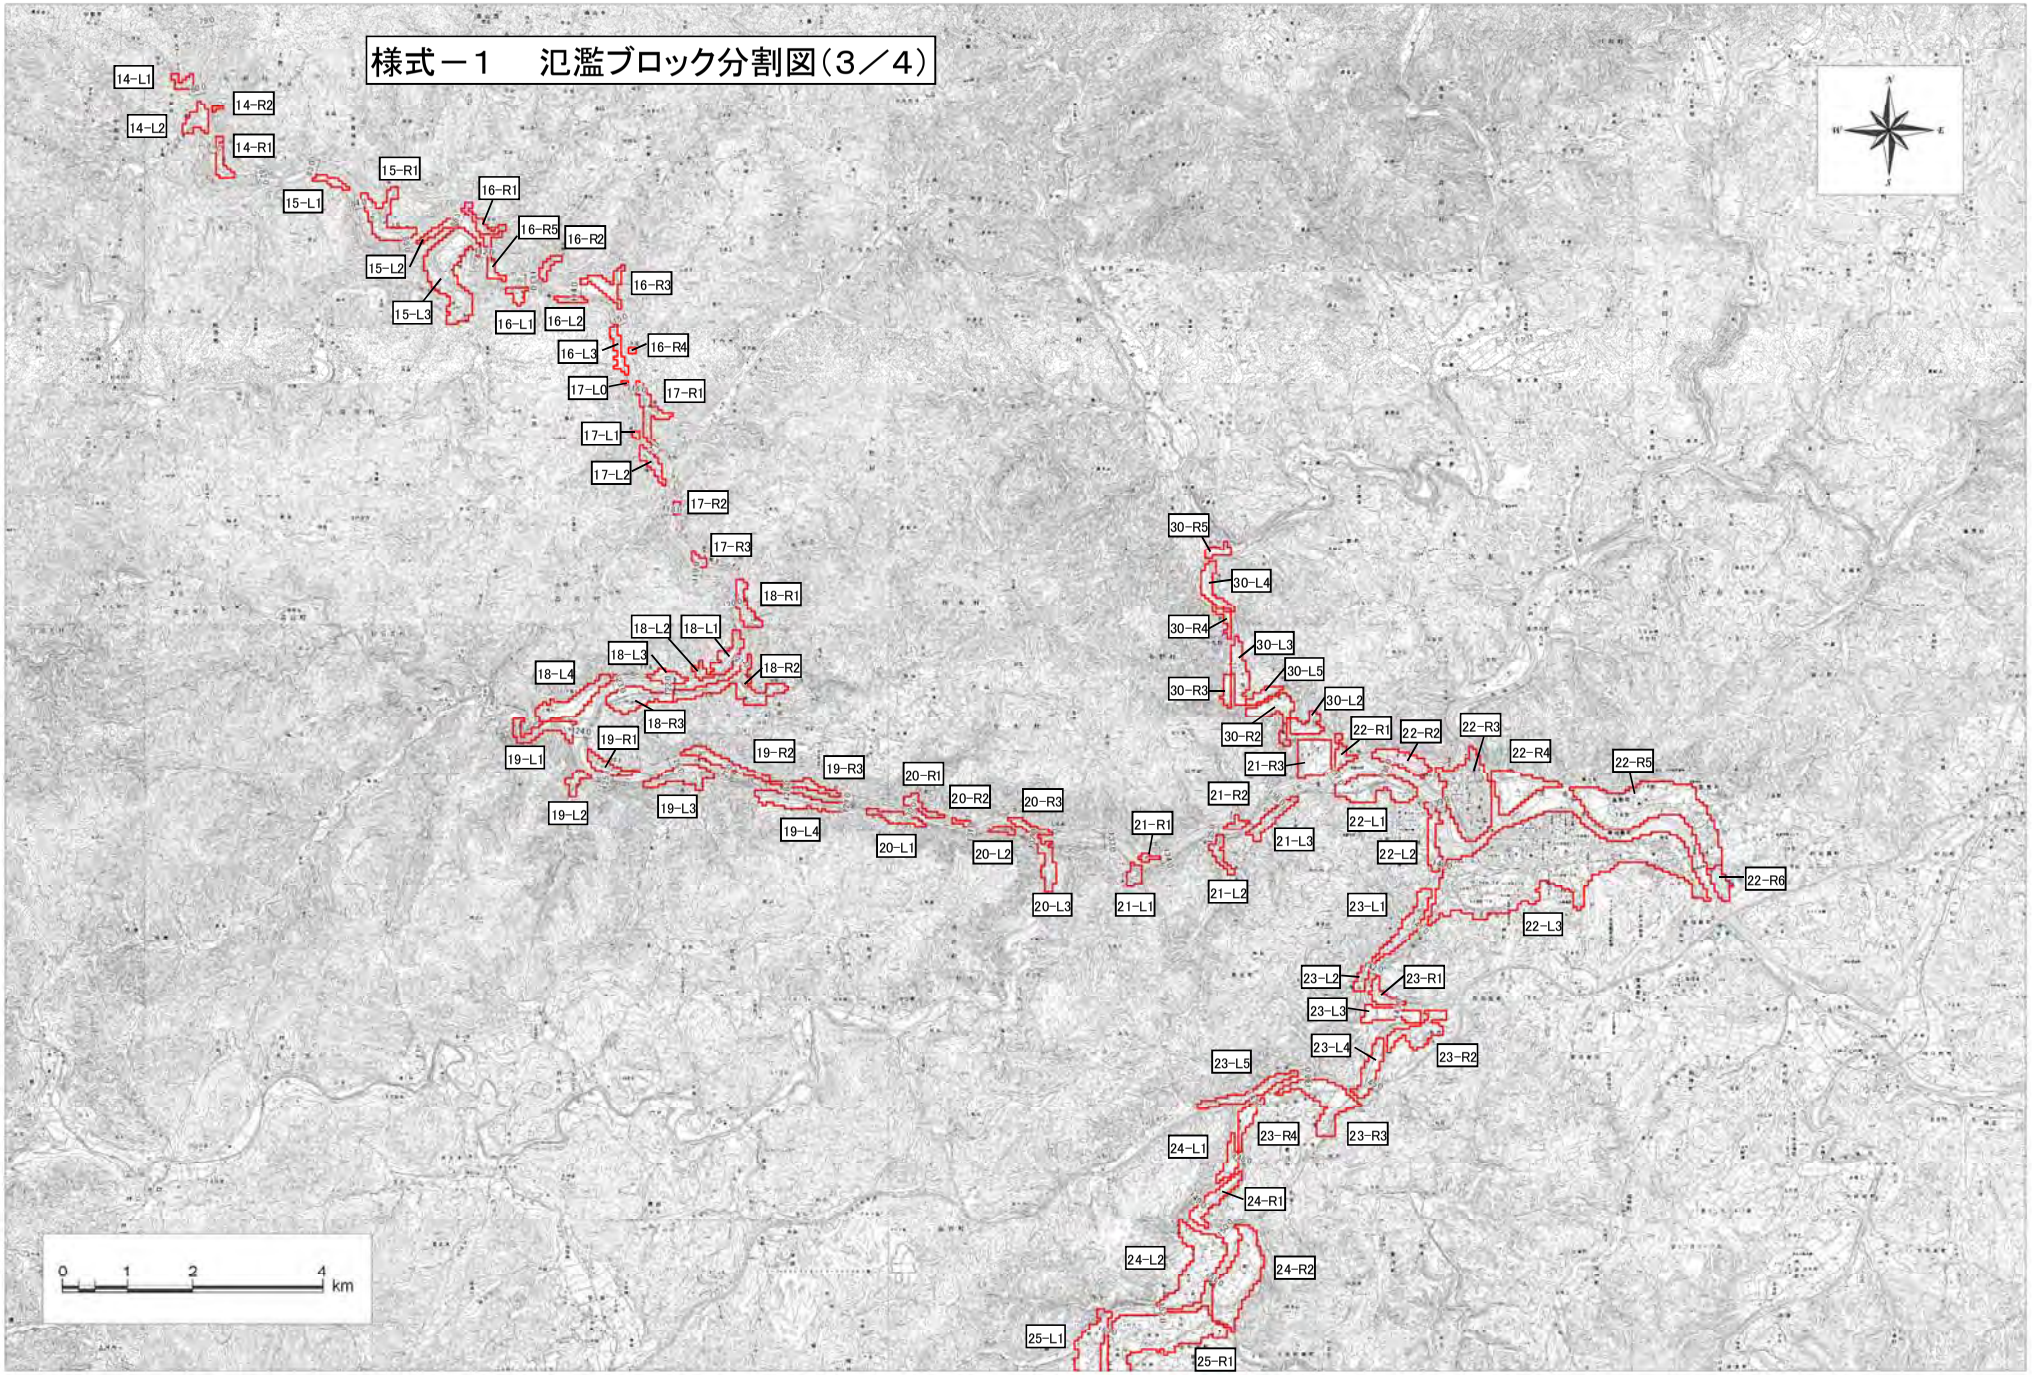
様式－1　氾濫ブロック分割図（3／4）
14-L1
14-R2
14-L2
14-R1
15-R1
15-L1
16-R1
16-R5
16-R2
15-L2
16-R3
15-L3
16-L1
16-L2
16-L3
16-R4
17-L0
17-R1
17-L1
17-L2
17-R2
17-R3
18-R1
18-L2
18-L1
18-L3
18-R2
18-L4
18-R3
19-R1
19-L1
19-R2
19-R3
19-L2
19-L3
19-L4
20-R1
20-R2
20-R3
20-L1
20-L2
20-L3
21-R1
21-L1
30-R5
30-L4
30-R4
30-L3
30-L5
30-R3
30-L2
30-R2
22-R1
22-R2
22-R3
22-R4
22-R5
21-R3
21-R2
22-L1
21-L3
22-L2
22-R6
21-L2
23-L1
22-L3
23-L2
23-R1
23-L3
23-L4
23-R2
23-L5
23-R4
23-R3
24-L1
24-R1
24-L2
24-R2
25-L1
25-R1
0
1
2
4
km

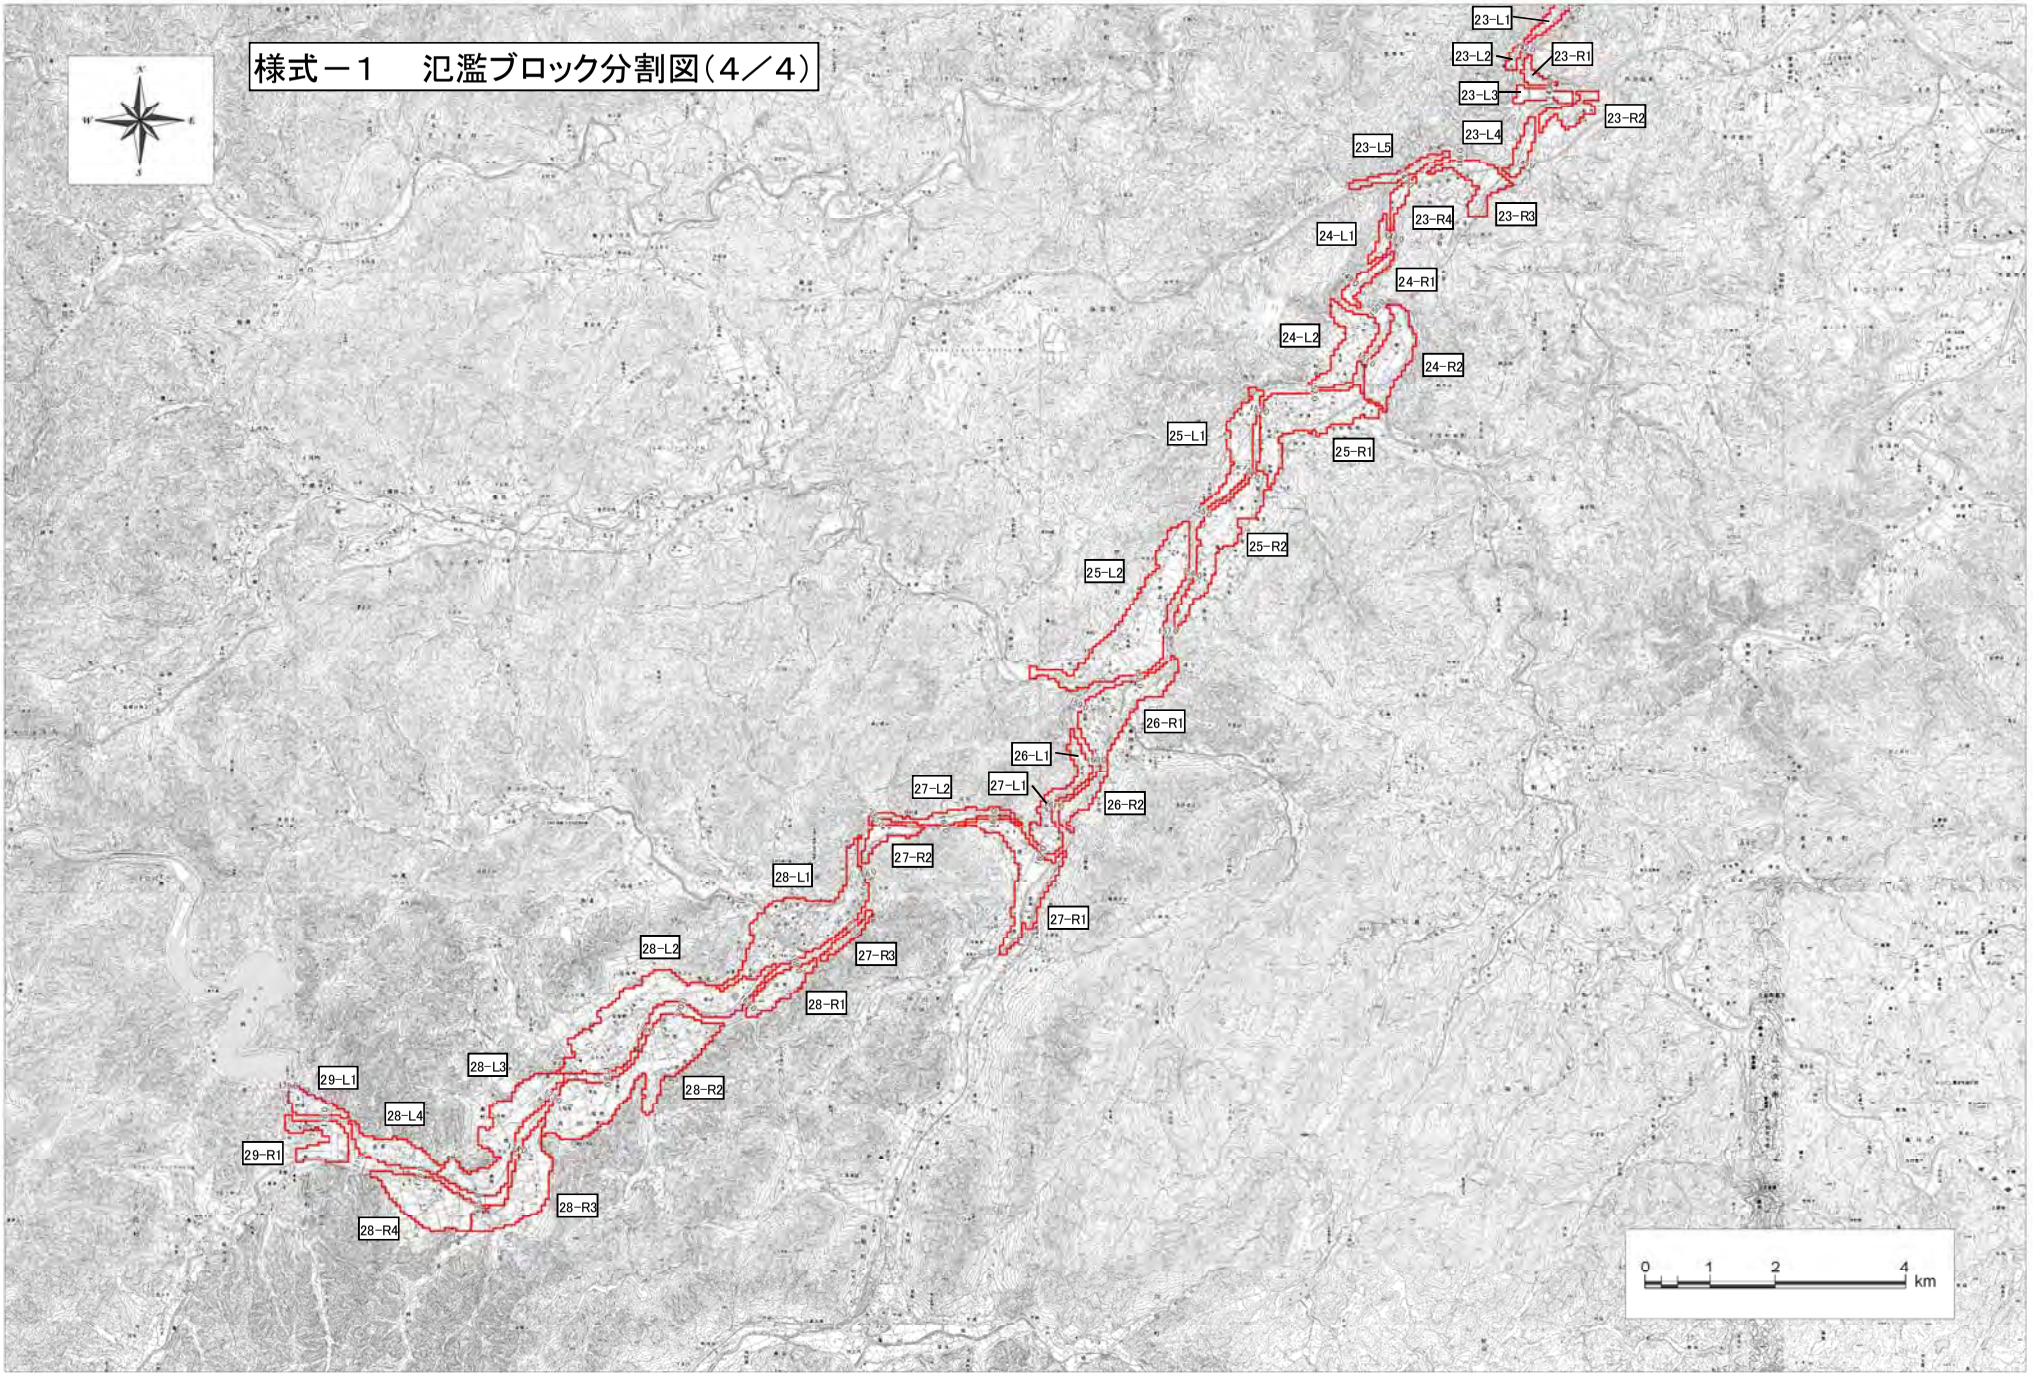
様式－１　氾濫ブロック分割図（４／４）
23-L1
23-L2
23-R1
23-L3
23-R2
23-L4
23-L5
23-R4
23-R3
24-L1
24-R1
24-L2
24-R2
25-L1
25-R1
25-R2
25-L2
26-R1
26-L1
27-L2
27-L1
26-R2
27-R2
28-L1
27-R1
28-L2
27-R3
28-R1
28-L3
29-L1
28-R2
28-L4
29-R1
28-R3
28-R4
0
1
2
4
km

様式－2　資産データ　水系名：江の川　河川名：江の川　国勢調査年：H22年　経済センサス調査年：H24年

氾濫ブロック番号	ブロック面積(km²)	一般資産等基礎数量							一般資産額（千円）							農作物資産額（千円）			一般資産額等合計（千円）
		人口（人）	世帯数（世帯）	従業者数（人）	農漁家数（世帯）	延床面積（㎡）	水田面積（ha）	畑面積（ha）	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	
											償却資産	在庫資産	償却資産	在庫資産					
01−L1	1.768	2,646	971	2,117	16	247,316	0	9	41,944,804	13,594,328	5,288,265	2,916,649	31,352	7,144	63,782,542	0	17,314	17,314	63,799,856
01−L2	0.166	211	96	28	2	11,940	0	0	2,025,075	1,338,017	123,331	46,249	3,361	766	3,536,799	0	0	0	3,536,799
01−L6	0.032	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	983	0	983	983
01−L3	0.092	15	6	0	0	725	1	0	123,028	84,042	0	0	372	85	207,526	929	0	929	208,455
01−L7	0.206	50	20	58	1	2,418	1	4	410,093	280,140	62,034	35,419	1,604	365	789,655	1,475	7,336	8,811	798,466
01−L4	0.193	32	13	17	1	1,572	2	2	266,560	182,091	17,493	5,049	2,328	530	474,052	2,622	4,603	7,225	481,277
01−L5	0.103	10	4	0	2	484	0	2	82,019	56,028	0	0	4,538	1,034	143,618	0	3,868	3,868	147,486
01−R1	0.926	968	321	682	6	99,822	0	0	16,929,813	4,500,132	1,920,280	1,358,592	11,326	2,581	24,722,723	0	0	0	24,722,723
01−R5	0.625	878	357	208	9	51,297	0	4	8,699,932	5,005,631	1,083,247	333,519	17,552	3,999	15,143,879	0	8,439	8,439	15,152,318
01−R2	0.174	60	24	7	1	2,902	4	0	492,111	336,168	9,555	20,272	1,218	278	859,602	4,915	0	4,915	864,517
01−R3	0.198	47	19	22	1	2,297	9	1	389,588	266,133	26,788	14,219	2,230	508	699,466	10,814	2,302	13,116	712,582
01−R4	0.230	52	21	41	0	2,539	7	3	430,597	294,147	82,517	27,527	414	94	835,297	9,176	6,329	15,505	850,802
02−L1	0.166	92	37	81	5	4,473	0	4	758,672	518,259	107,363	53,737	8,883	2,024	1,448,937	0	8,308	8,308	1,457,245
01−L8	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02−L2	0.121	10	4	0	0	484	1	1	82,019	56,028	0	0	225	51	138,323	1,311	2,110	3,421	141,744
02−L3	0.058	10	4	0	0	484	0	1	82,019	56,028	0	0	0	0	138,047	0	1,187	1,187	139,234
02−L4	0.069	7	3	0	0	363	0	0	61,514	42,021	0	0	0	0	103,535	0	0	0	103,535
01−L9	0.087	60	24	0	2	2,902	2	1	492,111	336,168	0	0	3,283	748	832,310	1,912	1,055	2,967	835,277
02−L7	0.177	30	12	82	3	1,451	6	0	246,056	168,084	217,876	178,954	5,600	1,276	817,846	7,155	0	7,155	825,001
02−L8	0.045	27	11	0	1	1,330	0	0	225,551	154,077	0	0	2,221	506	382,355	574	0	574	382,929
02−L9	0.100	2	1	0	0	121	4	0	20,505	14,007	0	0	97	22	34,630	5,435	0	5,435	40,065
02−R1	0.842	144	58	125	8	7,012	27	0	1,189,269	812,406	136,799	72,886	15,863	3,615	2,230,838	33,420	0	33,420	2,264,258
01−R6	0.311	94	41	22	7	7,887	4	4	1,337,635	573,574	34,212	13,839	12,745	2,904	1,974,908	5,243	8,439	13,682	1,988,590
02−R2	0.150	2	1	22	0	121	0	0	20,505	14,007	28,930	2,728	429	98	66,697	0	0	0	66,697
02−R3	0.095	12	5	0	0	605	1	1	102,523	70,035	0	0	0	0	172,558	983	1,055	2,038	174,596
02−R4	0.087	15	6	17	0	725	0	0	123,028	84,042	17,493	5,049	0	0	229,612	0	0	0	229,612
02−R5	0.113	37	15	56	1	1,814	1	3	307,570	210,105	190,802	171,162	966	220	880,824	1,311	5,804	7,115	887,939
02−R9	0.055	10	4	0	0	484	1	0	82,019	56,028	0	0	386	88	138,521	1,311	0	1,311	139,832
02−R6	0.050	10	4	0	0	484	0	0	82,019	56,028	0	0	0	0	138,047	0	0	0	138,047
02−R7	0.106	10	4	0	0	484	1	2	82,019	56,028	0	0	0	0	138,047	1,311	4,749	6,060	144,107
02−R8	0.293	110	44	72	5	5,320	4	1	902,204	616,308	207,266	175,914	9,186	2,093	1,912,971	4,842	2,111	6,952	1,919,923
02−L6	0.084	11	5	13	0	1,433	0	2	243,037	66,496	20,287	24,977	675	154	355,626	0	4,777	4,777	360,403
03−L4	0.319	159	67	105	4	14,579	0	3	2,472,598	942,656	203,620	178,390	7,734	1,762	3,806,760	0	6,888	6,888	3,813,648
03−L1	2.743	814	312	338	39	78,735	59	20	13,353,530	4,369,095	772,654	719,255	74,402	16,953	19,305,889	73,703	40,113	113,816	19,419,705
02−L5	0.092	7	3	0	0	363	0	3	61,514	42,021	0	0	0	0	103,535	0	4,999	4,999	108,534
03−L2	0.037	2	1	0	0	121	0	0	20,505	14,007	0	0	0	0	34,512	0	0	0	34,512
03−L3	0.045	2	1	0	0	121	0	0	20,505	14,007	0	0	0	0	34,512	0	0	0	34,512
03−R1	0.348	221	87	122	8	12,726	3	5	2,158,296	1,215,841	719,174	135,319	15,843	3,610	4,248,083	3,442	9,665	13,107	4,261,190
03−R2	0.079	10	4	60	1	484	0	2	82,019	56,028	143,131	136,333	1,560	356	419,427	0	4,221	4,221	423,648
03−R3	0.061	12	5	0	0	605	0	0	102,523	70,035	0	0	322	73	172,953	0	0	0	172,953
03−R4	0.082	15	6	7	1	725	1	0	123,028	84,042	9,555	20,272	1,931	440	239,268	1,311	0	1,311	240,579
03−L5	0.016	2	1	0	0	121	0	0	20,505	14,007	0	0	0	0	34,512	0	0	0	34,512
04−L1	0.589	115	46	9	4	5,561	1	21	943,213	644,322	9,261	2,673	8,689	1,980	1,610,139	1,311	42,703	44,015	1,654,154
04−L3	0.077	5	2	5	0	242	0	0	41,009	28,014	5,145	1,485	0	0	75,653	0	0	0	75,653
04−L4	0.029	12	5	39	0	605	0	1	102,523	70,035	46,423	7,777	0	0	226,758	0	1,055	1,055	227,813
04−L2	0.768	229	92	242	7	11,123	7	5	1,886,427	1,288,644	275,174	90,063	13,996	3,189	3,557,493	9,180	10,554	19,734	3,577,227
04−R1	0.153	20	8	17	2	967	0	1	164,037	112,056	84,082	82,314	3,379	770	446,638	0	2,598	2,598	449,236
04−R2	0.084	62	25	7	2	3,023	0	1	512,616	350,175	9,555	20,272	4,359	993	897,970	0	2,273	2,273	900,243
04−R5	0.174	40	16	34	2	1,934	0	5	328,074	224,112	34,986	10,098	4,506	1,027	602,803	0	10,202	10,202	613,005
04−R3	0.465	102	41	120	3	4,957	1	1	840,690	574,287	145,004	43,538	5,064	1,154	1,609,738	1,311	1,759	3,070	1,612,808
04−R4	0.087	22	9	0	2	1,088	2	0	184,542	126,063	0	0	2,897	660	314,161	2,622	0	2,622	316,783
05−L1	0.198	15	6	0	0	725	0	2	123,028	84,042	0	0	373	85	207,528	0	3,430	3,430	210,958
05−L2	0.301	115	46	68	2	5,561	0	4	943,213	644,322	69,972	20,196	3,381	770	1,681,854	0	7,958	7,958	1,689,812
05−R1	0.111	17	7	17	1	846	0	0	143,532	98,049	17,493	5,049	1,193	272	265,588	0	0	0	265,588
05−R2	0.037	2	1	4	0	121	0	0	20,505	14,007	4,116	1,188	361	82	40,259	0	704	704	40,963
05−R3	0.100	42	17	0	2	2,055	1	2	348,579	238,119	0	0	3,850	877	591,425	1,311	4,690	6,001	597,426
05−R4	0.119	46	20	28	1	2,376	0	2	403,004	280,140	54,666	53,779	2,521	574	794,684	0	4,448	4,448	799,132
05−R5	0.032	7	3	20	0	363	0	0	61,514	42,021	24,730	13,625	0	0	141,890	0	0	0	141,890
06−L1	0.375	488	167	416	12	35,137	3	1	5,959,299	2,344,878	775,105	403,366	23,281	5,305	9,511,234	3,933	936	4,869	9,516,103
06−L0	0.195	41	14	41	1	6,091	2	2	1,032,991	200,348	107,156	80,031	2,505	571	1,423,602	2,213	2,808	5,021	1,428,623

様式－2　資産データ　水系名：江の川　河川名：江の川　国勢調査年：H22年　経済センサス調査年：H24年

氾濫ブロック番号	ブロック面積(km²)	一般資産等基礎数量							一般資産額（千円）							農作物資産額（千円）			一般資産額等合計（千円）
		人口（人）	世帯数（世帯）	従業者数（人）	農漁家数（世帯）	延床面積（㎡）	水田面積（ha）	畑面積（ha）	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	
											償却資産	在庫資産	償却資産	在庫資産					
06-L2	0.079	28	12	45	1	1,424	1	0	241,578	168,084	69,807	40,635	1,738	396	522,238	656	0	656	522,894
06-L5	0.074	67	29	190	1	3,442	0	0	583,814	406,203	223,716	120,086	1,004	229	1,335,051	0	0	0	1,335,051
06-L3	0.145	148	64	72	2	7,597	1	0	1,288,417	896,448	170,808	126,972	4,638	1,057	2,488,340	655	0	655	2,488,995
06-L4	0.285	564	206	442	3	23,919	0	0	4,056,677	2,880,318	790,806	431,215	5,317	1,211	8,165,544	0	0	0	8,165,544
06-R1	0.182	37	16	41	0	1,899	1	0	322,104	224,112	47,861	36,518	617	141	631,353	1,311	0	1,311	632,664
06-R2	0.364	122	53	233	3	6,291	1	1	1,066,971	742,371	305,495	199,028	6,555	1,494	2,321,914	983	2,573	3,556	2,325,470
06-R3	0.206	79	34	95	1	4,036	4	0	684,472	476,238	121,257	55,485	1,459	332	1,339,243	4,588	312	4,900	1,344,143
06-R5	0.029	2	1	0	0	119	0	0	20,132	14,007	0	0	50	11	34,200	0	0	0	34,200
06-R4	0.343	44	19	80	1	2,255	4	1	382,499	266,133	92,624	21,060	1,682	383	764,381	4,915	1,403	6,318	770,699
07-L1	0.190	120	52	136	3	6,172	1	0	1,046,839	728,364	144,648	76,778	4,985	1,136	2,002,750	1,310	0	1,310	2,004,060
07-L2	0.111	2	1	6	0	119	0	0	20,132	14,007	29,676	29,052	0	0	92,867	0	0	0	92,867
07-L3	0.253	22	9	0	0	1,221	3	3	207,132	126,063	0	0	643	147	333,985	3,112	7,067	10,179	344,164
07-R1	0.069	46	20	129	5	2,374	0	0	402,630	280,140	147,739	65,169	9,799	2,233	907,710	0	0	0	907,710
07-R2	0.319	35	15	21	0	1,780	3	0	301,973	210,105	45,111	33,507	0	0	590,696	3,604	0	3,604	594,300
07-R3	0.074	12	5	0	0	679	0	0	115,074	70,035	0	0	0	0	185,109	0	0	0	185,109
07-R4	0.103	10	4	2	0	543	2	1	92,059	56,028	2,058	594	0	0	150,739	1,965	2,748	4,714	155,453
07-R5	0.148	20	8	0	1	1,086	7	0	184,118	112,056	0	0	1,851	422	298,446	8,844	0	8,844	307,290
08-L1	0.435	203	82	57	5	11,127	6	8	1,887,207	1,148,574	1,152,071	100,943	10,307	2,349	4,301,451	6,878	21,982	28,860	4,330,311
08-L2	0.472	174	70	56	6	9,499	8	3	1,611,030	980,490	1,146,062	91,424	12,398	2,825	3,844,230	10,479	8,166	18,645	3,862,875
08-L3	0.103	40	16	18	1	2,171	2	2	368,236	224,112	1,135,608	95,706	2,262	516	1,826,439	2,096	4,579	6,674	1,833,113
08-L5	0.132	5	2	17	0	271	1	0	46,029	28,014	20,181	25,841	0	0	120,065	1,310	0	1,310	121,375
08-L4	0.171	42	17	18	0	2,307	2	2	391,250	238,119	18,522	5,346	0	0	653,237	2,619	6,081	8,700	661,937
08-R1	0.203	87	35	36	6	4,749	1	1	805,515	490,245	37,044	10,692	10,779	2,456	1,356,732	1,310	1,374	2,684	1,359,416
08-R2	0.395	40	16	27	3	2,171	4	5	368,236	224,112	27,783	8,019	6,727	1,533	636,410	4,826	12,057	16,883	653,293
08-R3	0.190	64	26	18	3	3,528	2	2	598,383	364,182	18,522	5,346	5,129	1,169	992,730	2,619	4,978	7,597	1,000,327
09-L1	0.061	30	13	16	1	2,397	0	1	406,465	183,787	45,674	30,338	1,930	440	668,633	327	1,765	2,093	670,726
09-R1	0.203	42	17	38	3	2,307	9	0	391,250	238,119	1,158,876	122,438	5,576	1,270	1,917,530	10,967	0	10,967	1,928,497
09-R4	0.082	27	11	16	3	1,493	3	0	253,162	154,077	50,488	61,904	6,020	1,372	527,022	3,601	0	3,601	530,623
09-R5	0.047	2	1	8	0	136	1	0	23,015	14,007	39,568	38,736	0	0	115,326	655	0	655	115,981
09-R2	0.343	322	130	225	9	17,641	6	1	2,991,914	1,820,910	1,459,781	414,600	18,089	4,122	6,709,416	7,202	2,060	9,261	6,718,677
10-L1	0.216	10	4	0	2	543	2	6	92,059	56,028	0	0	3,883	885	152,855	1,964	15,232	17,196	170,051
09-R3	0.153	55	22	38	1	2,985	4	0	506,324	308,154	106,590	74,390	1,810	412	997,680	5,565	0	5,565	1,003,245
10-L2	0.129	18	8	3	2	1,866	2	0	316,389	116,725	12,365	12,105	3,540	807	461,930	2,374	0	2,374	464,304
10-L3	0.256	64	26	11	2	3,528	1	7	598,383	364,182	11,319	3,267	3,652	832	981,635	1,310	17,171	18,481	1,000,116
10-R1	0.166	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310	0	1,310	1,310
10-R2	0.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R3	0.034	5	2	0	0	271	0	0	46,029	28,014	0	0	0	0	74,043	0	0	0	74,043
11-L1	0.058	11	5	0	1	575	0	0	97,520	70,035	0	0	1,931	440	169,926	0	0	0	169,926
11-R1	0.042	5	2	0	0	271	0	0	46,029	28,014	0	0	0	0	74,043	0	0	0	74,043
11-R3	0.132	47	19	37	4	2,578	0	0	437,280	266,133	1,129,001	90,392	7,524	1,714	1,932,044	0	0	0	1,932,044
11-R2	0.232	62	17	57	1	6,897	0	0	1,169,731	240,172	80,213	32,713	1,325	302	1,524,456	0	0	0	1,524,456
12-L1	0.377	114	46	94	4	6,242	5	0	1,058,677	644,322	217,066	65,510	7,576	1,726	1,994,878	5,799	0	5,799	2,000,677
12-L3	0.166	25	10	13	1	1,357	3	0	230,147	140,070	16,065	24,653	1,416	323	412,674	3,604	0	3,604	416,278
12-L4	0.111	4	2	0	0	862	0	0	146,195	30,801	0	0	386	88	177,470	328	0	328	177,798
12-L5	0.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524	0	524	524
12-L6	0.140	22	9	12	2	1,221	7	1	207,132	126,063	14,430	3,189	4,508	1,027	356,350	8,258	1,375	9,633	365,983
12-R1	0.079	7	3	0	0	407	0	0	69,044	42,021	0	0	0	0	111,065	0	0	0	111,065
12-R2	0.135	37	15	18	2	2,035	8	0	345,221	210,105	18,522	5,346	4,827	1,100	585,121	9,830	0	9,830	594,951
12-R3	0.166	42	17	18	2	2,307	1	0	391,250	238,119	23,700	30,749	4,484	1,022	689,324	834	0	834	690,158
13-L1	0.573	263	106	214	3	14,384	15	3	2,439,560	1,484,742	345,828	261,837	6,409	1,460	4,539,837	18,855	8,479	27,334	4,567,171
13-L2	0.045	7	3	0	0	407	3	0	69,044	42,021	0	0	161	37	111,263	3,606	0	3,606	114,869
13-R1	0.483	340	137	239	10	18,591	16	0	3,153,017	1,918,959	306,567	183,393	18,783	4,280	5,584,998	19,797	0	19,797	5,604,795
13-R2	0.201	92	37	42	1	5,021	4	1	851,545	518,259	50,344	21,335	1,869	426	1,443,777	5,053	1,834	6,887	1,450,664
13-R3	0.164	62	25	14	1	3,392	8	0	575,368	350,175	14,406	4,158	1,114	254	945,475	10,014	0	10,014	955,489
13-R4	0.040	2	1	0	0	502	2	0	85,182	13,414	86	25	80	18	98,805	2,295	0	2,295	101,100
14-L1	0.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L2	0.121	52	20	22	1	2,565	6	0	442,958	280,140	108,812	106,524	1,613	367	940,414	8,088	0	8,088	948,502
14-R1	0.092	16	6	18	1	758	0	0	131,431	84,042	18,522	5,346	1,273	290	240,904	0	0	0	240,904
14-R2	0.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L1	0.053	3	1	0	0	126	0	0	21,905	14,007	0	0	0	0	35,912	0	736	736	36,648

様式－2　資産データ　水系名：江の川　河川名：江の川　国勢調査年：H22年　経済センサス調査年：H24年

氾濫ブロック番号	ブロック面積(km²)	一般資産等基礎数量							一般資産額（千円）							農作物資産額（千円）			一般資産額等合計（千円）
		人口（人）	世帯数（世帯）	従業者数（人）	農漁家数（世帯）	延床面積（㎡）	水田面積（ha）	畑面積（ha）	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	
											償却資産	在庫資産	償却資産	在庫資産					
15−L2	0.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15−L3	0.650	115	44	162	8	5,562	19	0	963,825	616,308	184,722	128,934	15,927	3,629	1,913,345	23,536	0	23,536	1,936,881
15−R1	0.277	63	24	83	6	3,034	3	0	525,723	336,168	225,855	74,289	10,888	2,481	1,175,404	3,985	0	3,985	1,179,389
16−L1	0.055	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2,109	0	2,109	2,109
16−L2	0.042	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	984	0	984	984
16−L3	0.090	14	8	0	0	2,865	3	0	496,461	110,305	0	0	0	0	606,766	3,371	0	3,371	610,137
16−R1	0.087	68	26	93	3	3,286	1	0	569,533	364,182	100,933	36,899	4,828	1,100	1,077,475	1,573	0	1,573	1,079,048
16−R5	0.095	37	14	29	0	1,770	0	0	306,672	196,098	36,837	33,429	0	0	573,036	0	0	0	573,036
16−R2	0.058	13	5	0	0	632	2	0	109,526	70,035	0	0	0	0	179,561	2,600	0	2,600	182,161
16−R3	0.145	34	13	0	6	1,643	2	0	284,767	182,091	0	0	11,586	2,640	481,084	2,407	0	2,407	483,491
16−R4	0.011	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	674	0	674	674
17−L0	0.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17−L1	0.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17−L2	0.087	16	6	18	0	758	0	0	131,431	84,042	18,522	5,346	927	211	240,479	0	0	0	240,479
17−R1	0.164	144	55	267	2	6,952	0	0	1,204,782	770,385	336,761	153,368	2,935	669	2,468,899	0	0	0	2,468,899
17−R2	0.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17−R3	0.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18−L1	0.151	34	13	11	2	1,643	5	2	284,767	182,091	11,319	3,267	3,738	852	486,033	5,795	4,421	10,216	496,249
18−L2	0.045	51	17	4	3	2,429	1	0	420,946	241,617	7,104	2,905	5,422	1,236	679,229	644	737	1,381	680,610
18−L3	0.087	26	10	0	2	1,264	0	0	219,051	140,070	0	0	3,357	765	363,244	598	0	598	363,842
18−L4	0.296	71	27	79	8	3,532	9	0	612,026	378,189	82,971	36,458	15,272	3,480	1,128,397	11,745	737	12,482	1,140,879
18−R1	0.135	13	5	53	2	632	0	0	109,526	70,035	3,854,662	204,741	3,787	863	4,243,613	0	0	0	4,243,613
18−R2	0.349	105	40	110	7	5,056	8	1	876,205	560,280	213,496	136,346	12,922	2,944	1,802,193	10,210	2,947	13,158	1,815,351
18−R3	0.251	76	29	41	4	3,666	2	0	635,248	406,203	49,185	36,993	6,802	1,550	1,135,982	2,667	0	2,667	1,138,649
19−L1	0.174	45	17	64	4	2,155	3	0	373,531	238,119	316,544	309,888	6,780	1,545	1,246,406	4,216	368	4,585	1,250,991
19−L2	0.071	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5,301	0	5,301	5,301
19−L3	0.235	45	17	84	4	2,261	11	0	391,831	238,119	98,566	29,845	7,866	1,792	768,019	14,360	0	14,360	782,379
19−L4	0.241	43	16	21	2	2,128	14	0	368,782	224,112	21,609	6,237	4,027	918	625,685	17,948	0	17,948	643,633
19−R1	0.116	58	22	18	2	11,659	8	0	2,020,418	308,154	18,522	5,346	4,206	958	2,357,605	10,737	0	10,737	2,368,342
19−R2	0.169	66	25	23	3	3,200	5	0	554,491	350,175	27,699	38,019	6,147	1,401	977,932	6,902	0	6,902	984,834
19−R3	0.093	12	6	0	2	1,554	3	0	269,308	84,735	0	0	4,123	939	359,105	3,210	0	3,210	362,315
20−L1	0.111	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	11,132	0	11,132	11,132
20−L2	0.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20−L3	0.153	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,574	0	1,574	1,574
20−R1	0.077	30	15	6	4	1,554	2	1	269,308	210,105	8,190	17,376	7,724	1,760	514,463	2,277	1,295	3,572	518,035
20−R2	0.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20−R3	0.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112
21−L1	0.066	10	4	0	0	506	0	0	87,620	56,028	0	0	0	0	143,648	0	0	0	143,648
21−L2	0.082	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840	0	1,840	1,840
21−L3	0.143	37	14	28	0	1,770	5	0	306,672	196,098	30,828	23,910	0	0	557,508	6,992	0	6,992	564,500
21−R1	0.026	3	1	22	0	126	0	0	21,905	14,007	108,812	106,524	0	0	251,248	0	0	0	251,248
21−R2	0.042	3	1	0	0	126	0	0	21,905	14,007	0	0	0	0	35,912	0	0	0	35,912
21−R3	0.285	92	35	60	1	4,424	16	0	766,679	490,245	63,756	33,414	2,414	550	1,357,058	20,237	0	20,237	1,377,295
22−L1	0.381	79	30	163	8	3,792	17	0	657,154	420,210	276,905	238,443	16,078	3,664	1,612,453	21,479	737	22,216	1,634,669
22−L2	0.159	86	33	161	1	4,171	1	0	722,869	462,231	261,399	154,261	2,516	573	1,603,850	1,417	0	1,417	1,605,267
22−L3	3.466	11,612	4,501	7,712	134	1,102,737	47	3	191,104,353	63,043,243	28,738,011	9,944,973	259,657	59,166	293,149,401	60,150	7,075	67,225	293,216,626
22−R1	0.082	21	8	55	0	1,011	0	0	175,241	112,056	142,769	116,325	322	73	546,786	0	0	0	546,786
22−R2	0.193	241	92	100	5	11,629	0	0	2,015,271	1,288,644	423,790	291,282	10,479	2,388	4,031,854	0	0	0	4,031,854
22−R3	0.764	2,546	1,068	1,171	19	266,556	0	0	46,194,175	14,965,354	2,774,190	1,569,388	35,820	8,162	65,547,089	0	0	0	65,547,089
22−R4	0.373	335	128	400	9	16,179	13	5	2,803,855	1,792,896	4,987,781	1,048,305	17,078	3,891	10,653,806	16,190	14,001	30,191	10,683,997
22−R5	1.263	3,129	1,190	891	45	321,665	30	7	55,744,511	16,671,933	2,027,107	1,264,561	87,279	19,888	75,815,278	38,171	20,632	58,803	75,874,081
22−R6	0.116	286	109	63	2	13,778	5	1	2,387,658	1,526,763	77,309	58,496	3,561	811	4,054,598	6,072	2,211	8,283	4,062,881
23−L1	0.243	165	63	386	5	7,963	9	1	1,380,023	882,441	8,463,254	896,428	10,173	2,318	11,634,636	12,089	2,211	14,301	11,648,937
23−L2	0.063	26	10	22	0	1,264	4	0	219,051	140,070	108,812	106,524	0	0	574,457	5,736	0	5,736	580,193
23−L3	0.161	18	7	66	2	885	4	0	153,336	98,049	245,748	234,551	4,564	1,040	737,288	4,753	0	4,753	742,041
23−L4	0.185	21	8	0	0	6,292	8	0	1,090,344	112,056	0	0	0	0	1,202,400	10,593	0	10,593	1,212,993
23−L5	0.196	37	14	33	3	1,770	8	0	306,672	196,098	120,131	109,791	6,437	1,467	740,595	10,542	0	10,542	751,137
23−R1	0.098	29	11	6	1	1,390	3	1	240,956	154,077	8,190	17,376	1,207	275	422,081	4,049	2,211	6,260	428,341
23−R2	0.251	94	36	114	9	4,550	11	0	788,584	504,252	213,128	83,642	17,335	3,950	1,610,891	14,583	0	14,583	1,625,474
23−R3	0.415	79	30	24	7	3,792	18	0	657,154	420,210	26,712	22,722	14,241	3,245	1,144,284	22,743	0	22,743	1,167,027

様式－2　資産データ　　水系名：江の川　　河川名：江の川　　国勢調査年：H22年　　経済センサス調査年：H24年

氾濫ブロック番号	ブロック面積(km²)	一般資産等基礎数量							一般資産額（千円）							農作物資産額（千円）			一般資産額等合計（千円）
		人口（人）	世帯数（世帯）	従業者数（人）	農漁家数（世帯）	延床面積（㎡）	水田面積（ha）	畑面積（ha）	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	
											償却資産	在庫資産	償却資産	在庫資産					
23-R4	0.114	8	3	0	1	379	6	0	65,715	42,021	0	0	1,448	330	109,515	7,407	0	7,407	116,922
24-L1	0.114	21	8	0	1	1,011	9	0	175,241	112,056	0	0	2,414	550	290,261	11,966	0	11,966	302,227
24-L2	0.622	200	80	63	9	20,849	26	0	3,613,218	1,117,868	154,657	129,741	17,788	4,053	5,037,326	32,861	0	32,861	5,070,187
24-R1	0.177	21	8	11	0	1,011	7	0	175,241	112,056	11,319	3,267	0	0	301,883	8,702	0	8,702	310,585
24-R2	0.675	255	101	100	15	34,447	38	1	5,969,665	1,416,773	251,567	225,811	29,052	6,620	7,899,488	48,949	2,213	51,162	7,950,650
25-L1	0.553	67	24	31	8	9,607	23	0	1,664,936	329,662	69,789	95,326	16,215	3,695	2,179,624	29,660	0	29,660	2,209,284
25-L2	1.818	716	282	412	49	89,113	69	2	15,443,213	3,953,027	1,518,497	1,276,054	94,878	21,619	22,307,288	87,723	4,537	92,261	22,399,549
25-R1	1.167	441	150	111	20	36,649	54	2	6,351,185	2,106,514	184,819	193,998	39,262	8,946	8,884,725	68,443	6,270	74,713	8,959,438
25-R2	0.937	165	57	184	17	23,006	48	5	3,986,928	793,313	520,692	431,949	33,076	7,537	5,773,496	61,599	12,910	74,509	5,848,005
26-R1	0.940	1,150	422	601	32	111,535	52	0	19,328,982	5,917,929	1,286,213	886,361	61,630	14,043	27,495,158	66,084	0	66,084	27,561,242
26-R2	0.233	106	40	22	6	11,229	16	0	1,946,072	565,546	47,680	46,644	10,843	2,471	2,619,256	19,871	0	19,871	2,639,127
26-L1	0.233	101	38	46	3	5,054	4	0	875,858	532,266	132,334	126,779	5,421	1,235	1,673,893	5,313	0	5,313	1,679,206
27-L1	0.257	53	20	40	4	2,660	7	2	460,978	280,140	121,180	115,775	6,969	1,588	986,631	9,047	4,539	13,586	1,000,217
27-L2	0.286	77	29	291	5	3,857	12	2	668,418	406,203	1,016,451	895,518	9,264	2,111	2,997,964	15,253	4,377	19,630	3,017,594
27-R1	0.884	59	22	80	18	2,926	44	0	507,076	308,154	395,680	387,360	34,303	7,816	1,640,389	55,921	0	55,921	1,696,310
27-R2	0.212	82	31	64	2	4,123	5	2	714,516	434,217	74,686	27,678	3,428	781	1,255,306	6,473	3,890	10,363	1,265,669
27-R3	0.127	67	25	17	0	3,325	4	0	576,223	350,175	17,493	5,049	205	47	949,191	5,069	0	5,069	954,260
28-L1	1.610	3,063	1,259	2,520	37	353,259	27	1	61,219,804	17,630,698	6,496,970	3,858,127	71,136	16,209	89,292,944	33,848	1,946	35,794	89,328,738
28-L2	1.904	1,200	401	704	47	140,465	109	4	24,342,628	5,609,925	2,463,761	1,592,808	91,459	20,840	34,121,421	139,404	10,378	149,781	34,271,202
28-L3	1.134	327	128	58	17	39,614	62	2	6,865,020	1,795,890	187,480	173,089	32,624	7,434	9,061,536	78,635	3,893	82,527	9,144,063
28-L4	0.477	144	57	85	5	16,012	14	1	2,774,923	796,738	903,573	466,741	9,887	2,253	4,954,115	18,251	1,298	19,548	4,973,663
28-R1	0.376	266	100	142	12	13,300	23	0	2,304,890	1,400,700	154,458	77,386	22,771	5,189	3,965,394	29,215	0	29,215	3,994,609
28-R2	1.899	784	220	458	33	72,259	142	0	12,522,485	3,083,675	1,967,550	1,598,494	62,911	14,335	19,249,449	180,733	0	180,733	19,430,182
28-R3	0.885	198	77	16	13	27,322	58	2	4,734,903	1,084,520	33,478	34,517	25,234	5,750	5,918,401	74,623	5,191	79,814	5,998,215
28-R4	0.877	478	174	98	25	47,966	38	3	8,312,595	2,439,299	272,279	225,983	49,122	11,193	11,310,470	49,052	6,488	55,540	11,366,010
29-L1	0.238	98	37	83	3	4,921	2	0	852,809	518,259	324,423	250,146	4,907	1,118	1,951,663	3,043	0	3,043	1,954,706
29-R1	0.416	72	27	54	5	3,591	11	1	622,320	378,189	133,906	106,938	9,975	2,273	1,253,602	14,102	2,595	16,697	1,270,299
30-L2	0.116	58	22	46	0	2,781	5	0	481,913	308,154	58,868	75,413	772	176	925,296	6,799	0	6,799	932,095
30-L3	0.196	24	9	124	6	1,138	5	0	197,146	126,063	537,568	365,962	11,593	2,642	1,240,974	6,020	0	6,020	1,246,994
30-L5	0.074	42	16	29	1	2,022	2	0	350,482	224,112	29,841	8,613	2,134	486	615,669	2,276	0	2,276	617,945
30-L4	0.137	29	11	71	4	1,390	6	0	240,956	154,077	249,983	218,299	8,162	1,860	873,337	8,055	0	8,055	881,392
30-R2	0.217	24	9	0	0	1,138	6	2	197,146	126,063	0	0	0	0	323,209	7,150	4,421	11,571	334,780
30-R3	0.058	5	2	0	0	253	1	0	43,810	28,014	0	0	0	0	71,824	1,821	0	1,821	73,645
30-R4	0.053	10	4	0	0	506	0	0	87,620	56,028	0	0	0	0	143,648	0	0	0	143,648
30-R5	0.061	29	9	18	3	2,460	2	1	426,405	120,393	166,372	78,707	5,241	1,194	798,312	2,360	2,947	5,307	803,619
合計	59.699	42,661	16,424	27,484	994	3,793,877	1,573	226	654,318,909	230,057,436	98,556,855	42,213,264	1,919,266	437,326	1,027,503,059	1,996,332	511,240	2,507,569	1,030,010,628

様式－3　　被害額（事業実施前）　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川（平成27年度末河道）　　流量規模：1/5　　①全体事業（H28～H57）　　（千円）

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
01-L1	江津	22,618	6,830	7,386	1,833	11	3	38,681	0	0	0	60,536	3,823	352	676	1,028	998	0	5,849	105,066
01-L2	本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L6	郷田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L3	千金(下流)	4,880	9,133	0	0	51	17	14,080	152	0	152	22,035	0	277	413	690	0	0	690	36,957
01-L7	千金(上流)	6,397	5,239	8,007	3,524	88	29	23,284	227	1,478	1,706	36,439	6,520	323	625	949	2,320	0	9,789	71,218
01-L4	田野村	656	294	0	0	48	17	1,015	0	723	723	1,588	0	42	83	124	0	0	124	3,450
01-L5	赤栗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R1	渡津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R5	長田	413,771	510,041	173,158	29,639	1,456	480	1,128,545	0	2,298	2,298	1,766,173	26,383	19,278	31,539	50,816	28,353	0	105,552	3,002,568
01-R2	太田	19,339	23,095	0	0	154	48	42,635	1,244	0	1,244	66,724	0	837	745	1,581	0	0	1,581	112,184
01-R3	八神(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R4	八神(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L1	川平(本川)	797	357	248	40	29	11	1,482	0	346	346	2,319	299	51	100	151	286	0	736	4,883
01-L8	瀬尻(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L2	瀬尻(上流)	0	0	0	0	0	0	0	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	311
02-L3	小松	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L4	仁万瀬	2,440	4,566	0	0	0	0	7,006	0	0	0	10,964	0	139	207	345	0	0	345	18,315
01-L9	田野Ⅰ	0	0	0	0	0	0	0	40	142	183	0	0	0	0	0	0	0	0	183
02-L7	田野Ⅱ	0	0	0	0	60	18	78	304	0	304	122	0	0	0	0	0	0	0	504
02-L8	川平(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L9	川平(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R1	松川	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R6	松川(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R2	久坪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R3	橿原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R4	中長良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R5	上長良(本川)	4,326	6,597	0	0	101	31	11,056	364	0	364	17,303	0	217	354	571	0	0	571	29,294
02-R9	上長良(支川)	0	0	0	0	8	3	10	121	0	121	16	0	0	0	0	0	0	0	147
02-R6	大口(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R7	大口(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R8	下原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L6	志谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L4	川戸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L1	川戸(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L5	近原	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90
03-L2	猪ノ瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L3	花河原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R1	下原(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R2	臼木(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R3	臼木(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R4	元折	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L5	小原-桜江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-L1	田津	73,427	83,524	407	67	396	128	157,949	121	18,940	19,062	247,190	492	3,366	3,777	7,143	470	0	8,105	432,306
04-L3	恵梨	656	294	0	0	0	0	950	0	0	0	1,487	0	42	83	124	0	0	124	2,561
04-L4	川越(下流)	656	294	1,732	283	0	0	2,965	0	412	412	4,640	2,092	42	83	124	470	0	2,686	10,703
04-L2	川越(上流)	24,605	32,738	14,935	3,124	98	32	75,533	791	1,904	2,695	118,209	8,077	1,272	1,604	2,876	4,560	0	15,513	211,950
04-R1	榎谷	1,886	2,031	0	0	46	14	3,978	0	0	0	6,226	0	78	148	226	0	0	226	10,430
04-R2	久井谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-R5	和田	26,759	34,821	0	0	639	212	62,430	0	1,861	1,861	97,703	0	1,171	1,536	2,707	0	0	2,707	164,701
04-R3	大貫	18,913	21,403	27,265	3,417	644	188	71,831	205	116	321	112,416	12,117	786	855	1,641	6,169	0	19,927	204,495
04-R4	坂本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-L1	鹿賀(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-L2	鹿賀(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R1	渦巻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R2	瀬尻(川本町)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R3	久料谷	8,366	6,121	0	0	303	83	14,872	0	567	567	23,275	0	448	873	1,321	0	0	1,321	40,035
05-R4	尾原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R5	松ヶ崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L1	因原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L0	因原(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L2	日向	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L5	谷(本川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施前)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成27年度末河道)　　流量規模：1/5　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
06-L3	谷(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L4	川本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R1	木谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R2	下三島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R3	上三島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R5	谷戸(本川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	0	470	470
06-R4	谷戸(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-L1	木路原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-L2	銅ヶ丸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-L3	竹	6,122	7,116	0	0	184	57	13,478	883	738	1,621	21,093	0	272	276	548	0	0	548	36,740
07-R1	久座仁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R2	多田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R3	市井原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R4	君谷湊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R5	君谷湊(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L1	乙原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L2	筆瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L3	明塚	0	0	0	0	0	0	0	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	110
08-L5	上明塚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L4	野井	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-R1	栗原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-R2	吾郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-R3	高畑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-L1	亀村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R1	小原(邑智)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R4	狛淵	0	0	0	0	120	38	158	347	0	347	247	0	0	0	0	0	0	0	752
09-R5	浜原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R2	浜原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L1	滝原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R3	本郷	0	0	0	0	72	24	96	445	0	445	150	0	0	0	0	0	0	0	691
10-L2	石見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L3	信喜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R1	浜原ダム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R2	潮下(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R3	潮下(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-L1	都賀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R1	滝下(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R3	潮上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R2	曲利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L1	郷上	0	0	0	0	0	0	0	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	34
12-L3	山根	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L4	高梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L5	大浦(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L6	大浦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-R1	松原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-R2	響谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-R3	原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-L1	都賀西	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-L2	乙谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R1	都賀本郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R2	上野(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R3	上野(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R4	上野(上流Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L1	下郷(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L2	下郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-R1	柳原(作木)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-R2	柳原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L1	引城	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L2	西之原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L3	西之原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-R1	伊賀和志	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L1	坂谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施前)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成27年度末河道)　　流量規模：1/5　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
16-L2	坂谷(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L3	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R1	井手平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R5	大津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R2	折敷谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R3	式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R4	丹渡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L0	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L1	青山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L2	上ヶ畑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R1	港	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R2	熊見下(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R3	熊見下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L1	川根	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L2	川根(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L3	竹貞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L4	梶矢(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R1	熊見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R2	香淀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R3	門田(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L1	梶矢(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L2	林	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L3	式敷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L4	信木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R1	門田(上流)	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	31
19-R2	川毛	0	0	0	0	0	0	0	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	62
19-R3	上組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L1	所木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L2	船佐(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L3	船佐(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R1	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R2	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R3	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L1	下長谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L2	馬行谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L3	下津河内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R1	引字根	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R2	下乙原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R3	日下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L1	荒瀬(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L2	岩脇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L3	十日市・南畑敷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R1	板崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R2	中所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R3	三次町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R4	寺戸桧原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R5	畠敷町(Ⅰ・Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R6	畠敷町(Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L1	中ノ村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L2	亀谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L3	米丸	6,484	4,356	0	0	0	0	10,840	0	0	0	16,965	0	198	378	576	0	0	576	28,381
23-L4	旭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L5	上村	7,513	7,116	0	0	0	0	14,629	294	0	294	22,894	0	272	276	548	0	0	548	38,365
23-R1	大村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R2	船所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R3	青河	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R4	鈴江	0	0	0	0	0	0	0	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	95
24-L1	若屋	0	0	0	0	0	0	0	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	64
24-L2	秋町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-R1	片山	0	0	0	0	0	0	0	442	0	442	0	0	0	0	0	0	0	0	442
24-R2	下志和地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-L1	深瀬	0	0	0	0	181	61	243	785	0	785	380	4,289	1,236	2,036	3,272	2,544	0	10,105	11,513

①全体事業(H28～H57)

様式－3　被害額(事業実施前)　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成27年度末河道)　流量規模：1/5　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
25-L2	甲立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R1	上志和地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R2	川立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R1	高田原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R2	法恩時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-L1	篠原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L1	市ヶ原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L2	高屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R1	下小原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R2	柳原(吉田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R3	国司-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L1	内堀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L2	山手(-常友)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L3	桂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L4	長屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R1	国司-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R2	下入江(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R3	下入江(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R4	上入江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-L1	下土師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-R1	北原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L2	郷川	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L3	中三原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L5	下三原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L4	小松原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-R2	向三原	0	0	0	0	0	0	0	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	188
30-R3	下布野	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-R4	鈩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-R5	河戸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/80区間の合計		13,997	11,472	0	0	181	61	25,712	1,681	0	1,681	40,239	4,289	1,706	2,690	4,396	2,544	0	11,229	78,861
1/100区間の合計		636,617	754,493	233,138	41,927	4,507	1,432	1,672,113	5,981	29,616	35,598	2,616,857	59,804	28,993	43,974	72,967	44,095	0	176,867	4,501,435
合計		650,614	765,965	233,138	41,927	4,688	1,493	1,697,824	7,663	29,616	37,278	2,657,094	64,093	30,699	46,664	77,361	46,639	0	188,093	4,580,289

①全体事業（H28～H57）

様式－3　　被害額（事業実施前）　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川（平成27年度末河道）　　流量規模：1/10　　（千円）

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	小麦・雑作物				清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
01-L1	江津	315,321	99,885	123,449	40,586	224	68	579,533	0	0	0	906,969	53,567	5,380	10,183	15,563	19,772	0	88,902	1,575,404
01-L2	本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L6	郷田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L3	千金(下流)	10,908	14,231	0	0	93	29	25,261	208	0	208	39,533	0	544	552	1,096	0	0	1,096	66,098
01-L7	千金(上流)	30,101	42,651	29,265	16,186	223	79	118,506	332	2,848	3,180	185,462	14,759	1,490	2,116	3,606	9,166	0	27,531	334,679
01-L4	田野村	2,440	4,566	0	0	219	76	7,301	0	1,531	1,531	11,426	0	139	207	345	0	0	345	20,603
01-L5	赤栗	0	0	0	0	270	84	354	0	974	974	554	0	0	0	0	0	0	0	1,882
01-R1	渡津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R5	長田	1,556,779	1,803,718	471,401	109,682	3,983	1,319	3,946,882	0	3,766	3,766	6,176,870	67,253	65,232	64,568	129,800	103,182	0	300,235	10,427,753
01-R2	太田	37,947	36,293	0	0	240	69	74,548	1,405	0	1,405	116,668	0	1,366	1,179	2,545	0	0	2,545	195,166
01-R3	八神(下流)	36,016	44,455	8,418	4,194	653	197	93,933	2,857	495	3,352	147,005	4,405	1,651	1,833	3,484	3,945	0	11,834	256,124
01-R4	八神(上流)	18,173	28,844	44,844	9,912	61	22	101,857	2,518	1,217	3,735	159,406	4,810	952	1,360	2,312	4,614	0	11,736	276,734
02-L1	川平(本川)	12,419	15,172	3,672	712	398	132	32,505	0	1,270	1,270	50,870	1,945	544	541	1,085	3,305	0	6,335	90,980
01-L8	瀬尻(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L2	瀬尻(上流)	5,454	7,116	0	0	20	7	12,597	485	538	1,023	19,714	0	272	276	548	0	0	548	33,882
02-L3	小松	2,440	4,566	0	0	0	0	7,006	0	340	340	10,964	0	139	207	345	0	0	345	18,655
02-L4	仁万瀬	12,549	13,293	0	0	0	0	25,841	0	0	0	40,441	0	484	409	893	0	0	893	67,175
01-L9	田野Ⅰ	36,580	45,607	0	0	470	141	82,798	495	538	1,033	129,579	0	1,837	2,050	3,887	0	0	3,887	217,297
02-L7	田野Ⅱ	2,440	4,566	4,058	646	1,925	533	14,169	1,996	0	1,996	22,174	3,069	139	207	345	925	0	4,339	42,678
02-L8	川平(支川)	37,441	38,267	0	0	1,181	334	77,223	212	0	212	120,854	0	1,458	1,633	3,091	0	0	3,091	201,380
02-L9	川平(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R1	松川	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R6	松川(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R2	久坪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R3	橿原	6,213	8,628	0	0	0	0	14,841	321	135	456	23,226	0	295	502	797	0	0	797	39,320
02-R4	中長良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R5	上長良(本川)	47,899	53,815	4,970	1,332	214	61	108,290	364	538	902	169,474	3,357	1,955	1,695	3,650	6,556	0	13,563	292,229
02-R9	上長良(支川)	0	0	0	0	36	11	46	321	0	321	72	0	0	0	0	0	0	0	439
02-R6	大口(下流)	5,659	6,093	0	0	0	0	11,752	0	0	0	18,392	0	235	443	677	0	0	677	30,821
02-R7	大口(上流)	4,408	5,449	0	0	0	0	9,857	445	2,327	2,772	15,426	0	264	454	718	0	0	718	28,773
02-R8	下原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L6	志谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L4	川戸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L1	川戸(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L5	近原	0	0	0	0	0	0	0	0	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	340
03-L2	猪ノ瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L3	花河原	656	294	0	0	0	0	950	0	0	0	1,487	0	42	83	124	0	0	124	2,561
03-R1	下原(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R2	臼木(下流)	0	0	0	0	57	15	72	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	185
03-R3	臼木(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R4	元折	28,994	26,879	0	0	366	111	56,350	0	0	0	88,188	0	965	669	1,634	0	0	1,634	146,172
03-L5	小原-桜江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-L1	田津	439,681	401,399	8,946	2,398	1,896	549	854,868	485	20,426	20,911	1,337,868	6,114	14,885	11,138	26,023	13,112	0	45,249	2,258,896
04-L3	恵梨	7,894	11,682	2,331	396	0	0	22,303	0	0	0	34,904	1,259	411	482	893	1,714	0	3,866	61,073
04-L4	川越(下流)	5,454	7,116	13,802	2,959	0	0	29,330	0	538	538	45,901	7,184	272	276	548	3,726	0	11,458	87,227
04-L2	川越(上流)	1,144,569	987,538	250,767	83,395	7,835	2,144	2,476,248	3,271	5,277	8,548	3,875,328	202,227	36,544	25,336	61,880	120,396	0	384,503	6,744,627
04-R1	榎谷	17,347	20,114	38,089	21,978	209	64	97,801	0	0	0	153,059	6,695	714	602	1,316	1,714	0	9,725	260,585
04-R2	久井谷	34,448	33,995	0	0	497	145	69,085	0	994	994	108,118	0	1,237	945	2,182	0	0	2,182	180,379
04-R5	和田	103,364	110,963	0	0	1,407	402	216,136	0	2,153	2,153	338,253	0	4,028	3,546	7,574	0	0	7,574	564,116
04-R3	大貫	131,329	116,540	49,505	10,741	1,005	274	309,395	205	227	432	484,203	35,293	4,339	3,318	7,657	17,849	0	60,798	854,828
04-R4	坂本	0	0	0	0	817	226	1,043	970	0	970	1,632	0	0	0	0	0	0	0	3,645
05-L1	鹿賀(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-L2	鹿賀(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R1	渦巻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R2	瀬尻(川本町)	11,893	12,998	3,248	696	78	21	28,934	0	120	120	45,282	1,690	442	326	768	3,726	0	6,184	80,520
05-R3	久料谷	66,845	84,938	0	0	665	199	152,648	121	718	839	238,894	0	3,067	2,996	6,064	0	0	6,064	398,445
05-R4	尾原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R5	松ヶ崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L1	因原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L0	因原(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L2	日向	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L5	谷(本川)	1,288	588	9,792	3,727	0	0	15,396	0	0	0	24,095	9,007	83	165	248	1,880	0	11,135	50,626

①全体事業（H28～H57）

様式－3　　被害額（事業実施前）　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川（平成27年度末河道）　　流量規模：1/10　　（千円）

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	小麦・雑作物				清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
06-L3	谷(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L4	川本	569,875	742,542	253,065	114,659	610	202	1,680,953	0	0	0	2,630,691	99,415	26,183	23,423	49,606	160,347	0	309,368	4,621,012
06-R1	木谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R2	下三島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R3	上三島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R5	谷戸(本川)	11,676	12,998	0	0	25	7	24,707	0	0	0	38,666	0	442	326	768	7,452	0	8,220	71,593
06-R4	谷戸(支川)	11,676	12,998	5,146	1,103	280	76	31,280	0	477	477	48,953	1,325	442	326	768	6,556	0	8,649	89,359
07-L1	木路原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-L2	銅ヶ丸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-L3	竹	43,521	40,592	0	0	361	99	84,573	909	1,245	2,154	132,357	0	1,454	1,299	2,753	0	0	2,753	221,837
07-R1	久座仁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R2	多田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R3	市井原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R4	君谷湊	0	0	0	0	0	0	0	285	106	391	0	0	0	0	0	0	0	0	391
07-R5	君谷湊(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L1	乙原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L2	筆瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L3	明塚	0	0	0	0	0	0	0	741	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	741
08-L5	上明塚	0	0	0	0	0	0	0	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	242
08-L4	野井	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-R1	栗原	0	0	0	0	14	4	18	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	46
08-R2	吾郷	0	0	0	0	156	56	213	695	0	695	333	0	0	0	0	0	0	0	1,241
08-R3	高畑	0	0	0	0	75	22	97	0	1,588	1,588	152	0	0	0	0	0	0	0	1,837
09-L1	亀村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R1	小原(邑智)	8,101	9,133	0	0	0	0	17,234	0	0	0	26,971	0	277	413	690	0	0	690	44,895
09-R4	狛淵	0	0	0	0	474	162	636	874	0	874	995	0	0	0	0	0	0	0	2,505
09-R5	浜原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
09-R2	浜原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L1	滝原	0	0	0	0	7	2	9	69	0	69	14	0	0	0	0	0	0	0	92
09-R3	本郷	0	0	22,948	3,094	291	88	26,421	1,077	0	1,077	41,349	4,372	0	0	0	5,440	0	9,812	78,659
10-L2	石見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L3	信喜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R1	浜原ダム	0	0	0	0	0	0	0	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	121
10-R2	潮下(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R3	潮下(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-L1	都賀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R1	滝下(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R3	潮上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R2	曲利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L1	郷上	0	0	0	0	0	0	0	701	0	701	0	0	0	0	0	0	0	0	701
12-L3	山根	0	0	0	0	222	73	295	426	0	426	462	0	0	0	0	0	0	0	1,183
12-L4	高梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L5	大浦(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L6	大浦	0	0	0	0	38	11	49	69	0	69	77	0	0	0	0	0	0	0	195
12-R1	松原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-R2	響谷	4,718	4,566	0	0	136	41	9,461	416	0	416	14,806	0	139	207	345	0	0	345	25,028
12-R3	原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-L1	都賀西	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-L2	乙谷	0	0	0	0	0	0	0	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	69
13-R1	都賀本郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R2	上野(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R3	上野(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R4	上野(上流Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L1	下郷(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L2	下郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-R1	柳原(作木)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-R2	柳原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L1	引城	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L2	西之原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L3	西之原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-R1	伊賀和志	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L1	坂谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

①全体事業（H28～H57）

様式－3　　被害額（事業実施前）　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川（平成27年度末河道）　　流量規模：1/10　　（千円）

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	小麦・雑作物				清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
16-L2	坂谷(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L3	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R1	井手平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R5	大津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R2	折敷谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R3	式	0	0	0	0	229	81	310	107	0	107	485	0	0	0	0	0	0	0	902
16-R4	丹渡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L0	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L1	青山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L2	上ヶ畑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R1	港	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R2	熊見下(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R3	熊見下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L1	川根	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L2	川根(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L3	竹貞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L4	梶矢(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R1	熊見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R2	香淀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R3	門田(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L1	梶矢(上流)	0	0	0	0	66	19	85	1,027	0	1,027	133	0	0	0	0	0	0	0	1,245
19-L2	林	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L3	式敷	0	0	0	0	0	0	0	1,548	0	1,548	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548
19-L4	信木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R1	門田(上流)	8,554	697	0	0	0	0	9,250	154	0	154	14,476	0	43	83	126	0	0	126	24,006
19-R2	川毛	0	0	0	0	52	14	66	437	0	437	103	0	0	0	0	0	0	0	606
19-R3	上組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L1	所木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L2	船佐(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L3	船佐(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R1	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R2	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R3	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L1	下長谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L2	馬行谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L3	下津河内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R1	引字根	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R2	下乙原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R3	日下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L1	荒瀬(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L2	岩脇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L3	十日市・南畑敷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R1	板崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R2	中所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R3	三次町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R4	寺戸 桧原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R5	畠敷町(Ⅰ・Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R6	畠敷町(Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L1	中ノ村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L2	亀谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L3	米丸	7,513	7,116	34,668	14,557	0	0	63,854	306	0	306	99,932	10,161	272	276	548	5,576	0	16,285	180,377
23-L4	旭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L5	上村	0	0	25,244	13,635	0	0	38,879	530	0	530	60,846	6,051	0	0	0	925	0	6,976	107,231
23-R1	大村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R2	船所	0	0	0	0	0	0	0	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	63
23-R3	青河	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R4	鈴江	0	0	0	0	0	0	0	382	0	382	0	0	0	0	0	0	0	0	382
24-L1	若屋	0	0	0	0	0	0	0	853	0	853	0	0	0	0	0	0	0	0	853
24-L2	秋町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-R1	片山	9,244	6,387	2,626	418	0	0	18,675	1,600	0	1,600	29,226	1,935	276	525	802	925	0	3,662	53,163
24-R2	下志和地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-L1	深瀬	91,328	25,632	9,291	8,303	113	37	134,704	1,248	0	1,248	210,812	3,119	966	1,361	2,327	2,081	0	7,526	354,290

①全体事業（H28～H57）

様式－3　　被害額（事業実施前）　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川（平成27年度末河道）　　流量規模：1/10　　（千円）

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	小麦・雑作物				清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
25-L2	甲立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R1	上志和地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R2	川立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R1	高田原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R2	法恩時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-L1	篠原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L1	市ヶ原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L2	高屋	0	0	0	0	0	0	0	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	358
27-R1	下小原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R2	柳原(吉田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R3	国司-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L1	内堀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L2	山手(-常友)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L3	桂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L4	長屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R1	国司-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R2	下入江(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R3	下入江(上流)	41,709	12,239	875	678	209	67	55,777	5,730	960	6,690	87,291	394	661	1,212	1,873	511	0	2,778	152,536
28-R4	上入江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-L1	下土師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-R1	北原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L2	郷川	0	0	1,900	2,224	20	6	4,150	661	0	661	6,495	1,165	0	0	0	925	0	2,090	13,396
30-L3	中三原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L5	下三原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L4	小松原	0	0	0	0	208	69	277	523	0	523	434	0	0	0	0	0	0	0	1,234
30-R2	向三原	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120
30-R3	下布野	0	0	0	0	0	0	0	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	219
30-R4	鉾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-R5	河戸	17,415	4,207	11,593	3,049	172	50	36,487	55	715	770	57,102	1,768	217	416	633	531	0	2,932	97,291
1/80区間の合計		149,794	51,373	72,704	37,592	322	104	311,889	11,069	960	12,029	488,106	21,659	2,176	3,374	5,550	10,018	0	37,227	849,251
1/100区間の合計		4,850,488	4,919,996	1,361,210	433,670	28,478	8,394	11,602,236	28,755	51,439	80,194	18,157,499	530,680	180,602	166,791	347,393	496,832	0	1,374,905	31,214,834
合計		5,000,282	4,971,369	1,433,914	471,262	28,800	8,498	11,914,119	39,824	52,399	92,227	18,645,593	552,338	182,778	170,165	352,937	506,850	0	1,412,125	32,064,064

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施前)　　水系名:江の川　河川名:江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成27年度末河道)　　流量規模:1/30　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
01-L1	江津	813,191	312,375	314,741	113,065	596	194	1,554,163	0	0	0	2,432,265	96,795	11,433	19,199	30,632	41,307	0	168,734	4,155,162
01-L2	本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L6	郷田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L3	千金(下流)	34,202	27,762	0	0	158	44	62,166	254	0	254	97,290	0	1,045	687	1,732	0	0	1,732	161,442
01-L7	千金(上流)	120,034	138,599	43,027	27,242	563	163	329,627	397	3,742	4,139	515,866	28,624	4,820	4,230	9,049	19,668	0	57,341	906,973
01-L4	田野村	81,506	94,253	0	0	1,154	326	177,239	970	2,348	3,318	277,379	0	3,451	3,133	6,585	0	0	6,585	464,521
01-L5	赤栗	15,789	23,364	0	0	2,251	647	42,050	0	1,793	1,793	65,808	0	822	965	1,787	0	0	1,787	111,438
01-R1	渡津	1,671,681	731,104	782,969	302,144	729	254	3,488,882	0	0	0	5,460,100	232,134	26,380	31,325	57,705	68,490	0	358,329	9,307,311
01-R5	長田	3,274,175	2,962,071	623,031	171,810	6,900	1,941	7,039,927	0	3,951	3,951	11,017,486	113,865	105,375	80,104	185,479	165,189	0	464,533	18,525,897
01-R2	太田	81,879	82,981	0	0	434	125	165,419	1,780	0	1,780	258,881	0	3,085	2,735	5,820	0	0	5,820	431,900
01-R3	八神(下流)	123,231	118,466	20,607	9,951	1,104	304	273,664	3,136	747	3,883	428,284	13,892	4,249	3,272	7,520	11,174	0	32,587	738,418
01-R4	八神(上流)	93,476	102,535	92,028	31,809	212	58	320,118	2,879	2,595	5,474	500,985	11,837	3,523	2,948	6,471	11,174	0	29,482	856,059
02-L1	川平(本川)	244,484	240,479	66,253	31,452	2,419	683	585,771	0	3,518	3,518	916,732	45,001	8,688	6,620	15,308	46,304	0	106,613	1,612,634
01-L8	瀬尻(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L2	瀬尻(上流)	33,464	35,228	0	0	106	31	68,828	485	807	1,292	107,716	0	1,339	1,171	2,510	0	0	2,510	180,346
02-L3	小松	28,009	28,112	0	0	0	0	56,121	0	404	404	87,829	0	1,067	895	1,962	0	0	1,962	146,316
02-L4	仁万瀬	34,448	33,995	0	0	0	0	68,443	0	0	0	107,113	0	1,237	945	2,182	0	0	2,182	177,738
01-L9	田野Ⅰ	220,630	184,010	0	0	770	212	405,622	606	538	1,144	634,798	0	7,060	5,149	12,209	0	0	12,209	1,053,773
02-L7	田野Ⅱ	17,101	13,881	101,067	85,790	2,810	767	221,417	2,506	0	2,506	346,518	39,779	523	343	866	13,238	0	53,883	624,324
02-L8	川平(支川)	172,485	150,043	0	0	1,550	420	324,499	212	0	212	507,841	0	5,507	3,725	9,232	0	0	9,232	841,784
02-L9	川平(その他)	0	0	0	0	23	8	31	503	0	503	49	0	0	0	0	0	0	0	583
02-R1	松川	10,088	10,449	1,865	317	2,870	843	26,432	6,065	0	6,065	41,366	1,034	433	821	1,253	1,714	0	4,001	77,864
01-R6	松川(上流)	244,808	143,725	10,107	3,115	2,246	648	404,648	1,940	3,551	5,491	633,274	5,477	5,522	5,070	10,592	11,572	0	27,641	1,071,054
02-R2	久坪	0	0	0	0	150	41	190	0	0	0	297	0	0	0	0	0	0	0	487
02-R3	橿原	43,326	44,444	0	0	0	0	87,771	364	248	612	137,362	0	1,546	1,202	2,748	0	0	2,748	228,493
02-R4	中長良	44,372	49,459	0	0	0	0	93,831	0	0	0	146,846	0	1,884	1,723	3,606	0	0	3,606	244,283
02-R5	上長良(本川)	130,943	126,665	61,032	27,060	398	109	346,206	485	807	1,292	541,812	25,585	4,494	3,521	8,015	15,025	0	48,625	937,935
02-R9	上長良(支川)	5,454	7,116	0	0	71	19	12,660	443	0	443	19,813	0	272	276	548	0	0	548	33,464
02-R6	大口(下流)	35,678	38,995	0	0	0	0	74,674	0	0	0	116,865	0	1,327	978	2,305	0	0	2,305	193,844
02-R7	大口(上流)	52,779	52,876	0	0	0	0	105,655	485	2,422	2,907	165,350	0	1,849	1,322	3,171	0	0	3,171	277,083
02-R8	下原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L6	志谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L4	川戸	1,281,252	721,156	158,745	119,049	3,984	1,105	2,285,290	0	3,428	3,428	3,576,479	70,887	26,036	19,028	45,063	116,167	0	232,117	6,097,314
03-L1	川戸(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L5	近原	5,454	7,116	0	0	0	0	12,570	0	340	340	19,672	0	272	276	548	0	0	548	33,130
03-L2	猪ノ瀬	656	294	0	0	0	0	950	0	0	0	1,487	0	42	83	124	0	0	124	2,561
03-L3	花河原	11,893	12,998	0	0	0	0	24,891	0	0	0	38,954	0	442	326	768	0	0	768	64,613
03-R1	下原(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R2	臼木(下流)	5,454	7,116	106,128	77,770	276	83	196,827	0	269	269	308,034	30,830	272	276	548	23,237	0	54,615	559,745
03-R3	臼木(上流)	5,454	7,116	0	0	102	31	12,702	0	0	0	19,879	0	272	276	548	0	0	548	33,129
03-R4	元折	47,981	42,791	0	0	779	211	91,762	364	0	364	143,608	0	1,566	1,160	2,726	0	0	2,726	238,460
03-L5	小原-桜江	5,454	7,116	0	0	0	0	12,570	0	0	0	19,672	0	272	276	548	0	0	548	32,790
04-L1	田津	571,505	482,653	9,215	2,625	2,488	682	1,069,168	485	20,540	21,025	1,673,248	8,225	17,990	12,155	30,145	13,238	0	51,608	2,815,049
04-L3	恵梨	28,994	26,879	4,970	1,332	0	0	62,175	0	0	0	97,304	3,357	965	669	1,634	6,556	0	11,547	171,026
04-L4	川越(下流)	45,356	48,226	24,117	5,307	0	0	123,007	0	538	538	192,506	19,164	1,781	1,497	3,279	7,544	0	29,987	346,038
04-L2	川越(上流)	1,299,160	1,074,828	260,292	86,780	8,365	2,275	2,731,700	3,395	5,383	8,778	4,275,111	212,574	40,506	27,671	68,178	125,639	0	406,391	7,421,980
04-R1	榎谷	41,542	36,908	83,662	80,832	642	195	243,782	0	0	0	381,519	24,017	1,396	1,110	2,506	6,619	0	33,142	658,443
04-R2	久井谷	87,083	85,205	0	0	1,289	372	173,949	0	1,159	1,159	272,230	0	3,205	2,850	6,056	0	0	6,056	453,394
04-R5	和田	227,766	187,568	4,058	646	1,966	533	422,537	0	2,153	2,153	661,270	3,069	7,065	4,739	11,804	925	0	15,798	1,101,758
04-R3	大貫	424,439	383,673	122,810	32,180	2,576	704	966,383	485	538	1,023	1,512,389	88,756	14,155	10,510	24,664	50,409	0	163,829	2,643,624
04-R4	坂本	5,905	2,647	0	0	1,142	325	10,020	970	0	970	15,681	0	375	743	1,118	0	0	1,118	27,789
05-L1	鹿賀(下流)	42,588	51,910	0	0	143	43	94,684	0	0	0	148,180	0	1,840	1,686	3,526	0	0	3,526	246,390
05-L2	鹿賀(上流)	296,128	278,949	0	0	1,682	457	577,217	0	3,722	3,722	903,345	0	10,084	7,662	17,746	0	0	17,746	1,502,030
05-R1	渦巻	17,880	24,372	4,058	646	261	80	47,298	0	0	0	74,021	3,069	863	1,279	2,142	925	0	6,136	127,455
05-R2	瀬尻(川本町)	17,101	13,881	4,095	1,167	84	23	36,351	0	120	120	56,889	3,709	523	343	866	6,619	0	11,194	104,554
05-R3	久料谷	213,781	180,718	0	0	924	251	395,674	121	718	839	619,230	0	6,711	4,576	11,287	0	0	11,287	1,027,030
05-R4	尾原	260,652	221,409	54,393	52,811	1,700	463	591,428	0	2,269	2,269	925,585	29,365	8,272	5,858	14,130	19,857	0	63,352	1,582,634
05-R5	松ヶ崎	51,303	41,643	24,606	13,380	0	0	130,932	0	0	0	204,909	19,736	1,568	1,030	2,598	13,238	0	35,572	371,413
06-L1	因原	2,715,480	1,200,386	465,019	244,501	9,147	2,543	4,637,076	849	477	1,326	7,257,024	226,820	44,918	31,488	76,406	140,023	0	443,249	12,338,675
06-L0	因原(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L2	日向	31,204	32,174	39,617	31,319	337	100	134,752	100	0	100	210,887	16,559	1,223	1,190	2,414	19,794	0	38,767	384,506
06-L5	谷(本川)	181,304	183,688	215,351	112,358	567	154	693,423	0	0	0	1,085,207	147,337	6,499	4,879	11,378	66,800	0	225,515	2,004,145

様式－3　　被害額（事業実施前）　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川（平成27年度末河道）　　流量規模：1/30　　①全体事業（H28～H57）　　（千円）

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
06-L3	谷(支川)	642,961	580,660	129,172	72,722	1,903	532	1,427,948	0	0	0	2,234,739	53,347	21,607	16,054	37,661	43,377	0	134,385	3,797,072
06-L4	川本	1,427,098	1,310,587	375,808	197,505	1,399	392	3,312,788	0	0	0	5,184,513	200,185	48,829	33,612	82,441	266,624	0	549,250	9,046,551
06-R1	木谷	1,933	882	0	0	0	0	2,815	0	0	0	4,405	0	125	248	373	0	0	373	7,593
06-R2	下三島	8,053	8,418	29,883	10,763	475	132	57,724	0	498	498	90,338	12,762	355	673	1,028	6,380	0	20,170	168,730
06-R3	上三島	39,055	48,338	2,938	1,627	185	51	92,194	0	40	40	144,284	1,125	1,669	1,784	3,453	470	0	5,048	241,566
06-R5	谷戸(本川)	16,790	13,881	0	0	35	9	30,715	0	0	0	48,069	0	523	343	866	13,238	0	14,104	92,888
06-R4	谷戸(支川)	18,722	14,763	5,300	1,208	442	124	40,560	0	477	477	63,476	1,783	648	591	1,239	6,619	0	9,641	114,154
07-L1	木路原	0	0	0	0	0	0	0	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	190
07-L2	銅ヶ丸	16,790	13,881	29,528	28,529	0	0	88,727	0	0	0	138,858	8,477	523	343	866	6,619	0	15,962	243,547
07-L3	竹	103,474	81,521	0	0	449	122	185,566	909	1,908	2,817	290,411	0	2,975	2,025	5,000	0	0	5,000	483,794
07-R1	久座仁	101,262	87,348	62,916	14,005	3,812	1,046	270,388	0	0	0	423,157	45,763	3,337	2,585	5,922	21,189	0	72,874	766,419
07-R2	多田	5,556	6,093	0	0	0	0	11,649	0	0	0	18,231	0	235	443	677	0	0	677	30,557
07-R3	市井原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R4	君谷湊	38,389	27,762	2,048	583	0	0	68,781	667	400	1,067	107,642	1,854	1,045	687	1,732	6,619	0	10,205	187,695
07-R5	君谷湊(支川)	2,854	2,325	0	0	702	192	6,073	1,965	0	1,965	9,504	0	120	230	350	0	0	350	17,892
08-L1	乙原	195,257	161,277	0	0	1,077	291	357,901	424	1,752	2,176	560,115	0	5,789	4,016	9,805	0	0	9,805	929,997
08-L2	築瀬	186,005	159,246	10,111	3,500	1,433	485	360,778	0	856	856	564,618	6,475	6,227	6,743	12,970	10,752	0	30,197	956,449
08-L3	明塚	59,171	52,134	31,219	22,699	403	132	165,759	775	1,969	2,744	259,413	5,151	2,026	2,161	4,187	3,726	0	13,064	440,980
08-L5	上明塚	14,891	12,998	17,562	15,974	0	0	61,425	242	0	242	96,130	9,839	442	326	768	10,282	0	20,889	178,686
08-L4	野井	1,013	294	0	0	0	0	1,307	200	0	200	2,045	0	42	83	124	0	0	124	3,676
08-R1	栗原	367,545	312,286	34,414	8,987	4,690	1,306	729,228	485	0	485	1,141,242	24,554	11,407	8,855	20,263	23,457	0	68,274	1,939,229
08-R2	吾郷	0	0	0	0	647	187	834	1,118	0	1,118	1,305	0	0	0	0	0	0	0	3,257
08-R3	高畑	0	0	0	0	1,016	283	1,299	242	2,101	2,343	2,033	0	0	0	0	0	0	0	5,675
09-L1	亀村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R1	小原(邑智)	40,046	27,762	0	0	67	25	67,900	0	0	0	106,264	0	1,045	687	1,732	0	0	1,732	175,896
09-R4	狛淵	0	0	0	0	1,530	419	1,949	1,159	0	1,159	3,050	0	0	0	0	0	0	0	6,158
09-R5	浜原(下流)	1,013	294	17,924	10,343	0	0	29,574	242	0	242	46,283	3,151	42	83	124	1,714	0	4,989	81,088
09-R2	浜原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L1	滝原	2,117	2,031	0	0	42	12	4,202	200	120	320	6,576	0	78	148	226	0	0	226	11,324
09-R3	本郷	7,089	6,387	95,388	48,310	676	187	158,037	1,527	0	1,527	247,328	27,807	276	525	802	27,246	0	55,855	462,747
10-L2	石見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L3	信喜	10,357	11,178	0	0	62	19	21,615	0	1,006	1,006	33,827	0	429	571	1,000	0	0	1,000	57,448
10-R1	浜原ダム	0	0	0	0	0	0	0	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	121
10-R2	潮下(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R3	潮下(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-L1	都賀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R1	滝下(2)	2,739	4,566	0	0	0	0	7,305	0	0	0	11,432	0	139	207	345	0	0	345	19,082
11-R3	潮上	5,478	9,133	8,616	13,576	67	25	36,895	0	0	0	57,741	3,636	277	413	690	3,726	0	8,052	102,688
11-R2	曲利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L1	郷上	0	0	0	0	0	0	0	862	0	862	0	0	0	0	0	0	0	0	862
12-L3	山根	20,023	18,559	8,616	13,576	812	227	61,814	1,212	0	1,212	96,739	3,636	597	909	1,505	3,726	0	8,867	168,632
12-L4	高梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L5	大浦(下流)	0	0	0	0	0	0	0	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	48
12-L6	大浦	18,734	14,525	0	0	707	239	34,206	1,418	0	1,418	53,532	0	586	634	1,220	0	0	1,220	90,376
12-R1	松原	4,718	4,566	0	0	0	0	9,284	0	0	0	14,529	0	139	207	345	0	0	345	24,158
12-R2	豊谷	90,540	62,639	0	0	564	178	153,922	1,655	0	1,655	240,888	0	2,362	1,649	4,011	0	0	4,011	400,476
12-R3	原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-L1	都賀西	39,353	29,993	12,011	7,291	147	45	88,840	355	123	478	139,035	7,185	1,096	964	2,060	6,525	0	15,770	244,123
13-L2	乙谷	8,792	7,116	0	0	13	5	15,925	243	0	243	24,923	0	272	276	548	0	0	548	41,639
13-R1	都賀本郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R2	上野(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R3	上野(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R4	上野(上流Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L1	下郷(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L2	下郷	0	0	0	0	63	18	81	775	0	775	127	0	0	0	0	0	0	0	983
14-R1	柳原(作木)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-R2	柳原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L1	引城	14,173	12,998	0	0	0	0	27,171	0	258	258	42,523	0	442	326	768	0	0	768	70,720
15-L2	西之原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L3	西之原	201,352	158,391	27,457	7,056	2,084	623	396,962	5,717	0	5,717	621,246	21,347	5,926	4,457	10,383	17,434	0	49,164	1,073,089
15-R1	伊賀和志	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L1	坂谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施前)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成27年度末河道)　　流量規模：1/30　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
16-L2	坂谷(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L3	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R1	井手平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R5	大津	0	0	811	973	0	0	1,784	0	0	0	2,792	794	0	0	0	470	0	1,264	5,840
16-R2	折敷谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R3	式	8,280	6,093	0	0	1,549	486	16,408	515	0	515	25,679	0	235	443	677	0	0	677	43,279
16-R4	丹波	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L0	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L1	青山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L2	上ヶ畑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R1	港	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R2	熊見下(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R3	熊見下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L1	川根	19,057	13,881	0	0	908	275	34,121	79	0	79	53,399	0	523	343	866	0	0	866	88,465
18-L2	川根(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L3	竹貞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L4	梶矢(下流)	134,232	116,328	39,461	20,519	4,295	1,253	316,089	4,045	376	4,420	494,679	25,126	4,191	3,746	7,937	18,615	0	51,678	866,866
18-R1	熊見	0	0	0	0	363	106	469	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	1,203
18-R2	香淀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R3	門田(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L1	梶矢(上流)	9,375	5,239	21,545	11,931	618	167	48,875	1,250	188	1,438	76,489	8,252	323	625	949	940	0	10,141	136,943
19-L2	林	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L3	式敷	0	0	955	152	0	0	1,107	2,685	0	2,685	1,732	722	0	0	0	925	0	1,647	7,171
19-L4	信木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R1	門田(上流)	56,151	8,109	0	0	52	19	64,332	459	0	459	100,680	0	310	333	643	0	0	643	166,114
19-R2	川毛	15,290	16,024	1,931	1,156	153	43	34,597	859	0	859	54,144	2,113	536	850	1,386	940	0	4,439	94,039
19-R3	上組	0	0	0	0	0	0	0	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	56
20-L1	所木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L2	船佐(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L3	船佐(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R1	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R2	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R3	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L1	下長谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L2	馬行谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L3	下津河内	964	294	0	0	0	0	1,258	136	0	136	1,969	0	42	83	124	0	0	124	3,487
21-R1	引字根	0	0	85,853	62,423	0	0	148,276	0	0	0	232,052	14,165	0	0	0	3,726	0	17,891	398,219
21-R2	下乙原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R3	日下	532,820	389,198	44,471	27,108	1,331	364	995,293	6,649	0	6,649	1,557,634	35,079	14,466	9,839	24,305	19,794	0	79,178	2,638,754
22-L1	荒瀬(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L2	岩脇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L3	十日市・南畑敷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R1	板崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R2	中所	489,032	480,972	333,960	194,087	3,093	991	1,502,135	0	0	0	2,350,841	71,844	16,717	19,018	35,736	20,436	0	128,016	3,980,992
22-R3	三次町	5,028,623	2,192,905	617,395	241,874	3,342	1,143	8,085,282	0	0	0	12,653,466	185,387	82,065	99,824	181,889	257,024	0	624,299	21,363,047
22-R4	寺戸桧原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R5	畠敷町(Ⅰ・Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R6	畠敷町(Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L1	中ノ村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L2	亀谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L3	米丸	15,136	13,293	103,105	65,109	178	52	196,873	798	0	798	308,106	22,241	484	409	893	14,008	0	37,142	542,919
23-L4	旭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L5	上村	3,855	4,566	49,292	28,442	0	0	86,155	738	0	738	134,833	8,664	139	207	345	1,714	0	10,723	232,449
23-R1	大村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R2	船所	27,162	24,890	14,354	2,808	626	200	70,041	584	0	584	109,614	8,014	918	1,201	2,119	6,365	0	16,498	196,737
23-R3	青河	0	0	6,462	10,182	0	0	16,644	2,325	0	2,325	26,048	2,727	0	0	0	3,726	0	6,453	51,470
23-R4	鈴江	2,760	2,031	0	0	151	44	4,985	980	0	980	7,802	0	78	148	226	0	0	226	13,993
24-L1	若屋	0	0	0	0	0	0	0	1,347	0	1,347	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347
24-L2	秋町	893,946	358,305	68,091	49,096	4,283	1,331	1,375,052	9,646	0	9,646	2,151,956	20,764	12,848	12,211	25,059	30,711	0	76,534	3,613,188
24-R1	片山	37,633	35,354	8,931	1,914	0	0	83,832	2,425	0	2,425	131,197	4,529	1,348	1,540	2,888	3,726	0	11,143	228,597
24-R2	下志和地	9,875	1,082	1,061	563	0	0	12,581	1,560	0	1,560	19,689	607	154	304	457	395	0	1,459	35,289
25-L1	深瀬	202,850	52,671	17,445	17,632	591	199	291,389	5,391	0	5,391	456,024	6,172	2,018	2,411	4,429	4,592	0	15,193	767,997

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施前)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成27年度末河道)　　流量規模：1/30　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
25-L2	甲立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R1	上志和地	1,462,321	680,909	82,596	67,225	8,365	2,653	2,304,069	17,882	2,257	20,139	3,605,868	33,781	24,674	23,439	48,113	53,796	0	135,690	6,065,766
25-R2	川立	111,393	23,856	0	0	0	0	135,249	1,617	0	1,617	211,665	0	847	756	1,602	0	0	1,602	350,133
26-R1	高田原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R2	法恩時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-L1	篠原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L1	市ヶ原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L2	高屋	0	0	7,924	1,348	228	77	9,578	931	0	931	14,990	4,281	0	0	0	1,714	0	5,995	31,494
27-R1	下小原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R2	柳原(吉田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R3	国司-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L1	内堀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L2	山手(-常友)	43,179	17,192	6,444	3,216	174	60	70,265	0	0	0	109,965	1,530	659	796	1,455	1,619	0	4,604	184,834
28-L3	桂	389,943	111,932	37,298	20,705	1,366	423	561,668	9,892	0	9,892	879,010	10,797	5,225	7,862	13,087	8,918	0	32,802	1,483,372
28-L4	長屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R1	国司-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R2	下入江(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R3	下入江(上流)	116,659	33,818	2,149	1,771	531	176	155,105	9,431	1,064	10,495	242,739	819	1,794	3,053	4,847	1,131	0	6,797	415,136
28-R4	上入江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-L1	下土師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-R1	北原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L2	郷川	9,463	6,093	7,912	15,586	119	34	39,207	1,224	0	1,224	61,359	4,448	235	443	677	6,556	0	11,681	113,471
30-L3	中三原	1,095	294	19,489	2,517	205	60	23,660	186	0	186	37,028	7,116	42	83	124	1,850	0	9,090	69,964
30-L5	下三原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L4	小松原	0	0	50,412	28,625	1,382	467	80,887	1,765	0	1,765	126,588	9,983	0	0	0	2,184	0	12,167	221,407
30-R2	向三原	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	240
30-R3	下布野	0	0	0	0	0	0	0	401	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	401
30-R4	鈩	1,095	294	0	0	0	0	1,389	0	0	0	2,174	0	42	83	124	0	0	124	3,687
30-R5	河戸	71,232	25,479	55,962	17,415	761	267	171,116	354	1,385	1,739	267,797	5,913	980	1,327	2,306	2,649	0	10,868	451,520
1/80区間の合計		3,316,713	1,359,899	405,152	270,013	16,494	5,215	5,373,485	65,547	3,321	68,868	8,409,504	124,926	51,184	54,335	105,520	132,415	0	362,861	14,214,718
1/100区間の合計		25,640,050	17,642,447	5,878,929	2,769,078	109,643	31,451	52,071,597	73,935	82,582	156,517	81,492,049	2,330,520	648,376	556,888	1,205,264	1,838,277	0	5,374,060	139,094,223
合計		28,956,763	19,002,346	6,284,081	3,039,090	126,137	36,666	57,445,084	139,482	85,903	225,382	89,901,558	2,455,446	699,560	611,224	1,310,784	1,970,691	0	5,736,918	153,308,942

様式－3　　被害額(事業実施前)　　水系名:江の川　河川名:江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成27年度末河道)　　流量規模:1/50　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
01-L1	江津	911,228	384,603	365,925	130,391	679	231	1,793,057	0	0	0	2,806,134	106,593	14,379	21,721	36,099	49,879	0	192,571	4,791,762
01-L2	本町	194,565	249,603	65,781	14,455	480	177	525,060	0	0	0	821,719	8,044	9,414	10,575	19,989	13,473	0	41,506	1,388,285
01-L6	郷田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L3	千金(下流)	34,202	27,762	0	0	182	50	62,196	256	0	256	97,337	0	1,045	687	1,732	0	0	1,732	161,521
01-L7	千金(上流)	163,053	173,211	43,811	29,394	708	193	410,370	429	3,742	4,170	642,229	34,460	6,114	4,725	10,839	19,794	0	65,093	1,121,862
01-L4	田野村	121,921	127,100	0	0	1,320	358	250,698	970	2,348	3,318	392,342	0	4,515	3,471	7,986	0	0	7,986	654,344
01-L5	赤栗	21,817	28,462	0	0	2,533	716	53,527	0	1,793	1,793	83,770	0	1,089	1,104	2,192	0	0	2,192	141,282
01-R1	渡津	2,014,517	860,192	903,040	361,519	857	296	4,140,422	0	0	0	6,479,760	266,204	31,206	34,407	65,613	82,704	0	414,521	11,034,703
01-R5	長田	3,763,102	3,159,502	646,919	182,742	7,441	2,067	7,761,774	0	4,035	4,035	12,147,176	125,424	114,240	83,120	197,359	173,944	0	496,727	20,409,712
01-R2	太田	109,296	110,290	0	0	497	144	220,226	1,819	0	1,819	344,654	0	4,122	3,741	7,863	0	0	7,863	574,562
01-R3	八神(下流)	173,458	160,739	24,374	11,798	1,387	377	372,134	3,825	948	4,773	582,390	16,994	5,958	4,556	10,514	13,185	0	40,693	999,990
01-R4	八神(上流)	162,499	145,357	111,578	40,892	269	74	460,670	3,395	3,228	6,623	720,949	16,903	5,454	4,075	9,529	13,238	0	39,670	1,227,912
02-L1	川平(本川)	333,597	292,391	73,930	35,070	2,956	815	738,759	0	3,818	3,818	1,156,158	56,473	10,906	8,032	18,938	51,262	0	126,673	2,025,408
01-L8	瀬尻(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L2	瀬尻(上流)	52,779	52,876	0	0	137	37	105,829	485	992	1,477	165,622	0	1,849	1,322	3,171	0	0	3,171	276,099
02-L3	小松	40,886	39,878	0	0	0	0	80,764	0	404	404	126,396	0	1,407	996	2,403	0	0	2,403	209,967
02-L4	仁万瀬	46,094	40,760	0	0	0	0	86,855	0	0	0	135,928	0	1,487	1,013	2,500	0	0	2,500	225,283
01-L9	田野Ⅰ	246,097	219,980	0	0	842	230	467,149	677	538	1,215	731,088	0	8,060	6,021	14,082	0	0	14,082	1,213,534
02-L7	田野Ⅱ	20,300	16,500	101,608	85,878	2,855	777	227,917	2,506	0	2,506	356,690	40,558	684	656	1,340	13,708	0	55,606	642,719
02-L8	川平(支川)	188,110	152,690	0	0	1,550	420	342,770	212	0	212	536,435	0	5,748	3,776	9,524	0	0	9,524	888,941
02-L9	川平(その他)	0	0	0	0	29	11	39	556	0	556	61	0	0	0	0	0	0	0	656
02-R1	松川	234,512	232,950	34,796	8,654	7,576	2,102	520,590	10,446	0	10,446	814,723	22,609	8,538	6,962	15,500	16,901	0	55,010	1,400,769
01-R6	松川(上流)	700,161	399,477	24,954	8,508	6,229	1,742	1,141,070	1,940	4,304	6,244	1,785,775	13,693	14,608	10,785	25,393	31,001	0	70,087	3,003,176
02-R2	久坪	0	0	0	0	182	53	234	0	0	0	366	0	0	0	0	0	0	0	600
02-R3	橿原	56,757	48,758	0	0	0	0	105,515	364	269	633	165,131	0	1,840	1,306	3,146	0	0	3,146	274,425
02-R4	中長良	76,564	78,873	0	0	0	0	155,438	0	0	0	243,260	0	2,734	1,974	4,708	0	0	4,708	403,406
02-R5	上長良(本川)	164,283	145,603	155,206	102,888	420	118	568,519	485	807	1,292	889,732	42,171	5,504	4,293	9,797	20,690	0	72,658	1,532,201
02-R9	上長良(支川)	11,893	12,998	0	0	85	25	25,000	485	0	485	39,125	0	442	326	768	0	0	768	65,378
02-R6	大口(下流)	51,959	41,937	0	0	0	0	93,896	0	0	0	146,947	0	1,609	1,112	2,722	0	0	2,722	243,565
02-R7	大口(上流)	68,403	55,524	0	0	0	0	123,927	485	2,422	2,907	193,946	0	2,090	1,373	3,463	0	0	3,463	324,243
02-R8	下原	559,961	480,370	203,791	165,751	4,887	1,339	1,416,100	1,791	1,076	2,868	2,216,197	77,104	17,774	12,199	29,973	33,032	0	140,109	3,775,274
02-L6	志谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L4	川戸	1,559,034	790,316	170,786	134,572	4,444	1,219	2,660,371	0	3,513	3,513	4,163,481	84,138	29,254	20,373	49,627	124,687	0	258,452	7,085,817
03-L1	川戸(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L5	近原	11,893	12,998	0	0	0	0	24,891	0	340	340	38,954	0	442	326	768	0	0	768	64,953
03-L2	猪ノ瀬	5,454	7,116	0	0	0	0	12,570	0	0	0	19,672	0	272	276	548	0	0	548	32,790
03-L3	花河原	17,101	13,881	0	0	0	0	30,982	0	0	0	48,487	0	523	343	866	0	0	866	80,335
03-R1	下原(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R2	臼木(下流)	12,549	13,293	129,747	114,989	588	159	271,324	0	1,076	1,076	424,622	47,385	484	409	893	37,039	0	85,317	782,339
03-R3	臼木(上流)	12,549	13,293	0	0	145	39	26,025	0	0	0	40,729	0	484	409	893	0	0	893	67,647
03-R4	元折	56,757	48,758	0	0	786	213	106,515	364	0	364	166,696	0	1,840	1,306	3,146	0	0	3,146	276,721
03-L5	小原-桜江	11,893	12,998	0	0	0	0	24,891	0	0	0	38,954	0	442	326	768	0	0	768	64,613
04-L1	田津	611,428	506,577	9,215	2,625	2,753	751	1,133,349	485	20,592	21,077	1,773,691	8,225	18,946	12,826	31,772	13,238	0	53,235	2,981,352
04-L3	恵梨	34,202	27,762	5,119	1,458	0	0	68,541	0	0	0	107,267	4,517	1,045	687	1,732	6,619	0	12,868	188,676
04-L4	川越(下流)	69,880	66,757	40,231	6,557	0	0	183,425	0	538	538	287,060	23,726	2,372	1,665	4,037	10,345	0	38,108	509,131
04-L2	川越(上流)	1,323,355	1,111,945	262,093	87,103	8,524	2,331	2,795,351	3,396	5,383	8,779	4,374,724	214,860	41,448	28,473	69,921	126,159	0	410,940	7,589,794
04-R1	榎谷	58,418	56,798	83,662	80,832	967	283	280,960	0	0	0	439,702	24,017	2,096	1,873	3,969	6,619	0	34,605	755,267
04-R2	久井谷	157,742	145,225	0	0	1,817	517	305,300	0	1,159	1,159	477,795	0	5,406	4,187	9,593	0	0	9,593	793,847
04-R5	和田	234,204	193,451	13,802	2,959	1,966	533	446,914	0	2,153	2,153	699,420	7,184	7,235	4,789	12,024	3,726	0	22,934	1,171,421
04-R3	大貫	504,820	441,163	126,726	34,589	2,685	733	1,110,716	485	538	1,023	1,738,271	94,823	16,382	11,691	28,073	53,433	0	176,329	3,026,339
04-R4	坂本	21,960	41,097	0	0	1,295	374	64,726	970	0	970	101,296	0	1,248	1,859	3,107	0	0	3,107	170,099
05-L1	鹿賀(下流)	75,334	73,873	0	0	193	52	149,452	0	0	0	233,892	0	2,644	1,941	4,585	0	0	4,585	387,929
05-L2	鹿賀(上流)	376,609	326,895	0	0	1,822	505	705,831	0	3,722	3,722	1,104,626	0	12,228	8,865	21,093	0	0	21,093	1,835,272
05-R1	渦巻	44,618	55,692	13,802	2,959	412	125	117,607	0	0	0	184,055	7,184	2,076	1,981	4,057	3,726	0	14,967	316,629
05-R2	瀬尻(川本町)	17,101	13,881	4,095	1,167	84	23	36,351	0	120	120	56,889	3,709	523	343	866	6,619	0	11,194	104,554
05-R3	久料谷	227,766	187,568	0	0	924	251	416,508	121	718	839	651,835	0	7,065	4,739	11,804	0	0	11,804	1,080,986
05-R4	尾原	269,510	233,609	54,393	52,811	1,713	468	612,503	0	2,269	2,269	958,567	29,365	8,738	6,262	15,000	19,857	0	64,222	1,637,561
05-R5	松ヶ崎	51,303	41,643	24,606	13,380	0	0	130,932	0	0	0	204,909	19,736	1,568	1,030	2,598	13,238	0	35,572	371,413
06-L1	因原	2,920,710	1,295,938	488,802	259,261	9,827	2,695	4,977,233	849	477	1,326	7,789,370	242,052	48,189	33,018	81,207	151,304	0	474,563	13,242,492
06-L0	因原(支川)	64,995	21,502	9,508	6,134	218	59	102,417	0	477	477	160,283	4,587	809	532	1,341	2,504	0	8,431	271,608
06-L2	日向	38,210	42,343	39,766	31,446	409	123	152,297	121	0	121	238,345	17,749	1,611	1,447	3,058	19,857	0	40,664	431,427
06-L5	谷(本川)	240,652	207,682	221,538	117,336	592	165	787,965	0	0	0	1,233,165	174,077	7,780	5,341	13,121	69,916	0	257,114	2,278,244

様式－3　被害額(事業実施前)　水系名:江の川　河川名:江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成27年度末河道)　流量規模:1/50　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
06-L3	谷(支川)	754,288	674,507	130,703	75,627	2,111	584	1,637,820	0	0	0	2,563,188	55,884	25,095	17,748	42,843	46,270	0	144,997	4,346,005
06-L4	川本	1,604,485	1,441,156	409,234	217,788	1,544	424	3,674,631	0	0	0	5,750,798	223,498	54,108	36,516	90,624	293,439	0	607,561	10,032,990
06-R1	木谷	7,187	13,699	0	0	22	8	20,916	0	0	0	32,734	0	416	620	1,036	0	0	1,036	54,686
06-R2	下三島	30,097	38,267	71,319	25,088	651	185	165,606	0	517	517	259,173	31,073	1,551	1,935	3,486	15,050	0	49,609	474,905
06-R3	上三島	170,031	174,905	45,851	16,053	423	118	407,381	1,091	140	1,232	637,551	24,544	6,566	5,894	12,460	9,195	0	46,199	1,092,363
06-R5	谷戸(本川)	16,790	13,881	0	0	35	10	30,715	0	0	0	48,069	0	523	343	866	13,238	0	14,104	92,888
06-R4	谷戸(支川)	24,621	27,874	5,300	1,208	493	133	59,630	0	477	477	93,321	1,783	980	1,045	2,026	6,619	0	10,428	163,856
07-L1	木路原	63,797	77,291	40,170	10,518	533	174	192,483	242	0	242	301,236	26,038	2,991	4,408	7,399	11,622	0	45,059	539,020
07-L2	鍋ヶ丸	16,790	13,881	29,528	28,529	0	0	88,727	0	0	0	138,858	8,477	523	343	866	6,619	0	15,962	243,547
07-L3	竹	115,166	83,286	0	0	449	122	199,022	909	2,002	2,911	311,469	0	3,135	2,060	5,195	0	0	5,195	518,597
07-R1	久座仁	127,513	118,863	89,276	28,233	4,383	1,222	369,491	0	0	0	578,253	59,617	4,496	3,439	7,936	27,309	0	94,862	1,042,606
07-R2	多田	23,916	30,787	0	0	0	0	54,704	849	0	849	85,612	0	1,209	1,334	2,543	0	0	2,543	143,708
07-R3	市井原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R4	君谷湊	38,389	27,762	2,048	583	0	0	68,781	667	601	1,267	107,642	1,854	1,045	687	1,732	6,619	0	10,205	187,895
07-R5	君谷湊(支川)	9,597	11,976	0	0	734	204	22,512	2,208	0	2,208	35,231	0	453	565	1,018	0	0	1,018	60,969
08-L1	乙原	335,094	257,631	501,136	17,524	1,780	535	1,113,700	1,844	5,276	7,120	1,742,941	15,459	11,191	11,680	22,872	5,004	0	43,335	2,907,096
08-L2	筆瀬	371,527	324,696	16,972	9,292	2,757	813	726,056	138	883	1,020	1,136,278	12,399	11,295	9,959	21,253	16,299	0	49,951	1,913,305
08-L3	明塚	124,072	106,397	38,223	34,746	821	240	304,500	775	2,335	3,110	476,543	8,402	3,807	3,165	6,971	6,556	0	21,929	806,082
08-L5	上明塚	24,073	18,447	20,080	25,376	0	0	87,977	363	0	363	137,684	16,323	661	550	1,211	13,238	0	30,772	256,796
08-L4	野井	4,051	4,566	0	0	0	0	8,617	242	0	242	13,486	0	139	207	345	0	0	345	22,690
08-R1	栗原	436,911	364,028	36,322	10,045	5,395	1,489	854,190	485	0	485	1,336,807	29,096	13,287	9,827	23,113	26,350	0	78,559	2,270,041
08-R2	吾郷	0	0	917	150	795	217	2,078	1,150	21	1,171	3,252	1,108	0	0	0	470	0	1,578	8,079
08-R3	高畑	8,101	2,353	917	150	1,168	316	13,005	311	2,101	2,412	20,353	1,108	334	660	994	470	0	2,572	38,342
09-L1	亀村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R1	小原(邑智)	40,046	27,762	0	0	656	184	68,647	551	0	551	107,433	0	1,045	687	1,732	0	0	1,732	178,363
09-R4	狛淵	2,900	2,031	0	0	1,904	520	7,356	1,211	0	1,211	11,512	0	78	148	226	0	0	226	20,305
09-R5	浜原(下流)	4,051	4,566	31,219	22,699	0	0	62,535	242	0	242	97,867	5,151	139	207	345	3,726	0	9,222	169,866
09-R2	浜原	308,696	311,194	607,688	84,696	2,363	797	1,315,434	1,679	0	1,679	2,058,654	53,676	10,364	14,090	24,454	56,012	0	134,142	3,509,909
10-L1	滝原	6,858	7,410	0	0	63	20	14,351	390	175	565	22,459	0	314	358	672	0	0	672	38,047
09-R3	本郷	27,457	32,006	104,593	67,789	762	211	232,818	1,614	0	1,614	364,360	35,494	1,190	1,477	2,667	32,969	0	71,130	669,922
10-L2	石見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L3	信喜	24,073	29,457	0	0	305	95	53,931	0	1,652	1,652	84,402	0	1,057	1,408	2,464	0	0	2,464	142,449
10-R1	浜原ダム	0	0	0	0	0	0	0	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	311
10-R2	潮下(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R3	潮下(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-L1	都賀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R1	滝下(2)	6,122	7,116	0	0	0	0	13,237	0	0	0	20,716	0	272	276	548	0	0	548	34,501
11-R3	潮上	19,332	20,618	13,684	21,283	393	117	75,427	0	0	0	118,043	8,516	821	1,077	1,898	8,876	0	19,290	212,760
11-R2	曲利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L1	郷上	148,491	100,710	4,127	883	1,167	317	255,695	1,468	0	1,468	400,163	3,780	4,107	4,492	8,599	3,745	0	16,124	673,450
12-L3	山根	39,885	33,029	10,549	20,782	906	247	105,396	1,212	0	1,212	164,945	5,931	1,228	1,310	2,538	6,556	0	15,025	286,578
12-L4	高梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L5	大浦(下流)	0	0	0	0	0	0	0	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	128
12-L6	大浦	43,130	32,034	0	0	1,221	366	76,750	1,651	0	1,651	120,114	0	1,187	1,041	2,228	0	0	2,228	200,743
12-R1	松原	8,792	7,116	0	0	0	0	15,907	0	0	0	24,894	0	272	276	548	0	0	548	41,349
12-R2	雪谷	97,421	68,522	0	0	894	267	167,105	1,940	0	1,940	261,519	0	2,532	1,699	4,232	0	0	4,232	434,796
12-R3	原	0	0	0	0	24	9	33	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	85
13-L1	都賀西	48,467	36,453	19,284	10,290	185	58	114,736	370	359	729	179,562	10,439	1,342	1,110	2,452	11,426	0	24,317	319,344
13-L2	乙谷	8,792	7,116	0	0	18	6	15,931	243	0	243	24,932	0	272	276	548	0	0	548	41,654
13-R1	都賀本郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R2	上野(下流)	29,965	29,219	9,587	1,367	64	22	70,223	322	0	322	109,899	4,804	970	1,558	2,528	7,781	0	15,113	195,557
13-R3	上野(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R4	上野(上流Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L1	下郷(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L2	下郷	0	0	0	0	281	76	358	873	0	873	560	0	0	0	0	0	0	0	1,791
14-R1	柳原(作木)	28,871	24,974	8,390	1,427	283	82	64,028	0	0	0	100,204	4,652	895	891	1,786	1,714	0	8,152	172,384
14-R2	柳原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L1	引城	19,057	13,881	0	0	0	0	32,938	0	376	376	51,548	0	523	343	866	0	0	866	85,728
15-L2	西之原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L3	西之原	273,179	220,022	47,358	17,211	3,422	1,009	562,200	6,559	0	6,559	879,843	32,044	8,012	6,367	14,379	26,650	0	73,073	1,521,675
15-R1	伊賀和志	113,425	98,455	95,403	18,676	3,845	1,140	330,944	966	0	966	517,927	37,360	3,619	3,685	7,304	11,270	0	55,934	905,771
16-L1	坂谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式－3　被害額(事業実施前)　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成27年度末河道)　流量規模：1/50　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
16-L2	坂谷(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L3	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R1	井手平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R5	大津	7,711	9,133	3,710	4,639	0	0	25,193	0	0	0	39,427	1,668	277	413	690	1,714	0	4,072	68,692
16-R2	折敷谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R3	式	39,364	31,236	0	0	2,655	780	74,034	743	0	743	115,863	0	1,380	1,913	3,293	0	0	3,293	193,933
16-R4	丹渡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L0	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L1	青山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L2	上ヶ畑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R1	港	20,416	13,363	10,739	4,151	126	39	48,834	0	0	0	76,425	7,802	636	1,216	1,852	3,715	0	13,369	138,628
17-R2	熊見下(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R3	熊見下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L1	川根	20,021	14,175	0	0	1,261	340	35,797	369	0	369	56,022	0	564	426	990	0	0	990	93,178
18-L2	川根(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L3	竹貞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L4	梶矢(下流)	223,156	177,020	48,124	24,834	5,281	1,492	479,906	4,195	376	4,571	751,053	33,668	6,356	4,794	11,150	23,520	0	68,338	1,303,868
18-R1	熊見	0	0	0	0	514	149	664	0	0	0	1,039	0	0	0	0	0	0	0	1,703
18-R2	香淀	0	0	0	0	0	0	0	421	0	421	0	0	0	0	0	0	0	0	421
18-R3	門田(下流)	4,819	4,860	0	0	0	0	9,680	138	0	138	15,149	0	180	289	469	0	0	469	25,436
19-L1	梶矢(上流)	30,448	32,496	98,584	56,884	1,570	463	220,445	1,409	188	1,597	344,996	17,328	1,099	1,378	2,477	3,428	0	23,233	590,271
19-L2	林	0	0	0	0	0	0	0	1,002	0	1,002	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002
19-L3	式敷	2,904	2,031	7,306	1,342	0	0	13,584	3,429	0	3,429	21,259	4,680	78	148	226	4,651	0	9,557	47,829
19-L4	信木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R1	門田(上流)	258,961	36,985	0	0	200	65	296,211	1,809	0	1,809	463,570	0	1,395	1,335	2,730	0	0	2,730	764,320
19-R2	川毛	41,291	38,603	6,336	5,058	779	227	92,294	1,144	0	1,144	144,440	3,603	1,407	1,831	3,238	2,639	0	9,480	247,358
19-R3	上組	0	0	0	0	0	0	0	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	254
20-L1	所木	0	0	0	0	0	0	0	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	53
20-L2	船佐(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L3	船佐(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R1	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R2	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R3	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L1	下長谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L2	馬行谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L3	下津河内	11,369	11,682	0	0	0	0	23,051	136	0	136	36,075	0	411	482	893	0	0	893	60,155
21-R1	引字根	2,760	2,031	105,112	95,552	0	0	205,455	0	0	0	321,537	23,104	78	148	226	6,556	0	29,886	556,878
21-R2	下乙原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R3	日下	562,480	403,191	45,008	27,563	1,420	388	1,040,050	6,649	0	6,649	1,627,678	39,363	15,217	10,247	25,464	19,857	0	84,684	2,759,061
22-L1	荒瀬(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L2	岩脇	4,491	4,566	0	0	0	0	9,057	0	0	0	14,174	0	139	207	345	0	0	345	23,576
22-L3	十日市・南畑敷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R1	板崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R2	中所	1,156,284	986,723	395,862	252,933	5,485	1,544	2,798,830	0	0	0	4,380,169	108,824	35,355	26,955	62,310	36,632	0	207,766	7,386,765
22-R3	三次町	12,080,652	5,274,871	1,283,885	587,389	8,590	2,669	19,238,056	0	0	0	30,107,558	406,490	190,490	176,506	366,996	620,183	0	1,393,668	50,739,282
22-R4	寺戸桧原	1,780,514	1,370,277	4,922,425	1,000,615	9,856	2,711	9,086,398	5,990	5,483	11,473	14,220,213	508,383	50,098	36,918	87,017	202,642	0	798,042	24,116,126
22-R5	畠敷町(Ⅰ・Ⅱ)	3,468,763	1,180,854	238,112	93,690	4,767	1,511	4,987,698	5,719	995	6,713	7,805,747	100,168	50,814	85,779	136,592	70,703	0	307,463	13,107,621
22-R6	畠敷町(Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L1	中ノ村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L2	亀谷	6,615	6,597	0	0	0	0	13,213	277	0	277	20,678	0	217	354	571	0	0	571	34,739
23-L3	米丸	20,657	17,355	128,350	78,744	804	251	246,161	998	0	998	385,242	28,293	640	704	1,344	14,933	0	44,570	676,971
23-L4	旭	108,273	11,542	0	0	0	0	119,814	1,846	0	1,846	187,509	0	499	897	1,395	0	0	1,395	310,564
23-L5	上村	3,855	4,566	85,853	62,423	0	0	156,697	779	0	779	245,231	14,165	139	207	345	3,726	0	18,236	420,943
23-R1	大村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R2	船所	34,172	34,821	31,147	5,325	1,181	413	107,059	949	0	949	167,547	14,464	1,219	1,608	2,827	15,212	0	32,503	308,058
23-R3	青河	13,231	9,805	6,462	10,182	151	44	39,874	3,308	0	3,308	62,403	2,727	462	832	1,294	3,726	0	7,747	113,332
23-R4	鈴江	3,855	4,566	0	0	229	81	8,732	1,235	0	1,235	13,666	0	139	207	345	0	0	345	23,978
24-L1	若屋	0	0	0	0	0	0	0	1,461	0	1,461	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461
24-L2	秋町	1,100,629	420,978	75,234	57,093	5,112	1,526	1,660,572	10,044	0	10,044	2,598,795	24,823	15,210	13,602	28,813	35,361	0	88,998	4,358,409
24-R1	片山	42,386	40,438	8,931	1,914	0	0	93,670	2,592	0	2,592	146,594	4,529	1,542	1,668	3,210	3,726	0	11,465	254,321
24-R2	下志和地	144,888	34,171	14,415	7,576	560	173	201,782	5,881	0	5,881	315,789	6,187	1,845	3,435	5,281	4,920	0	16,388	539,840
25-L1	深瀬	289,958	81,538	24,331	25,343	1,126	387	422,683	6,759	0	6,759	661,499	8,082	2,825	3,079	5,904	6,570	0	20,556	1,111,497

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施前)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成27年度末河道)　　流量規模：1/50　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
25-L2	甲立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R1	上志和地	1,792,336	806,093	96,266	80,970	10,023	3,126	2,788,813	18,629	2,257	20,886	4,364,492	39,981	29,438	26,211	55,649	64,802	0	160,432	7,334,623
25-R2	川立	130,767	28,080	0	0	0	0	158,847	1,750	0	1,750	248,596	0	980	811	1,791	0	0	1,791	410,984
26-R1	高田原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R2	法恩時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-L1	篠原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L1	市ヶ原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L2	高屋	0	0	17,406	4,958	1,161	316	23,841	1,287	0	1,287	37,311	15,356	0	0	0	6,619	0	21,975	84,414
27-R1	下小原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R2	柳原(吉田)	2,028	588	0	0	0	0	2,617	1,117	0	1,117	4,096	0	83	165	248	0	0	248	8,078
27-R3	国司-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L1	内堀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L2	山手(-常友)	75,770	33,015	8,955	5,243	341	100	123,424	0	0	0	193,159	2,405	1,092	1,001	2,093	2,879	0	7,377	323,960
28-L3	桂	448,859	137,780	43,561	23,474	1,696	532	655,902	10,505	0	10,505	1,026,487	12,015	5,942	8,950	14,892	10,145	0	37,052	1,729,946
28-L4	長屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R1	国司-2	9,127	2,647	3,260	532	0	0	15,567	1,774	0	1,774	24,362	3,885	375	743	1,118	940	0	5,943	47,646
28-R2	下入江(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R3	下入江(上流)	135,754	39,867	2,326	1,899	714	229	180,790	10,375	1,220	11,595	282,936	899	2,017	3,474	5,491	1,176	0	7,565	482,886
28-R4	上入江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-L1	下土師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-R1	北原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L2	郷川	29,594	25,913	8,149	17,063	162	51	80,933	1,515	0	1,515	126,660	5,984	955	1,034	1,990	6,619	0	14,593	223,701
30-L3	中三原	6,309	4,062	38,054	5,250	437	147	54,259	378	0	378	84,915	10,189	156	295	452	3,428	0	14,069	153,621
30-L5	下三原	16,736	14,231	0	0	211	80	31,258	225	0	225	48,919	0	544	552	1,096	0	0	1,096	81,498
30-L4	小松原	1,095	294	88,479	62,841	2,267	750	155,726	2,050	0	2,050	243,711	16,100	42	83	124	4,651	0	20,875	422,362
30-R2	向三原	27,907	22,635	0	0	0	0	50,542	1,174	0	1,174	79,098	0	826	1,214	2,040	0	0	2,040	132,854
30-R3	下布野	0	0	0	0	0	0	0	405	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	405
30-R4	鈩	1,095	294	0	0	0	0	1,389	0	0	0	2,174	0	42	83	124	0	0	124	3,687
30-R5	河戸	105,389	38,874	83,028	26,959	1,132	402	255,786	498	1,503	2,001	400,305	8,099	1,451	1,781	3,232	4,022	0	15,353	673,445
1/80区間の合計		4,363,161	1,714,448	546,495	365,677	23,097	7,179	7,020,057	81,564	3,477	85,041	10,986,389	177,810	64,665	67,947	132,612	174,736	0	485,158	18,576,645
1/100区間の合計		45,062,090	28,382,786	14,226,395	5,162,893	175,825	50,118	93,060,107	110,629	99,257	209,886	145,639,067	3,848,527	1,050,003	903,424	1,953,428	2,891,747	0	8,693,702	247,602,762
合計		49,425,251	30,097,234	14,772,890	5,528,570	198,922	57,297	100,080,162	192,193	102,734	294,926	156,625,452	4,026,337	1,114,668	971,371	2,086,040	3,066,483	0	9,178,860	266,179,400

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施前)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成27年度末河道)　　流量規模：1/80　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
01-L1	江津	1,015,110	441,529	418,085	153,248	757	263	2,028,992	0	0	0	3,175,372	116,108	16,180	23,475	39,655	55,510	0	211,273	5,415,637
01-L2	本町	295,582	338,998	74,514	18,663	737	226	728,720	0	0	0	1,140,447	10,721	12,263	11,934	24,197	18,808	0	53,726	1,922,893
01-L6	郷田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L3	千金(下流)	34,202	27,762	0	0	187	52	62,203	286	0	286	97,348	0	1,045	687	1,732	0	0	1,732	161,569
01-L7	千金(上流)	183,886	176,740	44,318	29,823	752	207	435,727	430	3,742	4,172	681,913	38,505	6,435	4,794	11,229	19,857	0	69,591	1,191,403
01-L4	田野村	140,006	139,748	0	0	1,353	366	281,472	970	2,348	3,318	440,504	0	4,935	3,589	8,524	0	0	8,524	733,818
01-L5	赤栗	47,571	51,994	0	0	2,920	790	103,275	0	1,793	1,793	161,625	0	1,769	1,304	3,073	0	0	3,073	269,766
01-R1	渡津	2,217,575	925,577	953,730	392,259	922	313	4,490,376	0	0	0	7,027,438	283,727	33,593	35,714	69,307	89,623	0	442,657	11,960,471
01-R5	長田	4,047,207	3,238,276	657,277	187,587	7,642	2,117	8,140,105	0	4,035	4,035	12,739,264	131,823	118,679	84,979	203,658	177,250	0	512,731	21,396,135
01-R2	太田	156,893	156,718	0	0	591	167	314,369	1,819	0	1,819	491,987	0	5,660	4,779	10,439	0	0	10,439	818,614
01-R3	八神(下流)	209,007	183,203	24,804	12,162	1,421	386	430,985	3,923	952	4,875	674,492	20,425	6,795	5,004	11,799	13,238	0	45,462	1,155,814
01-R4	八神(上流)	167,011	149,305	111,578	40,892	286	78	469,152	3,395	3,228	6,623	734,223	16,903	5,619	4,149	9,768	13,238	0	39,909	1,249,907
02-L1	川平(本川)	371,439	316,029	85,257	38,210	3,176	892	815,002	0	3,949	3,949	1,275,478	62,224	12,017	9,145	21,162	56,960	0	140,346	2,234,775
01-L8	瀬尻(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L2	瀬尻(上流)	68,403	55,524	0	0	144	40	124,112	485	1,076	1,561	194,235	0	2,090	1,373	3,463	0	0	3,463	323,371
02-L3	小松	46,751	41,055	0	0	0	0	87,805	0	404	404	137,415	0	1,529	1,095	2,624	0	0	2,624	228,248
02-L4	仁万瀬	51,303	41,643	0	0	0	0	92,945	0	0	0	145,459	0	1,568	1,030	2,598	0	0	2,598	241,002
01-L9	田野Ⅰ	275,562	240,360	0	0	860	238	517,021	707	538	1,245	809,138	0	8,985	6,442	15,428	0	0	15,428	1,342,832
02-L7	田野Ⅱ	26,984	25,353	102,335	85,990	2,954	802	244,417	2,506	0	2,506	382,513	40,922	993	997	1,990	14,163	0	57,075	686,511
02-L8	川平(支川)	188,110	152,690	0	0	1,550	420	342,770	212	0	212	536,435	0	5,748	3,776	9,524	0	0	9,524	888,941
02-L9	川平(その他)	0	0	0	0	63	17	80	556	0	556	125	0	0	0	0	0	0	0	761
02-R1	松川	577,739	510,247	61,924	18,436	9,666	2,652	1,180,665	11,829	0	11,829	1,847,741	49,640	18,708	13,423	32,131	29,052	0	110,823	3,151,058
01-R6	松川(上流)	859,451	462,870	28,130	10,250	7,190	1,975	1,369,865	1,940	4,304	6,244	2,143,839	16,216	17,188	11,751	28,940	35,948	0	81,105	3,601,053
02-R2	久坪	0	0	2,864	153	220	59	3,296	0	0	0	5,158	2,320	0	0	0	470	0	2,790	11,244
02-R3	橿原	63,195	54,641	0	0	0	0	117,837	364	269	633	184,415	0	2,010	1,356	3,366	0	0	3,366	306,251
02-R4	中長良	102,605	83,286	0	0	0	0	185,891	0	0	0	290,919	0	3,135	2,060	5,195	0	0	5,195	482,005
02-R5	上長良(本川)	191,698	176,740	184,971	154,088	466	126	708,089	485	807	1,292	1,108,159	55,986	6,365	4,670	11,036	26,350	0	93,372	1,910,912
02-R9	上長良(支川)	18,987	15,912	0	0	103	29	35,031	485	0	485	54,824	0	601	491	1,092	0	0	1,092	91,432
02-R6	大口(下流)	53,743	46,209	0	0	0	0	99,952	0	0	0	156,425	0	1,706	1,236	2,943	0	0	2,943	259,320
02-R7	大口(上流)	68,403	55,524	0	0	0	0	123,927	485	2,422	2,907	193,946	0	2,090	1,373	3,463	0	0	3,463	324,243
02-R8	下原	604,231	499,181	206,230	172,748	5,045	1,382	1,488,816	1,791	1,076	2,868	2,329,997	83,267	18,753	12,550	31,303	33,095	0	147,665	3,969,346
02-L6	志谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L4	川戸	1,757,572	844,572	182,856	147,761	4,766	1,313	2,938,839	0	3,513	3,513	4,599,283	94,080	31,696	21,539	53,235	131,877	0	279,193	7,820,828
03-L1	川戸(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L5	近原	17,101	13,881	0	0	0	0	30,982	0	340	340	48,487	0	523	343	866	0	0	866	80,675
03-L2	猪ノ瀬	11,893	12,998	0	0	0	0	24,891	0	0	0	38,954	0	442	326	768	0	0	768	64,613
03-L3	花河原	17,101	13,881	0	0	0	0	30,982	0	0	0	48,487	0	523	343	866	0	0	866	80,335
03-R1	下原(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R2	臼木(下流)	14,333	17,565	134,820	120,225	623	170	287,735	0	1,076	1,076	450,305	56,635	581	533	1,114	41,302	0	99,051	838,167
03-R3	臼木(上流)	31,434	31,446	0	0	150	41	63,070	0	0	0	98,705	0	1,103	876	1,979	0	0	1,979	163,754
03-R4	元折	63,851	54,935	946	1,135	786	213	121,868	364	0	364	190,723	927	2,052	1,438	3,490	470	0	4,887	317,842
03-L5	小原-桜江	17,101	13,881	0	0	0	0	30,982	0	0	0	48,487	0	523	343	866	0	0	866	80,335
04-L1	田津	637,653	527,153	9,215	2,625	2,943	823	1,180,413	485	20,592	21,077	1,847,346	8,225	19,863	13,629	33,492	13,238	0	54,955	3,103,791
04-L3	恵梨	34,202	27,762	5,119	1,458	0	0	68,541	0	0	0	107,267	4,517	1,045	687	1,732	6,619	0	12,868	188,676
04-L4	川越(下流)	69,880	66,757	40,231	6,557	0	0	183,425	0	538	538	287,060	23,726	2,372	1,665	4,037	10,345	0	38,108	509,131
04-L2	川越(上流)	1,345,067	1,126,364	264,374	87,459	8,584	2,355	2,834,203	3,397	5,383	8,779	4,435,528	215,818	42,222	28,849	71,072	126,605	0	413,495	7,692,005
04-R1	榎谷	81,998	80,554	83,662	80,832	1,209	352	328,608	0	0	0	514,272	24,017	2,965	2,390	5,355	6,619	0	35,991	878,871
04-R2	久井谷	204,267	185,481	0	0	2,145	582	392,475	0	1,159	1,159	614,223	0	6,784	4,883	11,667	0	0	11,667	1,019,524
04-R5	和田	239,412	194,333	16,898	4,529	1,966	533	457,671	0	2,153	2,153	716,255	11,717	7,316	4,806	12,122	6,556	0	30,395	1,206,474
04-R3	大貫	553,417	478,701	127,458	34,708	2,738	746	1,197,768	485	538	1,023	1,874,507	95,707	17,783	12,475	30,258	53,632	0	179,597	3,252,895
04-R4	坂本	49,088	64,040	0	0	1,504	418	115,050	970	0	970	180,053	0	2,450	2,483	4,933	0	0	4,933	301,006
05-L1	鹿賀(下流)	97,397	82,403	0	0	199	54	180,053	0	0	0	281,783	0	3,055	2,043	5,098	0	0	5,098	466,934
05-L2	鹿賀(上流)	419,812	364,840	0	0	1,901	521	787,075	0	3,722	3,722	1,231,772	0	13,604	9,572	23,176	0	0	23,176	2,045,745
05-R1	渦巻	88,457	91,872	16,898	4,529	575	155	202,486	0	0	0	316,891	11,717	3,176	2,300	5,476	6,556	0	23,749	543,126
05-R2	瀬尻(川本町)	17,101	13,881	4,095	1,167	84	23	36,351	0	120	120	56,889	3,709	523	343	866	6,619	0	11,194	104,554
05-R3	久料谷	234,204	193,451	0	0	924	251	428,829	121	718	839	671,117	0	7,235	4,789	12,024	0	0	12,024	1,112,809
05-R4	尾原	291,574	255,558	54,393	52,811	1,754	476	656,565	0	2,269	2,269	1,027,524	29,365	9,539	6,629	16,169	19,857	0	65,391	1,751,749
05-R5	松ヶ崎	51,303	41,643	24,606	13,380	0	0	130,932	0	0	0	204,909	19,736	1,568	1,030	2,598	13,238	0	35,572	371,413
06-L1	因原	3,109,733	1,356,091	504,786	269,949	10,283	2,800	5,253,643	849	477	1,326	8,221,951	257,145	50,784	34,279	85,063	157,697	0	499,905	13,976,825
06-L0	因原(支川)	64,995	21,502	9,508	6,134	218	59	102,417	0	477	477	160,283	4,587	809	532	1,341	2,504	0	8,431	271,608
06-L2	日向	63,495	65,875	39,766	31,446	558	154	201,294	121	0	121	315,025	17,749	2,291	1,648	3,939	19,857	0	41,545	557,985
06-L5	谷(本川)	260,260	222,361	222,448	117,798	639	173	823,680	0	0	0	1,289,059	175,410	8,278	5,606	13,884	72,746	0	262,040	2,374,779

様式－3　被害額(事業実施前)　水系名:江の川　河川名:江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成27年度末河道)　流量規模:1/80　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
06-L3	谷(支川)	856,133	742,329	130,919	76,250	2,301	626	1,808,559	0	0	0	2,830,395	57,081	27,468	18,677	46,145	46,333	0	149,559	4,788,513
06-L4	川本	1,720,508	1,527,771	427,538	229,686	1,633	443	3,907,577	0	0	0	6,115,358	237,613	57,291	38,226	95,517	310,673	0	643,803	10,666,738
06-R1	木谷	16,065	21,347	0	0	27	10	37,449	0	0	0	58,608	0	817	828	1,644	0	0	1,644	97,701
06-R2	下三島	82,620	101,061	138,437	58,724	841	254	381,936	0	517	517	597,730	64,987	3,606	3,475	7,080	40,197	0	112,264	1,092,447
06-R3	上三島	262,213	268,570	72,446	29,234	536	155	633,154	1,091	159	1,250	990,886	41,814	9,644	8,031	17,675	15,921	0	75,410	1,700,700
06-R5	谷戸(本川)	16,790	13,881	0	0	35	10	30,715	0	0	0	48,069	0	523	343	866	13,238	0	14,104	92,888
06-R4	谷戸(支川)	49,020	52,008	8,255	1,690	557	154	111,684	0	477	477	174,785	5,260	2,161	2,693	4,854	7,089	0	17,203	304,149
07-L1	木路原	171,923	213,705	102,381	37,762	1,236	407	527,414	321	0	321	825,403	54,730	8,073	8,093	16,166	29,730	0	100,626	1,453,764
07-L2	銅ヶ丸	16,790	13,881	29,528	28,529	0	0	88,727	0	0	0	138,858	8,477	523	343	866	6,619	0	15,962	243,547
07-L3	竹	115,166	83,286	0	0	449	122	199,022	909	2,002	2,911	311,469	0	3,135	2,060	5,195	0	0	5,195	518,597
07-R1	久座仁	161,052	149,161	99,203	37,699	4,687	1,291	453,093	0	0	0	709,091	72,636	5,472	3,938	9,409	33,439	0	115,484	1,277,668
07-R2	多田	103,315	107,280	0	0	0	0	210,595	1,048	0	1,048	329,581	0	3,842	2,951	6,794	0	0	6,794	548,018
07-R3	市井原	13,694	22,831	0	0	0	0	36,525	0	0	0	57,162	0	694	1,033	1,726	0	0	1,726	95,413
07-R4	君谷湊	38,389	27,762	2,048	583	0	0	68,781	667	601	1,267	107,642	1,854	1,045	687	1,732	6,619	0	10,205	187,895
07-R5	君谷湊(支川)	24,327	26,711	0	0	898	251	52,187	2,729	0	2,729	81,673	0	931	956	1,887	0	0	1,887	138,476
08-L1	乙原	624,827	594,485	1,111,747	66,972	4,066	1,209	2,403,305	2,519	8,408	10,927	3,761,172	48,179	20,705	19,874	40,579	18,617	0	107,375	6,282,779
08-L2	�肇瀬	604,528	452,692	31,168	18,947	4,073	1,171	1,112,579	468	1,081	1,549	1,741,186	19,091	17,002	13,369	30,371	26,130	0	75,592	2,930,906
08-L3	明塚	179,147	135,546	39,370	38,039	1,065	307	393,473	775	2,335	3,110	615,785	11,302	4,927	3,831	8,758	6,619	0	26,679	1,039,047
08-L5	上明塚	27,917	20,996	20,080	25,376	0	0	94,369	363	0	363	147,687	16,323	795	619	1,414	13,238	0	30,975	273,394
08-L4	野井	7,894	7,116	0	0	0	0	15,010	242	0	242	23,491	0	272	276	548	0	0	548	39,291
08-R1	栗原	528,694	410,895	36,859	10,500	5,840	1,600	994,388	485	0	485	1,556,217	33,379	15,178	10,470	25,647	26,476	0	85,502	2,636,592
08-R2	吾郷	75,051	53,451	11,604	2,251	2,308	646	145,310	1,508	2,687	4,195	227,410	7,052	2,063	2,373	4,436	5,576	0	17,064	393,979
08-R3	高畑	39,217	40,886	4,195	714	1,330	368	86,710	485	2,208	2,692	135,701	2,326	1,308	2,030	3,338	1,714	0	7,378	232,481
09-L1	亀村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R1	小原(邑智)	72,082	48,954	13,384	8,190	2,041	573	145,225	2,372	0	2,372	227,277	4,994	1,952	2,410	4,363	3,700	0	13,057	387,931
09-R4	狛淵	7,894	7,116	0	0	1,992	558	17,560	1,211	0	1,211	27,481	0	272	276	548	0	0	548	46,800
09-R5	浜原(下流)	7,894	7,116	38,223	34,746	0	0	87,978	242	0	242	137,686	8,402	272	276	548	6,556	0	15,506	241,412
09-R2	浜原	543,470	491,590	1,050,599	176,735	3,343	1,095	2,266,832	1,974	0	1,974	3,547,592	85,619	18,408	18,634	37,042	103,119	0	225,780	6,042,178
10-L1	滝原	18,205	19,596	0	0	120	35	37,955	485	601	1,085	59,400	0	659	680	1,339	0	0	1,339	99,779
09-R3	本郷	68,768	71,520	106,057	73,051	840	231	320,466	1,635	0	1,635	501,529	40,442	2,572	2,377	4,949	33,095	0	78,486	902,116
10-L2	石見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L3	信喜	32,658	38,169	0	0	357	112	71,296	0	2,012	2,012	111,578	0	1,329	1,599	2,928	0	0	2,928	187,814
10-R1	浜原ダム	0	0	0	0	0	0	0	363	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	363
10-R2	潮下(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R3	潮下(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-L1	都賀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R1	滝下(2)	6,122	7,116	0	0	0	0	13,237	0	0	0	20,716	0	272	276	548	0	0	548	34,501
11-R3	潮上	40,322	48,772	276,248	30,883	1,347	454	398,026	0	0	0	622,911	19,518	1,795	2,088	3,883	16,783	0	40,184	1,061,121
11-R2	曲利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L1	郷上	299,537	237,447	33,175	7,985	2,974	847	581,964	1,993	0	1,993	910,774	22,790	8,403	8,468	16,872	24,799	0	64,461	1,559,192
12-L3	山根	72,634	59,404	11,375	22,834	941	255	167,443	1,281	0	1,281	262,048	8,578	2,083	1,663	3,746	7,089	0	19,413	450,185
12-L4	高梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L5	大浦(下流)	0	0	0	0	0	0	0	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	145
12-L6	大浦	71,967	53,675	2,342	138	1,631	451	130,203	1,746	0	1,746	203,768	798	2,000	1,721	3,721	1,714	0	6,233	341,950
12-R1	松原	16,824	13,293	0	0	0	0	30,116	0	0	0	47,132	0	484	409	893	0	0	893	78,141
12-R2	響谷	103,336	69,699	0	0	1,256	345	174,636	2,019	0	2,019	273,305	0	2,654	1,799	4,453	0	0	4,453	454,413
12-R3	原	0	0	0	0	52	14	66	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	169
13-L1	都賀西	247,324	193,947	101,928	62,654	851	277	606,981	3,125	462	3,588	949,925	45,186	7,137	6,987	14,124	42,897	0	102,207	1,662,701
13-L2	乙谷	15,673	12,998	0	0	32	9	28,712	321	0	321	44,934	0	442	326	768	0	0	768	74,735
13-R1	都賀本郷	204,785	166,991	63,768	24,713	741	233	461,231	0	0	0	721,827	32,260	6,097	5,956	12,053	50,701	0	95,014	1,278,072
13-R2	上野(下流)	66,259	60,972	18,313	3,285	91	33	148,954	397	0	397	233,113	8,895	2,261	2,492	4,753	19,555	0	33,203	415,667
13-R3	上野(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R4	上野(上流Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L1	下郷(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L2	下郷	41,020	35,130	0	0	377	110	76,637	1,399	0	1,399	119,937	0	1,162	1,065	2,227	0	0	2,227	200,200
14-R1	柳原(作木)	53,777	44,444	17,892	4,795	429	116	121,454	0	0	0	190,076	12,406	1,546	1,202	2,748	6,556	0	21,710	333,240
14-R2	柳原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L1	引城	19,057	13,881	0	0	0	0	32,938	0	376	376	51,548	0	523	343	866	0	0	866	85,728
15-L2	西之原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L3	西之原	479,437	364,840	83,081	49,006	6,371	1,776	984,512	7,940	0	7,940	1,540,761	64,484	13,559	9,341	22,900	51,773	0	139,157	2,672,370
15-R1	伊賀和志	285,665	231,578	174,660	42,010	5,675	1,560	741,147	1,158	0	1,158	1,159,895	76,745	8,437	6,532	14,969	21,508	0	113,222	2,015,422
16-L1	坂谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式－3　　被害額(事業実施前)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成27年度末河道)　　流量規模：1/80　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
16-L2	坂谷(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L3	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R1	井手平	25,826	22,873	3,667	599	258	95	53,318	152	0	152	83,443	4,431	980	1,473	2,453	940	0	7,824	144,737
16-R5	大津	36,757	30,941	9,032	15,769	0	0	92,500	0	0	0	144,763	5,767	1,166	1,195	2,361	7,026	0	15,154	252,417
16-R2	折敷谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R3	式	142,515	128,682	0	0	4,913	1,360	277,470	808	0	808	434,241	0	4,639	3,905	8,544	0	0	8,544	721,063
16-R4	丹渡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L0	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L1	青山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L2	上ヶ畑	5,520	4,062	0	0	0	0	9,582	0	0	0	14,996	0	156	295	452	0	0	452	25,030
17-R1	港	227,988	197,975	144,007	45,402	771	242	616,385	0	0	0	964,643	80,999	7,211	7,738	14,949	56,968	0	152,916	1,733,944
17-R2	熊見下(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R3	熊見下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L1	川根	40,831	33,561	0	0	1,554	446	76,392	811	0	811	119,553	0	1,331	1,349	2,680	0	0	2,680	199,436
18-L2	川根(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L3	竹貞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L4	梶矢(下流)	282,606	205,861	58,385	27,863	6,237	1,704	582,656	4,234	376	4,610	911,857	45,828	7,811	5,816	13,627	28,127	0	87,582	1,586,705
18-R1	熊見	0	0	0	0	724	200	924	0	0	0	1,446	0	0	0	0	0	0	0	2,370
18-R2	香淀	2,760	2,031	0	0	90	26	4,907	635	0	635	7,679	0	78	148	226	0	0	226	13,447
18-R3	門田(下流)	11,369	11,682	0	0	0	0	23,051	185	0	185	36,075	0	411	482	893	0	0	893	60,204
19-L1	梶矢(上流)	58,399	54,459	171,705	124,846	1,797	525	411,731	1,449	188	1,637	644,359	28,330	1,973	1,756	3,729	7,452	0	39,511	1,097,238
19-L2	林	0	0	0	0	0	0	0	1,134	0	1,134	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134
19-L3	式敷	7,906	7,116	17,778	4,024	155	55	37,034	3,763	0	3,763	57,958	9,756	272	276	548	10,282	0	20,586	119,341
19-L4	信木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R1	門田(上流)	621,744	101,661	4,901	1,396	736	224	730,662	2,323	0	2,323	1,143,486	4,438	3,647	2,824	6,471	1,760	0	12,669	1,889,140
19-R2	川毛	87,421	82,039	15,393	12,097	1,000	307	198,257	1,257	0	1,257	310,272	7,256	2,957	2,949	5,906	7,452	0	20,614	530,400
19-R3	上組	0	0	0	0	0	0	0	262	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	262
20-L1	所木	0	0	0	0	0	0	0	413	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	413
20-L2	船佐(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L3	船佐(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R1	唐香	72,579	72,302	3,279	5,934	1,818	541	156,453	374	0	374	244,849	1,853	2,579	2,160	4,739	2,327	0	8,919	410,595
20-R2	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R3	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L1	下長谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L2	馬行谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L3	下津河内	15,027	14,231	0	0	0	0	29,258	240	0	240	45,789	0	544	552	1,096	0	0	1,096	76,383
21-R1	引字根	7,513	7,116	108,268	104,607	0	0	227,504	0	0	0	356,044	31,081	272	276	548	6,619	0	38,248	621,796
21-R2	下乙原	2,760	2,031	0	0	0	0	4,791	0	0	0	7,498	0	78	148	226	0	0	226	12,515
21-R3	日下	562,480	403,191	45,008	27,563	1,420	388	1,040,050	6,649	0	6,649	1,627,678	39,363	15,217	10,247	25,464	19,857	0	84,684	2,759,061
22-L1	荒瀬(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L2	岩脇	8,368	7,116	14,138	3,225	108	30	32,983	257	0	257	51,618	10,392	272	276	548	7,496	0	18,436	103,294
22-L3	十日市・南畑敷町	45,696,613	21,119,432	13,787,618	3,622,980	57,418	17,354	84,301,416	8,587	575	9,162	131,931,716	2,645,005	754,770	706,396	1,461,166	2,621,706	0	6,727,877	222,970,171
22-R1	板崎	2,191	588	0	0	0	0	2,779	0	0	0	4,349	0	83	165	248	0	0	248	7,376
22-R2	中所	1,407,032	1,140,618	403,742	264,596	6,369	1,729	3,224,085	0	0	0	5,045,693	124,452	40,931	28,597	69,529	39,588	0	233,569	8,503,347
22-R3	三次町	17,981,419	7,543,438	1,662,998	822,564	12,382	3,622	28,026,423	0	0	0	43,861,352	585,912	272,540	220,394	492,934	878,145	0	1,956,991	73,844,766
22-R4	寺戸 桧原	2,206,985	1,632,740	4,961,530	1,027,050	10,968	3,026	9,842,299	5,990	6,765	12,755	15,403,198	539,240	60,534	41,421	101,955	218,238	0	859,433	26,117,685
22-R5	畠敷町(Ⅰ・Ⅱ)	5,865,552	2,118,838	406,807	150,128	10,009	3,083	8,554,418	8,726	5,121	13,847	13,387,664	164,102	82,727	147,255	229,982	116,616	0	510,699	22,466,628
22-R6	畠敷町(Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L1	中ノ村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L2	亀谷	11,369	11,682	0	0	0	0	23,051	331	0	331	36,075	0	411	482	893	0	0	893	60,350
23-L3	米丸	26,637	20,772	149,863	112,962	1,150	416	311,800	1,096	0	1,096	487,967	41,314	781	780	1,561	20,656	0	63,531	864,394
23-L4	旭	122,272	19,288	0	0	0	0	141,560	2,491	0	2,491	221,541	0	669	1,151	1,820	0	0	1,820	367,412
23-L5	上村	7,513	7,116	85,853	62,423	0	0	162,905	779	0	779	254,946	14,165	272	276	548	3,726	0	18,439	437,069
23-R1	大村	0	0	0	0	94	27	121	71	0	71	189	0	0	0	0	0	0	0	381
23-R2	船所	66,175	59,978	69,575	15,465	2,738	897	214,828	1,552	0	1,552	336,206	27,694	2,265	2,453	4,718	30,684	0	63,096	615,682
23-R3	青河	34,676	29,317	9,745	15,886	681	213	90,517	3,913	0	3,913	141,659	6,664	1,144	1,822	2,966	7,026	0	16,656	252,745
23-R4	鈴江	7,513	7,116	0	0	287	108	15,024	1,316	0	1,316	23,513	0	272	276	548	0	0	548	40,401
24-L1	若屋	1,928	588	0	0	0	0	2,516	1,638	0	1,638	3,938	0	83	165	248	0	0	248	8,340
24-L2	秋町	1,197,658	456,186	78,774	60,485	5,554	1,620	1,800,278	10,169	0	10,169	2,817,435	26,820	16,374	14,195	30,569	38,847	0	96,236	4,724,118
24-R1	片山	64,160	59,824	8,931	1,914	0	0	134,829	2,723	0	2,723	211,007	4,529	2,088	1,884	3,972	3,726	0	12,227	360,786
24-R2	下志和地	643,916	217,583	61,652	36,656	3,353	1,164	964,324	11,390	0	11,390	1,509,167	17,733	7,824	10,719	18,543	20,886	0	57,161	2,542,042
25-L1	深瀬	408,313	111,451	32,538	36,149	1,667	575	590,692	7,893	0	7,893	924,433	10,891	3,956	3,693	7,649	9,176	0	27,717	1,550,735

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施前)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成27年度末河道)　　流量規模：1/80　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
25-L2	甲立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R1	上志和地	2,015,480	895,237	103,462	89,746	11,230	3,406	3,118,560	19,330	2,257	21,587	4,880,546	44,374	32,579	27,728	60,307	72,979	0	177,660	8,198,353
25-R2	川立	163,224	33,006	0	0	0	0	196,230	2,039	0	2,039	307,100	0	1,193	949	2,142	0	0	2,142	507,511
26-R1	高田原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R2	法恩時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-L1	篠原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L1	市ヶ原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L2	高屋	1,014	294	18,081	5,769	1,174	320	26,652	1,646	0	1,646	41,710	16,018	42	83	124	7,089	0	23,231	93,239
27-R1	下小原	230,397	189,473	132,652	88,028	12,663	3,526	656,738	14,834	0	14,834	1,027,795	24,505	6,667	5,301	11,968	5,910	0	42,383	1,741,750
27-R2	柳原(吉田)	7,837	4,650	0	0	0	0	12,487	1,854	0	1,854	19,542	0	240	460	700	0	0	700	34,583
27-R3	国司-1	15,212	14,581	0	0	0	0	29,794	767	0	767	46,628	0	541	867	1,408	0	0	1,408	78,597
28-L1	内堀	4,850,508	1,297,662	1,402,482	726,971	3,536	1,204	8,282,363	3,202	0	3,202	12,961,898	310,828	46,487	66,661	113,148	130,737	0	554,713	21,802,176
28-L2	山手(-常友)	75,770	33,015	8,955	5,243	341	100	123,424	0	0	0	193,159	2,405	1,092	1,001	2,093	2,879	0	7,377	323,960
28-L3	桂	523,469	169,789	50,422	27,147	2,145	685	773,657	11,036	0	11,036	1,210,773	13,369	6,889	10,150	17,039	11,852	0	42,260	2,037,726
28-L4	長屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R1	国司-2	117,826	81,016	16,975	6,902	1,362	438	224,519	4,843	0	4,843	351,372	11,709	3,580	6,609	10,188	5,550	0	27,447	608,181
28-R2	下入江(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R3	下入江(上流)	201,584	58,868	3,002	2,393	1,263	389	267,499	12,452	1,220	13,672	418,636	1,224	2,808	4,974	7,783	1,377	0	10,384	710,191
28-R4	上入江	1,160,505	411,892	76,153	42,193	5,540	1,885	1,698,168	12,948	1,609	14,557	2,657,633	21,058	16,347	23,050	39,397	29,406	0	89,861	4,460,219
29-L1	下土師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-R1	北原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L2	郷川	65,255	57,275	15,569	26,342	263	75	164,779	1,943	0	1,943	257,879	9,320	1,955	1,815	3,769	10,047	0	23,136	447,737
30-L3	中三原	13,954	11,976	77,052	17,488	761	267	121,498	474	0	474	190,144	20,785	453	565	1,018	7,922	0	29,725	341,841
30-L5	下三原	23,285	20,114	0	0	337	102	43,838	256	0	256	68,606	0	714	602	1,316	0	0	1,316	114,016
30-L4	小松原	4,491	4,566	114,043	97,466	3,310	980	224,857	2,315	0	2,315	351,901	27,633	139	207	345	10,282	0	38,260	617,333
30-R2	向三原	65,737	57,709	0	0	0	0	123,446	1,674	634	2,307	193,193	0	2,081	2,119	4,199	0	0	4,199	323,145
30-R3	下布野	1,095	294	0	0	0	0	1,389	461	0	461	2,174	0	42	83	124	0	0	124	4,148
30-R4	鈩	4,250	2,325	0	0	0	0	6,575	0	0	0	10,290	0	120	230	350	0	0	350	17,215
30-R5	河戸	159,184	61,439	113,001	40,874	1,787	581	376,865	514	1,503	2,017	589,794	11,343	2,170	2,189	4,359	6,329	0	22,031	990,707
1/80区間の合計		11,954,955	4,190,385	2,309,114	1,336,332	54,777	16,973	19,862,536	130,312	5,086	135,397	31,084,869	595,300	154,604	185,728	340,333	402,506	0	1,338,139	52,420,941
1/100区間の合計		#########	57,617,077	31,092,841	9,945,803	282,080	80,881	205,172,432	138,768	113,106	251,874	321,094,856	7,494,080	2,100,217	1,837,552	3,937,770	6,343,151	0	17,775,001	544,294,163
合計		#########	61,807,462	33,401,955	11,282,135	336,857	97,854	225,034,967	269,080	118,192	387,264	352,179,722	8,089,380	2,254,821	2,023,281	4,278,099	6,745,657	0	19,113,137	596,715,090

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施前)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成27年度末河道)　　流量規模：1/100　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
01-L1	江津	1,065,173	469,487	451,154	167,394	777	272	2,154,256	0	0	0	3,371,411	122,877	17,133	24,661	41,794	59,842	0	224,514	5,750,181
01-L2	本町	383,953	428,838	82,385	22,351	950	272	918,750	0	0	0	1,437,844	13,069	15,262	14,082	29,344	23,406	0	65,819	2,422,413
01-L6	郷田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L3	千金(下流)	34,202	27,762	0	0	196	56	62,216	289	0	289	97,368	0	1,045	687	1,732	0	0	1,732	161,605
01-L7	千金(上流)	235,680	204,684	44,318	29,823	772	215	515,494	438	3,742	4,179	806,748	38,505	7,517	5,081	12,598	19,857	0	70,960	1,397,381
01-L4	田野村	172,485	150,043	1,732	283	1,370	371	326,284	970	2,348	3,318	510,634	2,092	5,507	3,725	9,232	470	0	11,794	852,030
01-L5	赤栗	57,987	53,759	0	0	2,943	797	115,486	0	1,793	1,793	180,736	0	1,930	1,339	3,268	0	0	3,268	301,283
01-R1	渡津	2,275,183	948,927	964,711	397,115	954	323	4,587,212	0	0	0	7,178,987	289,135	34,350	36,107	70,458	92,219	0	451,811	12,218,010
01-R5	長田	4,283,254	3,313,575	673,089	194,183	7,860	2,169	8,474,130	0	4,035	4,035	13,262,013	139,257	122,581	86,531	209,111	182,130	0	530,498	22,270,676
01-R2	太田	163,597	166,230	0	0	601	170	330,598	1,819	0	1,819	517,386	0	5,948	4,998	10,947	0	0	10,947	860,750
01-R3	八神(下流)	215,289	192,812	24,804	12,162	1,435	391	446,893	3,959	978	4,937	699,388	20,425	7,133	5,328	12,460	13,238	0	46,123	1,197,341
01-R4	八神(上流)	191,601	171,184	111,578	40,892	287	78	515,620	3,395	3,228	6,623	806,945	16,903	6,260	4,337	10,596	13,238	0	40,737	1,369,925
02-L1	川平(本川)	397,008	349,882	91,261	40,629	3,460	976	883,216	0	4,045	4,045	1,382,233	63,909	12,982	9,986	22,968	59,655	0	146,532	2,416,026
01-L8	瀬尻(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L2	瀬尻(上流)	68,403	55,524	0	0	144	40	124,112	485	1,076	1,561	194,235	0	2,090	1,373	3,463	0	0	3,463	323,371
02-L3	小松	53,189	43,674	0	0	0	0	96,863	0	404	404	151,591	0	1,646	1,177	2,823	0	0	2,823	251,681
02-L4	仁万瀬	51,303	41,643	0	0	0	0	92,945	0	0	0	145,459	0	1,568	1,030	2,598	0	0	2,598	241,002
01-L9	田野Ⅰ	278,576	242,909	0	0	866	241	522,592	707	538	1,245	817,856	0	9,119	6,512	15,631	0	0	15,631	1,357,324
02-L7	田野Ⅱ	29,978	32,454	103,543	86,206	3,045	835	256,060	2,546	0	2,546	400,734	41,415	1,192	1,262	2,454	14,952	0	58,821	718,161
02-L8	川平(支川)	188,110	152,690	0	0	1,550	420	342,770	212	0	212	536,435	0	5,748	3,776	9,524	0	0	9,524	888,941
02-L9	川平(その他)	0	0	0	0	67	18	86	556	0	556	135	0	0	0	0	0	0	0	777
02-R1	松川	656,128	557,857	76,438	29,353	9,967	2,721	1,332,465	11,987	0	11,987	2,085,308	61,513	21,015	14,940	35,955	35,323	0	132,791	3,562,551
01-R6	松川(上流)	902,316	477,873	28,553	10,703	7,465	2,028	1,428,939	1,940	4,304	6,244	2,236,290	16,839	17,758	11,904	29,662	36,938	0	83,439	3,754,912
02-R2	久坪	0	0	6,712	349	225	61	7,347	0	0	0	11,498	3,402	0	0	0	925	0	4,327	23,172
02-R3	橿原	68,403	55,524	0	0	0	0	123,927	364	269	633	193,946	0	2,090	1,373	3,463	0	0	3,463	321,969
02-R4	中長良	102,605	83,286	0	0	0	0	185,891	0	0	0	290,919	0	3,135	2,060	5,195	0	0	5,195	482,005
02-R5	上長良(本川)	216,365	187,035	184,971	154,088	467	127	743,053	485	807	1,292	1,162,878	55,986	7,007	4,930	11,937	26,350	0	94,273	2,001,496
02-R9	上長良(支川)	18,987	15,912	0	0	117	32	35,048	485	0	485	54,850	0	601	491	1,092	0	0	1,092	91,475
02-R6	大口(下流)	56,757	48,758	0	0	0	0	105,515	0	0	0	165,131	0	1,840	1,306	3,146	0	0	3,146	273,792
02-R7	大口(上流)	68,403	55,524	0	0	0	0	123,927	485	2,422	2,907	193,946	0	2,090	1,373	3,463	0	0	3,463	324,243
02-R8	下原	604,231	499,181	206,230	172,748	5,061	1,389	1,488,840	1,791	1,076	2,868	2,330,035	83,267	18,753	12,550	31,303	33,095	0	147,665	3,969,408
02-L6	志谷	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791	1,791	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791
03-L4	川戸	1,834,425	870,718	188,341	155,010	4,955	1,356	3,054,805	0	3,513	3,513	4,780,770	97,969	32,654	21,999	54,653	135,977	0	288,599	8,127,687
03-L1	川戸(支川)	15,697	9,948	4,410	3,434	72	25	33,586	0	992	992	52,562	1,675	331	454	785	1,331	0	3,791	90,931
02-L5	近原	17,101	13,881	0	0	0	0	30,982	0	340	340	48,487	0	523	343	866	0	0	866	80,675
03-L2	猪ノ瀬	11,893	12,998	0	0	0	0	24,891	0	0	0	38,954	0	442	326	768	0	0	768	64,613
03-L3	花河原	17,101	13,881	0	0	0	0	30,982	0	0	0	48,487	0	523	343	866	0	0	866	80,335
03-R1	下原(上流)	283,220	208,188	468,817	40,213	2,228	696	1,003,362	865	4,126	4,991	1,570,262	24,024	7,850	7,457	15,307	31,452	0	70,783	2,649,398
03-R2	臼木(下流)	22,555	20,996	140,501	130,248	632	174	315,106	0	1,076	1,076	493,141	64,783	795	619	1,414	43,440	0	109,637	918,960
03-R3	臼木(上流)	34,448	33,995	0	0	150	41	68,633	0	0	0	107,411	0	1,237	945	2,182	0	0	2,182	178,226
03-R4	元折	70,290	57,555	2,217	2,595	786	213	133,656	364	0	364	209,172	1,359	2,168	1,521	3,689	925	0	5,973	349,165
03-L5	小原-桜江	17,101	13,881	0	0	0	0	30,982	0	0	0	48,487	0	523	343	866	0	0	866	80,335
04-L1	田津	658,219	551,624	9,215	2,625	3,156	884	1,225,723	485	20,592	21,077	1,918,256	8,225	20,651	14,045	34,697	13,238	0	56,160	3,221,216
04-L3	恵梨	34,202	27,762	5,119	1,458	0	0	68,541	0	0	0	107,267	4,517	1,045	687	1,732	6,619	0	12,868	188,676
04-L4	川越(下流)	85,504	69,405	45,352	7,405	0	0	207,666	0	538	538	324,997	28,752	2,613	1,716	4,329	13,175	0	46,256	579,457
04-L2	川越(上流)	1,369,971	1,146,835	268,782	88,565	8,635	2,368	2,885,156	3,397	5,383	8,779	4,515,269	218,947	42,980	29,173	72,153	127,441	0	418,541	7,827,745
04-R1	榎谷	96,659	89,869	83,662	80,832	1,466	417	352,905	0	0	0	552,296	24,017	3,349	2,527	5,876	6,619	0	36,512	941,713
04-R2	久井谷	217,677	194,347	0	0	2,164	588	414,776	0	1,159	1,159	649,124	0	7,144	5,183	12,326	0	0	12,326	1,077,385
04-R5	和田	239,412	194,333	17,406	4,958	1,966	533	458,608	0	2,153	2,153	717,722	15,762	7,316	4,806	12,122	6,619	0	34,503	1,212,986
04-R3	大貫	578,346	505,562	136,836	37,218	2,745	750	1,261,456	485	538	1,023	1,974,179	102,437	18,698	13,104	31,802	60,889	0	195,127	3,431,785
04-R4	坂本	49,088	64,040	0	0	1,599	439	115,166	970	0	970	180,235	0	2,450	2,483	4,933	0	0	4,933	301,304
05-L1	鹿賀(下流)	102,605	83,286	0	0	199	54	186,144	0	0	0	291,315	0	3,135	2,060	5,195	0	0	5,195	482,654
05-L2	鹿賀(上流)	444,787	388,582	0	0	1,981	538	835,887	0	3,811	3,811	1,308,163	0	14,349	10,165	24,514	0	0	24,514	2,172,375
05-R1	渦巻	104,082	94,519	17,406	4,958	595	161	221,720	0	0	0	346,992	15,762	3,417	2,351	5,768	6,619	0	28,149	596,861
05-R2	瀬尻(川本町)	17,101	13,881	4,095	1,167	84	23	36,351	0	120	120	56,889	3,709	523	343	866	6,619	0	11,194	104,554
05-R3	久料谷	234,204	193,451	0	0	924	251	428,829	121	718	839	671,117	0	7,235	4,789	12,024	0	0	12,024	1,112,809
05-R4	尾原	314,443	269,088	54,393	52,811	1,760	477	692,973	0	2,269	2,269	1,084,503	29,365	10,040	6,764	16,804	19,857	0	66,026	1,845,771
05-R5	松ヶ崎	51,303	41,643	24,606	13,380	0	0	130,932	0	0	0	204,909	19,736	1,568	1,030	2,598	13,238	0	35,572	371,413
06-L1	因原	3,163,724	1,372,976	511,775	272,994	10,423	2,846	5,334,737	849	477	1,326	8,348,863	261,214	51,461	34,839	86,300	159,182	0	506,696	14,191,622
06-L0	因原(支川)	64,995	21,502	9,508	6,134	218	59	102,417	0	477	477	160,283	4,587	809	532	1,341	2,504	0	8,431	271,608
06-L2	日向	73,722	67,640	39,766	31,446	569	158	213,301	121	0	121	333,816	17,749	2,452	1,682	4,134	19,857	0	41,740	588,978
06-L5	谷(本川)	271,031	226,661	222,597	117,924	645	175	839,034	0	0	0	1,313,088	176,600	8,499	5,699	14,199	72,809	0	263,608	2,415,730

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施前)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成27年度末河道)　　流量規模：1/100　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
06-L3	谷(支川)	884,498	761,897	130,919	76,250	2,360	645	1,856,570	0	0	0	2,905,532	57,081	28,421	19,657	48,078	46,333	0	151,492	4,913,594
06-L4	川本	1,755,824	1,543,561	431,619	231,932	1,644	446	3,965,027	0	0	0	6,205,267	241,889	58,032	38,631	96,663	312,219	0	650,770	10,821,064
06-R1	木谷	16,065	21,347	0	0	27	10	37,449	0	0	0	58,608	0	817	828	1,644	0	0	1,644	97,701
06-R2	下三島	99,732	120,026	148,273	63,515	1,098	314	432,957	0	517	517	677,578	75,143	4,367	4,177	8,544	47,237	0	130,924	1,241,976
06-R3	上三島	312,280	306,753	84,521	39,507	571	168	743,801	1,091	159	1,250	1,164,049	46,590	11,214	8,783	19,998	20,329	0	86,917	1,996,017
06-R5	谷戸(本川)	16,790	13,881	0	0	35	10	30,715	0	0	0	48,069	0	523	343	866	13,238	0	14,104	92,888
06-R4	谷戸(支川)	82,116	97,040	28,845	6,255	776	216	215,249	637	477	1,114	336,865	13,722	3,363	3,663	7,026	10,345	0	31,093	584,321
07-L1	木路原	204,597	242,881	105,592	44,229	1,337	445	599,080	364	0	364	937,560	55,965	9,023	8,896	17,919	31,742	0	105,626	1,642,630
07-L2	銅ヶ丸	16,790	13,881	29,528	28,529	0	0	88,727	0	0	0	138,858	8,477	523	343	866	6,619	0	15,962	243,547
07-L3	竹	115,902	83,580	0	0	449	122	200,053	909	2,108	3,017	313,083	0	3,177	2,142	5,319	0	0	5,319	521,472
07-R1	久座仁	176,191	156,724	105,431	40,947	5,161	1,403	485,857	0	0	0	760,366	77,904	5,825	4,332	10,158	35,367	0	123,429	1,369,652
07-R2	多田	114,750	110,781	0	0	0	0	225,531	1,091	0	1,091	352,956	0	4,040	3,051	7,090	0	0	7,090	586,668
07-R3	市井原	30,610	35,578	0	0	0	0	66,187	0	0	0	103,583	0	1,361	1,379	2,741	0	0	2,741	172,511
07-R4	君谷湊	38,389	27,762	2,048	583	0	0	68,781	667	601	1,267	107,642	1,854	1,045	687	1,732	6,619	0	10,205	187,895
07-R5	君谷湊(支川)	48,377	43,730	0	0	985	281	93,372	3,056	0	3,056	146,127	0	1,671	1,534	3,205	0	0	3,205	245,760
08-L1	乙原	797,368	724,498	1,127,461	80,146	4,397	1,354	2,735,225	2,545	8,408	10,953	4,280,627	54,704	27,513	23,414	50,927	32,701	0	138,332	7,165,137
08-L2	箪瀬	681,236	516,732	36,213	27,005	4,616	1,298	1,267,100	770	1,266	2,036	1,983,012	22,862	18,987	14,543	33,530	30,972	0	87,364	3,339,512
08-L3	明塚	203,542	152,214	39,370	38,039	1,232	342	434,738	775	2,335	3,110	680,365	11,302	5,715	4,324	10,038	6,619	0	27,959	1,146,172
08-L5	上明塚	27,917	20,996	20,080	25,376	0	0	94,369	442	0	442	147,687	16,323	795	619	1,414	13,238	0	30,975	273,473
08-L4	野井	14,891	12,998	0	0	0	0	27,889	242	0	242	43,646	0	442	326	768	0	0	768	72,545
08-R1	栗原	562,687	429,581	36,859	10,500	6,079	1,679	1,047,384	485	0	485	1,639,156	33,379	15,856	10,746	26,601	26,476	0	86,456	2,773,481
08-R2	吾郷	94,291	83,888	20,448	4,678	2,542	736	206,583	1,562	2,809	4,371	323,302	12,332	2,814	3,019	5,833	11,996	0	30,161	564,417
08-R3	高畑	83,797	74,699	7,307	1,566	1,550	449	169,369	485	2,276	2,761	265,062	3,803	2,823	3,132	5,956	3,726	0	13,485	450,677
09-L1	亀村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R1	小原(邑智)	89,251	79,518	29,803	24,474	2,232	626	225,904	2,610	0	2,610	353,540	8,563	2,667	3,194	5,861	8,868	0	23,292	605,346
09-R4	狛淵	7,894	7,116	0	0	2,052	569	17,631	1,280	0	1,280	27,593	0	272	276	548	0	0	548	47,052
09-R5	浜原(下流)	14,891	12,998	39,370	38,039	0	0	105,298	242	0	242	164,791	11,302	442	326	768	6,619	0	18,689	289,020
09-R2	浜原	913,892	799,436	1,092,966	250,572	4,942	1,399	3,063,207	2,196	0	2,196	4,793,919	121,510	27,777	22,054	49,831	163,395	0	334,736	8,194,058
10-L1	滝原	24,327	26,711	0	0	170	52	51,260	553	2,098	2,652	80,222	0	931	956	1,887	0	0	1,887	136,021
09-R3	本郷	82,209	86,829	106,057	73,051	854	236	349,236	1,704	0	1,704	546,554	40,442	3,061	2,923	5,984	33,095	0	79,521	977,015
10-L2	石見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L3	信喜	42,876	49,221	0	0	398	129	92,624	74	2,280	2,354	144,957	0	1,842	2,103	3,945	0	0	3,945	243,880
10-R1	浜原ダム	0	0	0	0	0	0	0	363	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	363
10-R2	潮下(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R3	潮下(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-L1	都賀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R1	滝下(2)	6,122	7,116	0	0	0	0	13,237	0	0	0	20,716	0	272	276	548	0	0	548	34,501
11-R3	潮上	55,396	63,074	277,481	31,647	1,365	463	429,427	0	0	0	672,053	19,812	2,196	2,247	4,443	17,572	0	41,827	1,143,307
11-R2	曲利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L1	郷上	383,770	291,248	52,558	13,964	3,205	931	745,676	2,012	0	2,012	1,166,983	30,526	11,078	10,094	21,172	44,208	0	95,906	2,010,577
12-L3	山根	100,735	70,553	13,196	23,147	954	259	208,845	1,291	0	1,291	326,842	9,237	2,611	1,847	4,458	8,333	0	22,028	559,006
12-L4	高梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L5	大浦(下流)	0	0	0	0	0	0	0	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	145
12-L6	大浦	82,922	62,107	4,995	452	1,783	483	152,742	1,746	0	1,746	239,041	2,413	2,304	1,840	4,144	4,196	0	10,753	404,282
12-R1	松原	23,751	15,912	0	0	0	0	39,663	0	0	0	62,073	0	601	491	1,092	0	0	1,092	102,828
12-R2	響谷	105,499	71,436	0	0	1,372	382	178,689	2,130	0	2,130	279,648	0	2,691	1,864	4,555	0	0	4,555	465,022
12-R3	原	0	0	0	0	52	14	66	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	169
13-L1	都賀西	328,131	261,056	122,952	74,530	1,124	349	788,143	3,269	473	3,742	1,233,444	55,822	9,269	8,247	17,515	55,930	0	129,267	2,154,596
13-L2	乙谷	20,437	13,881	0	0	34	10	34,362	364	0	364	53,777	0	523	343	866	0	0	866	89,369
13-R1	都賀本郷	302,045	232,754	88,729	43,397	1,003	297	668,226	0	0	0	1,045,774	49,680	8,553	7,915	16,468	73,256	0	139,404	1,853,404
13-R2	上野(下流)	75,097	68,606	19,450	3,492	141	45	166,830	397	0	397	261,089	9,274	2,589	2,690	5,278	20,344	0	34,896	463,212
13-R3	上野(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R4	上野(上流Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L1	下郷(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L2	下郷	96,891	68,060	10,772	5,965	464	140	182,293	1,853	0	1,853	285,289	4,126	2,581	2,467	5,049	470	0	9,645	479,080
14-R1	柳原(作木)	62,189	47,876	17,892	4,795	429	116	133,298	0	0	0	208,611	12,406	1,760	1,289	3,048	6,556	0	22,010	363,919
14-R2	柳原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L1	引城	19,057	13,881	0	0	0	0	32,938	0	376	376	51,548	0	523	343	866	0	0	866	85,728
15-L2	西之原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L3	西之原	520,356	391,230	87,836	55,565	7,024	1,960	1,063,971	8,230	0	8,230	1,665,115	68,401	14,589	10,217	24,806	56,615	0	149,822	2,887,138
15-R1	伊賀和志	320,034	260,278	185,714	46,586	5,940	1,629	820,180	1,256	0	1,256	1,283,582	90,865	9,415	6,956	16,372	24,523	0	131,760	2,236,778
16-L1	坂谷	0	0	0	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	71

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施前)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成27年度末河道)　　流量規模：1/100　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
16-L2	坂谷(上流)	0	0	0	0	0	0	0	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	121
16-L3	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R1	井手平	81,728	65,441	10,819	2,168	706	211	161,073	223	0	223	252,079	8,746	2,682	3,251	5,933	2,790	0	17,469	430,844
16-R5	大津	54,938	53,927	13,039	16,459	0	0	138,363	0	0	0	216,538	7,218	1,845	1,824	3,669	8,270	0	19,157	374,058
16-R2	折敷谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R3	式	142,515	128,682	0	0	4,913	1,360	277,470	808	0	808	434,241	0	4,639	3,905	8,544	0	0	8,544	721,063
16-R4	丹渡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L0	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L1	青山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L2	上ヶ畑	7,711	9,133	0	0	0	0	16,843	0	0	0	26,359	0	277	413	690	0	0	690	43,892
17-R1	港	265,052	240,878	190,153	65,309	864	270	762,527	0	0	0	1,193,355	97,718	8,729	9,067	17,796	73,824	0	189,338	2,145,220
17-R2	熊見下(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R3	熊見下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L1	川根	50,973	43,856	0	0	1,655	480	96,964	919	0	919	151,749	0	1,634	1,673	3,307	0	0	3,307	252,939
18-L2	川根(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L3	竹貞	1,928	588	0	0	131	38	2,685	19	0	19	4,202	0	83	165	248	0	0	248	7,154
18-L4	梶矢(下流)	302,473	222,907	64,019	29,663	6,496	1,791	627,349	4,234	376	4,610	981,801	51,859	8,292	6,197	14,488	30,202	0	96,549	1,710,309
18-R1	熊見	3,154	2,031	4,297	684	776	217	11,160	0	0	0	17,465	3,249	78	148	226	925	0	4,400	33,025
18-R2	香淀	82,013	60,678	1,121	183	137	49	144,180	769	0	769	225,642	1,319	2,312	1,745	4,057	470	0	5,846	376,437
18-R3	門田(下流)	25,410	22,439	0	0	0	0	47,849	230	0	230	74,884	0	834	832	1,667	0	0	1,667	124,630
19-L1	梶矢(上流)	85,036	77,991	210,225	191,104	2,202	610	567,168	1,449	188	1,637	887,618	46,209	2,653	1,957	4,610	13,112	0	63,931	1,520,354
19-L2	林	0	0	0	0	0	0	0	1,142	0	1,142	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142
19-L3	式敷	9,934	7,704	19,306	4,274	297	103	41,618	3,891	0	3,891	65,132	11,602	356	441	797	10,752	0	23,151	133,792
19-L4	信木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R1	門田(上流)	694,781	113,499	4,901	1,396	937	269	815,783	2,352	0	2,352	1,276,700	4,438	4,103	3,023	7,127	1,760	0	13,325	2,108,160
19-R2	川毛	106,069	95,864	15,393	12,097	1,125	333	230,880	1,414	0	1,414	361,327	7,256	3,569	3,290	6,859	7,452	0	21,567	615,188
19-R3	上組	0	0	0	0	0	0	0	297	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	297
20-L1	所木	0	0	0	0	0	0	0	431	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	431
20-L2	船佐(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L3	船佐(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R1	唐香	182,086	165,379	7,172	13,790	4,172	1,212	373,811	749	0	749	585,014	4,630	6,180	4,640	10,820	5,283	0	20,733	980,307
20-R2	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R3	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L1	下長谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L2	馬行谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L3	下津河内	21,686	20,114	0	0	0	0	41,800	298	0	298	65,417	0	714	602	1,316	0	0	1,316	108,831
21-R1	引字根	7,513	7,116	108,268	104,607	0	0	227,504	0	0	0	356,044	31,081	272	276	548	6,619	0	38,248	621,796
21-R2	下乙原	3,855	4,566	0	0	0	0	8,422	0	0	0	13,180	0	139	207	345	0	0	345	21,947
21-R3	日下	562,480	403,191	45,008	27,563	1,420	388	1,040,050	6,649	0	6,649	1,627,678	39,363	15,217	10,247	25,464	19,857	0	84,684	2,759,061
22-L1	荒瀬(下流)	7,513	7,116	16,712	22,035	554	178	54,107	1,104	0	1,104	84,677	7,636	272	276	548	10,282	0	18,466	158,354
22-L2	岩脇	8,368	7,116	30,489	4,789	496	158	51,416	349	0	349	80,466	17,663	272	276	548	11,270	0	29,481	161,712
22-L3	十日市・南畑敷町	45,696,613	21,119,432	13,787,618	3,622,980	57,418	17,354	84,301,416	8,587	575	9,162	131,931,716	2,645,005	754,770	706,396	1,461,166	2,621,706	0	6,727,877	222,970,171
22-R1	板崎	8,499	4,650	2,241	366	10	3	15,770	0	0	0	24,680	2,638	240	460	700	940	0	4,278	44,728
22-R2	中所	1,554,125	1,173,759	403,979	266,073	6,447	1,755	3,406,138	0	0	0	5,330,606	125,987	43,484	29,198	72,682	39,651	0	238,320	8,975,064
22-R3	三次町	20,868,554	8,585,035	1,822,569	932,120	14,394	4,085	32,226,755	0	0	0	50,434,872	677,938	311,280	238,829	550,109	992,384	0	2,220,431	84,882,058
22-R4	寺戸桧原	2,206,985	1,632,740	4,961,530	1,027,050	10,968	3,026	9,842,299	5,990	6,765	12,755	15,403,198	539,240	60,534	41,421	101,955	218,238	0	859,433	26,117,685
22-R5	畠敷町(Ⅰ・Ⅱ)	26,324,866	10,268,040	1,405,474	787,299	36,987	10,753	38,833,418	12,911	8,172	21,083	60,774,299	518,381	363,803	303,093	666,896	606,242	0	1,791,518	101,420,318
22-R6	畠敷町(Ⅲ)	111,869	105,991	23,960	19,359	292	88	261,559	1,393	0	1,393	409,340	9,255	4,015	4,377	8,392	12,103	0	29,750	702,042
30-L2	郷川	80,896	70,791	22,737	38,449	308	87	213,267	2,062	0	2,062	333,763	12,866	2,452	2,063	4,515	15,011	0	32,392	581,484
30-L3	中三原	20,985	16,556	77,905	17,537	854	312	134,150	606	0	606	209,945	21,418	664	782	1,446	8,392	0	31,256	375,957
30-L5	下三原	34,369	26,879	2,626	418	480	130	64,902	293	0	293	101,572	1,935	965	669	1,634	925	0	4,494	171,261
30-L4	小松原	10,558	7,704	114,043	97,466	4,002	1,119	234,893	2,393	0	2,393	367,608	27,633	356	441	797	10,282	0	38,712	643,606
30-R2	向三原	81,137	68,984	0	0	0	0	150,121	1,884	951	2,835	234,939	0	2,560	2,390	4,950	0	0	4,950	392,845
30-R3	下布野	3,154	2,031	0	0	0	0	5,185	486	0	486	8,115	0	78	148	226	0	0	226	14,012
30-R4	鉾	4,250	2,325	0	0	0	0	6,575	0	0	0	10,290	0	120	230	350	0	0	350	17,215
30-R5	河戸	192,466	72,527	130,812	50,058	2,065	654	448,581	514	1,503	2,017	702,029	13,314	2,626	2,392	5,017	7,826	0	26,157	1,178,784
合計		#########	69,413,660	33,306,983	11,177,683	330,036	94,266	247,619,651	152,047	125,852	277,899	387,524,754	8,293,087	2,520,068	2,078,120	4,598,188	7,276,372	0	20,167,647	655,589,951

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名:江の川　河川名:江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成57年度末河道)　河川名:江の川(現況河道:平成22年度測量断面)　流量規模:1/5　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
01-L1	江津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L2	本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L6	郷田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L3	千金(下流)	0	0	0	0	41	14	55	134	0	134	86	0	0	0	0	0	0	0	275
01-L7	千金(上流)	0	0	0	0	25	8	33	107	0	107	52	0	0	0	0	0	0	0	192
01-L4	田野村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L5	赤栗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R1	渡津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R5	長田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R2	太田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R3	八神(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R4	八神(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L1	川平(本川)	0	0	0	0	29	11	39	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	100
01-L8	瀬尻(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L2	瀬尻(上流)	0	0	0	0	0	0	0	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	311
02-L3	小松	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L4	仁万瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L9	田野Ⅰ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L7	田野Ⅱ	0	0	0	0	60	18	78	304	0	304	122	0	0	0	0	0	0	0	504
02-L8	川平(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L9	川平(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R1	松川	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R6	松川(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R2	久坪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R3	橿原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R4	中長良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R5	上長良(本川)	0	0	0	0	92	28	119	243	0	243	186	0	0	0	0	0	0	0	548
02-R9	上長良(支川)	0	0	0	0	8	3	10	121	0	121	16	0	0	0	0	0	0	0	147
02-R6	大口(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R7	大口(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R8	下原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L6	志谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L4	川戸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L1	川戸(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L5	近原	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90
03-L2	猪ノ瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L3	花河原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R1	下原(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R2	臼木(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R3	臼木(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R4	元折	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L5	小原-桜江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-L1	田津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-L3	恵梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-L4	川越(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-L2	川越(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-R1	榎谷	0	0	0	0	46	14	60	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	154
04-R2	久井谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-R5	和田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-R3	大貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-R4	坂本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-L1	鹿賀(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-L2	鹿賀(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R1	渦巻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R2	瀬尻(川本町)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R3	久料谷	0	0	0	0	157	42	199	0	239	239	311	0	0	0	0	0	0	0	749
05-R4	尾原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R5	松ヶ崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L1	因原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L0	因原(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L2	日向	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L5	谷(本川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

①全体事業（H28～H57）

様式－3　　被害額（事業実施後）　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川（平成57年度末河道）　河川名：江の川（現況河道：平成22年度測量断面）流量規模：1/5　　（千円）

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
06-L3	谷(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L4	川本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R1	木谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R2	下三島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R3	上三島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R5	谷戸(本川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R4	谷戸(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-L1	木路原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-L2	銅ヶ丸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-L3	竹	0	0	0	0	98	35	134	806	400	1,206	210	0	0	0	0	0	0	0	1,550
07-R1	久座仁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R2	多田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R3	市井原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R4	君谷湊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R5	君谷湊（支川）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L1	乙原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L2	箕瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L3	明塚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L5	上明塚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L4	野井	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-R1	栗原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-R2	吾郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-R3	高畑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-L1	亀村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R1	小原(邑智)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R4	狛淵	0	0	0	0	120	38	158	347	0	347	247	0	0	0	0	0	0	0	752
09-R5	浜原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R2	浜原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L1	滝原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R3	本郷	0	0	0	0	72	24	96	445	0	445	150	0	0	0	0	0	0	0	691
10-L2	石見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L3	信喜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R1	浜原ダム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R2	潮下(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R3	潮下(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-L1	都賀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R1	滝下(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R3	潮上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R2	曲利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L1	郷上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L3	山根	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L4	高梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L5	大浦(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L6	大浦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-R1	松原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-R2	響谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-R3	原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-L1	都賀西	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-L2	乙谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R1	都賀本郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R2	上野(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R3	上野(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R4	上野(上流Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L1	下郷(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L2	下郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-R1	柳原(作木)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-R2	柳原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L1	引城	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L2	西之原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L3	西之原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-R1	伊賀和志	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L1	坂谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成57年度末河道)　河川名：江の川(現況河道：平成22年度測量断面，流量規模：1/5　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
16-L2	坂谷(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L3	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R1	井手平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R5	大津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R2	折敷谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R3	式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R4	丹渡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L0	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L1	青山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L2	上ヶ畑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R1	港	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R2	熊見下(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R3	熊見下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L1	川根	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L2	川根(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L3	竹貞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L4	梶矢(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R1	熊見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R2	香淀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R3	門田(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L1	梶矢(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L2	林	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L3	式敷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L4	信木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R1	門田(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R2	川毛	0	0	0	0	0	0	0	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	62
19-R3	上組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L1	所木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L2	船佐(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L3	船佐(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R1	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R2	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R3	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L1	下長谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L2	馬行谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L3	下津河内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R1	引字根	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R2	下乙原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R3	日下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L1	荒瀬(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L2	岩脇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L3	十日市・南畑敷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R1	板崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R2	中所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R3	三次町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R4	寺戸桧原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R5	畠敷町(Ⅰ・Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R6	畠敷町(Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L1	中ノ村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L2	亀谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L3	米丸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L4	旭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L5	上村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R1	大村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R2	船所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R3	青河	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R4	鈴江	0	0	0	0	0	0	0	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	95
24-L1	若屋	0	0	0	0	0	0	0	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	64
24-L2	秋町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-R1	片山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-R2	下志和地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-L1	深瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

①全体事業（H28～H57）

様式－３　　被害額（事業実施後）　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川（平成57年度末河道）　河川名：江の川（現況河道：平成22年度測量断面，流量規模：1/5　　（千円）

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
25-L2	甲立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R1	上志和地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R2	川立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R1	高田原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R2	法恩時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-L1	篠原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L1	市ヶ原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L2	高屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R1	下小原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R2	柳原(吉田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R3	国司-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L1	内堀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L2	山手(-常友)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L3	桂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L4	長屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R1	国司-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R2	下入江(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R3	下入江(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R4	上入江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-L1	下土師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-R1	北原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L2	郷川	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L3	中三原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L5	下三原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L4	小松原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-R2	向三原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-R3	下布野	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-R4	鉾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-R5	河戸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/80区間の合計		0	0	0	0	0	0	0	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	160
1/100区間の合計		0	0	0	0	748	234	981	2,881	730	3,610	1,535	0	0	0	0	0	0	0	6,126
合計		0	0	0	0	748	234	981	3,041	730	3,768	1,535	0	0	0	0	0	0	0	6,284

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名:江の川　河川名:江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成57年度末河道)　河川名:江の川(現況河道:平成22年度測量断面)流量規模:1/10　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
01-L1	江津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L2	本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L6	郷田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L3	千金(下流)	0	0	0	0	73	22	95	168	0	168	149	0	0	0	0	0	0	0	412
01-L7	千金(上流)	0	0	0	0	45	15	61	159	0	159	95	0	0	0	0	0	0	0	315
01-L4	田野村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L5	赤栗	0	0	0	0	270	84	354	0	974	974	554	0	0	0	0	0	0	0	1,882
01-R1	渡津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R5	長田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R2	太田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R3	八神(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R4	八神(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L1	川平(本川)	0	0	0	0	445	121	566	0	1,812	1,812	886	0	0	0	0	0	0	0	3,264
01-L8	瀬尻(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L2	瀬尻(上流)	0	0	0	0	32	11	43	364	681	1,044	67	0	0	0	0	0	0	0	1,154
02-L3	小松	0	0	0	0	0	0	0	0	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	202
02-L4	仁万瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L9	田野Ⅰ	0	0	0	0	332	90	422	141	538	680	660	0	0	0	0	0	0	0	1,762
02-L7	田野Ⅱ	2,440	4,566	4,058	646	1,925	533	14,169	1,996	0	1,996	22,174	3,069	139	207	345	925	0	4,339	42,678
02-L8	川平(支川)	37,441	38,267	0	0	1,181	334	77,223	212	0	212	120,854	0	1,458	1,633	3,091	0	0	3,091	201,380
02-L9	川平(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R1	松川	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R6	松川(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R2	久坪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R3	櫃原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R4	中長良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R5	上長良(本川)	0	0	0	0	133	36	169	243	0	243	264	0	0	0	0	0	0	0	676
02-R9	上長良(支川)	0	0	0	0	36	11	46	321	0	321	72	0	0	0	0	0	0	0	439
02-R6	大口(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R7	大口(上流)	0	0	0	0	0	0	0	445	2,018	2,463	0	0	0	0	0	0	0	0	2,463
02-R8	下原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L6	志谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L4	川戸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L1	川戸(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L5	近原	0	0	0	0	0	0	0	0	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	340
03-L2	猪ノ瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L3	花河原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R1	下原(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R2	臼木(下流)	0	0	0	0	57	15	72	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	185
03-R3	臼木(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R4	元折	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L5	小原-桜江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-L1	田津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-L3	恵梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-L4	川越(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-L2	川越(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-R1	榎谷	0	0	0	0	86	23	109	0	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0	280
04-R2	久井谷	0	0	0	0	469	139	608	0	497	497	952	0	0	0	0	0	0	0	2,057
04-R5	和田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-R3	大貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-R4	坂本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-L1	鹿賀(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-L2	鹿賀(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R1	洞巻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R2	瀬尻(川本町)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R3	久料谷	0	0	0	0	168	46	213	0	239	239	333	0	0	0	0	0	0	0	785
05-R4	尾原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R5	松ヶ崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L1	因原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L0	因原(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L2	日向	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L5	谷(本川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

①全体事業（H28～H57）

様式－３　　被害額（事業実施後）　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川（平成57年度末河道）　河川名：江の川（現況河道：平成22年度測量断面）流量規模：1/10　　（千円）

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
06-L3	谷(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L4	川本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R1	木谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R2	下三島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R3	上三島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R5	谷戸(本川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R4	谷戸(支川)	11,676	12,998	5,146	1,103	280	76	31,280	0	477	477	48,953	1,325	442	326	768	6,556	0	8,649	89,359
07-L1	木路原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-L2	銅ヶ丸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-L3	竹	0	0	0	0	277	80	357	909	400	1,309	559	0	0	0	0	0	0	0	2,225
07-R1	久座仁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R2	多田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R3	市井原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R4	君谷湊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R5	君谷湊（支川）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L1	乙原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L2	築瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L3	明塚	0	0	0	0	0	0	0	733	0	733	0	0	0	0	0	0	0	0	733
08-L5	上明塚	0	0	0	0	0	0	0	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	242
08-L4	野井	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-R1	栗原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-R2	吾郷	0	0	0	0	142	51	193	686	0	686	302	0	0	0	0	0	0	0	1,181
08-R3	高畑	0	0	0	0	75	22	97	0	1,588	1,588	152	0	0	0	0	0	0	0	1,837
09-L1	亀村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R1	小原(邑智)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R4	狛淵	0	0	0	0	474	162	636	874	0	874	995	0	0	0	0	0	0	0	2,505
09-R5	浜原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
09-R2	浜原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L1	滝原	0	0	0	0	7	2	9	69	0	69	14	0	0	0	0	0	0	0	92
09-R3	本郷	0	0	13,733	1,936	288	87	16,044	1,043	0	1,043	25,109	3,674	0	0	0	4,651	0	8,325	50,521
10-L2	石見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L3	信喜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R1	浜原ダム	0	0	0	0	0	0	0	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	121
10-R2	潮下(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R3	潮下(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-L1	都賀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R1	滝下(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R3	潮上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R2	曲利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L1	郷上	0	0	0	0	0	0	0	701	0	701	0	0	0	0	0	0	0	0	701
12-L3	山根	0	0	0	0	222	73	295	426	0	426	462	0	0	0	0	0	0	0	1,183
12-L4	高梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L5	大浦(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L6	大浦	0	0	0	0	0	0	0	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	138
12-R1	松原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-R2	響谷	0	0	0	0	107	31	138	380	0	380	216	0	0	0	0	0	0	0	734
12-R3	原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-L1	都賀西	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-L2	乙谷	0	0	0	0	0	0	0	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	69
13-R1	都賀本郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R2	上野(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R3	上野(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R4	上野(上流Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L1	下郷(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L2	下郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-R1	柳原(作木)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-R2	柳原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L1	引城	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L2	西之原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L3	西之原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-R1	伊賀和志	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L1	坂谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名:江の川　河川名:江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成57年度末河道)　河川名:江の川(現況河道:平成22年度測量断面)流量規模:1/10　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
16-L2	坂谷(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L3	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R1	井手平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R5	大津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R2	折敷谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R3	式	0	0	0	0	151	44	194	69	0	69	304	0	0	0	0	0	0	0	567
16-R4	丹渡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L0	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L1	青山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L2	上ヶ畑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R1	港	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R2	熊見下(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R3	熊見下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L1	川根	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L2	川根(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L3	竹貞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L4	梶矢(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R1	熊見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R2	香淀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R3	門田(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L1	梶矢(上流)	0	0	0	0	0	0	0	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	253
19-L2	林	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L3	式敷	0	0	0	0	0	0	0	408	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	408
19-L4	信木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R1	門田(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R2	川毛	0	0	0	0	24	9	33	351	0	351	52	0	0	0	0	0	0	0	436
19-R3	上組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L1	所木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L2	船佐(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L3	船佐(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R1	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R2	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R3	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L1	下長谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L2	馬行谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L3	下津河内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R1	引字根	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R2	下乙原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R3	日下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L1	荒瀬(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L2	岩脇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L3	十日市・南畑敷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R1	板崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R2	中所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R3	三次町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R4	寺戸桧原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R5	畠敷町(Ⅰ・Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R6	畠敷町(Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L1	中ノ村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L2	亀谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L3	米丸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L4	旭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L5	上村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R1	大村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R2	船所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R3	青河	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R4	鈴江	0	0	0	0	0	0	0	382	0	382	0	0	0	0	0	0	0	0	382
24-L1	若屋	0	0	0	0	0	0	0	853	0	853	0	0	0	0	0	0	0	0	853
24-L2	秋町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-R1	片山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-R2	下志和地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-L1	深瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

①全体事業（H28～H57）

様式－３　　被害額（事業実施後）　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川（平成57年度末河道）　河川名：江の川（現況河道：平成22年度測量断面）流量規模：1/10　　（千円）

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
25-L2	甲立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R1	上志和地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R2	川立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R1	高田原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R2	法恩時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-L1	篠原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L1	市ヶ原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L2	高屋	0	0	0	0	0	0	0	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	358
27-R1	下小原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R2	柳原(吉田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R3	国司-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L1	内堀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L2	山手(-常友)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L3	桂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L4	長屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R1	国司-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R2	下入江(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R3	下入江(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R4	上入江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-L1	下土師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-R1	北原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L2	郷川	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L3	中三原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L5	下三原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L4	小松原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-R2	向三原	0	0	0	0	0	0	0	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	78
30-R3	下布野	0	0	0	0	0	0	0	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	219
30-R4	鉾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-R5	河戸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/80区間の合計		0	0	0	0	0	0	0	1,593	0	1,593	0	0	0	0	0	0	0	0	1,593
1/100区間の合計		51,558	55,832	22,937	3,686	7,301	2,117	143,431	12,017	9,766	21,783	224,470	8,068	2,039	2,166	4,205	12,132	0	24,405	414,089
合計		51,558	55,832	22,937	3,686	7,301	2,117	143,426	13,610	9,766	23,377	224,462	8,068	2,039	2,166	4,204	12,132	0	24,404	415,669

①全体事業（H28～H57）

様式－3　　被害額（事業実施後）　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川（平成57年度末河道）　河川名：江の川（現況河道：平成22年度測量断面）流量規模：1/30　　（千円）

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
01-L1	江津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L2	本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L6	郷田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L3	千金(下流)	0	0	0	0	116	32	148	215	0	215	232	0	0	0	0	0	0	0	595
01-L7	千金(上流)	0	0	0	0	105	30	135	202	0	202	211	0	0	0	0	0	0	0	548
01-L4	田野村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L5	赤栗	0	0	0	0	1,881	522	2,404	0	1,255	1,255	3,762	0	0	0	0	0	0	0	7,421
01-R1	渡津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R5	長田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R2	太田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R3	八神(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R4	八神(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L1	川平(本川)	0	0	0	0	684	188	872	0	2,556	2,556	1,365	0	0	0	0	0	0	0	4,793
01-L8	瀬尻(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L2	瀬尻(上流)	0	0	0	0	109	30	139	364	950	1,314	218	0	0	0	0	0	0	0	1,671
02-L3	小松	0	0	0	0	0	0	0	0	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	202
02-L4	仁万瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L9	田野Ⅰ	0	0	0	0	337	91	428	141	538	680	670	0	0	0	0	0	0	0	1,778
02-L7	田野Ⅱ	17,101	13,881	101,067	85,790	2,810	767	221,417	2,506	0	2,506	346,518	39,779	523	343	866	13,238	0	53,883	624,324
02-L8	川平(支川)	172,485	150,043	0	0	1,550	420	324,499	212	0	212	507,841	0	5,507	3,725	9,232	0	0	9,232	841,784
02-L9	川平(その他)	0	0	0	0	23	8	31	503	0	503	49	0	0	0	0	0	0	0	583
02-R1	松川	0	0	1,865	317	3,269	942	6,394	6,618	0	6,618	10,007	1,034	0	0	0	1,714	0	2,748	25,767
01-R6	松川(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R2	久坪	0	0	0	0	150	41	190	0	0	0	297	0	0	0	0	0	0	0	487
02-R3	櫃原	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	67
02-R4	中長良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R5	上長良(本川)	0	0	0	0	135	37	171	243	0	243	268	0	0	0	0	0	0	0	682
02-R9	上長良(支川)	5,454	7,116	0	0	71	19	12,660	443	0	443	19,813	0	272	276	548	0	0	548	33,464
02-R6	大口(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R7	大口(上流)	0	0	0	0	0	0	0	485	2,018	2,503	0	0	0	0	0	0	0	0	2,503
02-R8	下原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L6	志谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L4	川戸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L1	川戸(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L5	近原	0	0	0	0	0	0	0	0	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	340
03-L2	猪ノ瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L3	花河原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R1	下原(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R2	臼木(下流)	0	0	0	0	281	76	357	0	807	807	559	0	0	0	0	0	0	0	1,723
03-R3	臼木(上流)	0	0	0	0	70	19	89	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	228
03-R4	元折	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L5	小原-桜江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-L1	田津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-L3	恵梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-L4	川越(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-L2	川越(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-R1	榎谷	0	0	0	0	117	32	149	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	382
04-R2	久井谷	0	0	0	0	769	221	990	0	497	497	1,549	0	0	0	0	0	0	0	3,036
04-R5	和田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-R3	大貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-R4	坂本	0	0	0	0	936	257	1,193	970	0	970	1,867	0	0	0	0	0	0	0	4,030
05-L1	鹿賀(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-L2	鹿賀(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R1	洞巻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R2	瀬尻(川本町)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R3	久料谷	0	0	0	0	168	46	213	0	239	239	333	0	0	0	0	0	0	0	785
05-R4	尾原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R5	松ヶ崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L1	因原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L0	因原(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L2	日向	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L5	谷(本川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

①全体事業（H28～H57）

様式－3　　被害額（事業実施後）　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川（平成57年度末河道）　河川名：江の川（現況河道：平成22年度測量断面）流量規模：1/30　　（千円）

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
06-L3	谷(支川)	642,961	580,660	129,172	72,722	1,903	532	1,427,948	0	0	0	2,234,739	53,347	21,607	16,054	37,661	43,377	0	134,385	3,797,072
06-L4	川本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R1	木谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R2	下三島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R3	上三島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R5	谷戸(本川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R4	谷戸(支川)	18,722	14,763	5,300	1,208	442	124	40,560	0	477	477	63,476	1,783	648	591	1,239	6,619	0	9,641	114,154
07-L1	木路原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-L2	銅ヶ丸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-L3	竹	0	0	0	0	441	119	561	909	801	1,710	878	0	0	0	0	0	0	0	3,149
07-R1	久座仁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R2	多田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R3	市井原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R4	君谷湊	0	0	0	0	0	0	0	667	200	867	0	0	0	0	0	0	0	0	867
07-R5	君谷湊(支川)	2,854	2,325	0	0	702	192	6,073	1,965	0	1,965	9,504	0	120	230	350	0	0	350	17,892
08-L1	乙原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L2	箕瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L3	明塚	0	0	0	0	0	0	0	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	775
08-L5	上明塚	0	0	8,616	13,576	0	0	22,192	242	0	242	34,730	3,636	0	0	0	3,726	0	7,362	64,526
08-L4	野井	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
08-R1	栗原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-R2	吾郷	0	0	0	0	619	180	799	1,099	0	1,099	1,250	0	0	0	0	0	0	0	3,148
08-R3	高畑	0	0	0	0	1,016	283	1,299	242	2,101	2,343	2,033	0	0	0	0	0	0	0	5,675
09-L1	亀村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R1	小原(邑智)	0	0	0	0	67	25	93	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	239
09-R4	狛淵	0	0	0	0	1,530	419	1,949	1,159	0	1,159	3,050	0	0	0	0	0	0	0	6,158
09-R5	浜原(下流)	0	0	17,924	10,343	0	0	28,267	242	0	242	44,238	3,151	0	0	0	1,714	0	4,865	77,612
09-R2	浜原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L1	滝原	0	0	0	0	40	12	52	200	0	200	81	0	0	0	0	0	0	0	333
09-R3	本郷	0	0	64,169	25,610	540	147	90,467	1,372	0	1,372	141,581	22,656	0	0	0	23,520	0	46,176	279,596
10-L2	石見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L3	信喜	0	0	0	0	16	5	22	0	470	470	34	0	0	0	0	0	0	0	526
10-R1	浜原ダム	0	0	0	0	0	0	0	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	121
10-R2	潮下(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R3	潮下(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-L1	都賀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R1	滝下(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R3	潮上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R2	曲利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L1	郷上	0	0	0	0	0	0	0	862	0	862	0	0	0	0	0	0	0	0	862
12-L3	山根	0	0	0	0	742	205	947	849	0	849	1,482	0	0	0	0	0	0	0	3,278
12-L4	高梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L5	大浦(下流)	0	0	0	0	0	0	0	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	48
12-L6	大浦	0	0	0	0	404	145	549	1,170	0	1,170	859	0	0	0	0	0	0	0	2,578
12-R1	松原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-R2	響谷	0	0	0	0	451	136	587	1,170	0	1,170	919	0	0	0	0	0	0	0	2,676
12-R3	原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-L1	都賀西	0	0	2,865	456	44	15	3,381	121	186	307	5,291	2,120	0	0	0	2,775	0	4,895	13,874
13-L2	乙谷	0	0	0	0	14	4	18	243	0	243	28	0	0	0	0	0	0	0	289
13-R1	都賀本郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R2	上野(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R3	上野(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R4	上野(上流Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L1	下郷(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L2	下郷	0	0	0	0	0	0	0	623	0	623	0	0	0	0	0	0	0	0	623
14-R1	柳原(作木)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-R2	柳原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L1	引城	0	0	0	0	0	0	0	0	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	199
15-L2	西之原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L3	西之原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-R1	伊賀和志	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L1	坂谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

①全体事業（H28～H57）

様式－３　　被害額（事業実施後）　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川（平成57年度末河道）　河川名：江の川（現況河道：平成22年度測量断面）流量規模：1/30　　（千円）

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
16-L2	坂谷(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L3	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R1	井手平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R5	大津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R2	折敷谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R3	式	0	0	0	0	1,008	294	1,302	344	0	344	2,038	0	0	0	0	0	0	0	3,684
16-R4	丹渡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L0	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L1	青山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L2	上ヶ畑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R1	港	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R2	熊見下(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R3	熊見下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L1	川根	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	45
18-L2	川根(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L3	竹貞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L4	梶矢(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R1	熊見	0	0	0	0	331	91	422	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	1,082
18-R2	香淀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R3	門田(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L1	梶矢(上流)	0	0	0	0	100	36	136	1,075	0	1,075	213	0	0	0	0	0	0	0	1,424
19-L2	林	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L3	式敷	0	0	0	0	0	0	0	1,836	0	1,836	0	0	0	0	0	0	0	0	1,836
19-L4	信木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R1	門田(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R2	川毛	0	0	12,641	6,554	161	54	19,409	437	0	437	30,375	6,197	0	0	0	5,440	0	11,637	61,858
19-R3	上組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L1	所木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L2	船佐(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L3	船佐(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R1	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R2	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R3	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L1	下長谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L2	馬行谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L3	下津河内	0	0	0	0	0	0	0	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	136
21-R1	引字根	0	0	49,292	28,442	0	0	77,734	0	0	0	121,654	8,664	0	0	0	1,714	0	10,378	209,766
21-R2	下乙原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R3	日下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L1	荒瀬(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L2	岩脇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L3	十日市・南畑敷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R1	板崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R2	中所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R3	三次町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R4	寺戸桧原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R5	畠敷町(Ⅰ・Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R6	畠敷町(Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L1	中ノ村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L2	亀谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L3	米丸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L4	旭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L5	上村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R1	大村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R2	船所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R3	青河	0	0	6,462	10,182	0	0	16,644	2,325	0	2,325	26,048	2,727	0	0	0	3,726	0	6,453	51,470
23-R4	鈴江	0	0	0	0	75	22	97	940	0	940	152	0	0	0	0	0	0	0	1,189
24-L1	若屋	0	0	0	0	0	0	0	1,347	0	1,347	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347
24-L2	秋町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-R1	片山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-R2	下志和地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-L1	深瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

①全体事業（H28～H57）

様式－３　　被害額（事業実施後）　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川（平成57年度末河道）　河川名：江の川（現況河道：平成22年度測量断面）流量規模：1/30　　（千円）

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
25-L2	甲立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R1	上志和地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R2	川立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R1	高田原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R2	法恩時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-L1	篠原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L1	市ヶ原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L2	高屋	0	0	7,924	1,348	228	77	9,578	868	0	868	14,990	4,281	0	0	0	1,714	0	5,995	31,431
27-R1	下小原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R2	柳原(吉田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R3	国司-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L1	内堀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L2	山手(-常友)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L3	桂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L4	長屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R1	国司-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R2	下入江(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R3	下入江(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R4	上入江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-L1	下土師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-R1	北原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L2	郷川	0	0	6,462	10,182	38	14	16,697	907	0	907	26,131	2,727	0	0	0	3,726	0	6,453	50,188
30-L3	中三原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L5	下三原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L4	小松原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-R2	向三原	0	0	0	0	0	0	0	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	188
30-R3	下布野	0	0	0	0	0	0	0	401	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	401
30-R4	鈩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-R5	河戸	71,232	25,479	55,962	17,415	761	267	171,116	354	1,385	1,739	267,797	5,913	980	1,327	2,306	2,649	0	10,868	451,520
1/80区間の合計		0	0	14,386	11,530	303	99	26,319	5,480	0	5,480	41,189	7,008	0	0	0	5,440	0	12,448	85,436
1/100区間の合計		930,809	794,267	455,334	272,616	24,953	7,079	2,485,058	32,903	15,289	48,192	3,889,116	151,006	29,656	22,546	52,202	110,212	0	313,420	6,735,786
合計		930,809	794,267	469,720	284,146	25,256	7,178	2,511,378	38,383	15,289	53,673	3,930,308	158,014	29,656	22,546	52,202	115,652	0	325,869	6,821,228

様式－3　被害額(事業実施後)　水系名:江の川　河川名:江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成57年度末河道)　河川名:江の川(現況河道:平成22年度測量断面)流量規模:1/50　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
01-L1	江津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L2	本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L6	郷田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L3	千金(下流)	2,543	2,325	0	0	128	36	5,031	270	0	270	7,874	0	120	230	350	0	0	350	13,525
01-L7	千金(上流)	183,886	176,740	44,318	29,823	733	201	435,701	436	3,742	4,177	681,872	38,505	6,435	4,794	11,229	19,857	0	69,591	1,191,341
01-L4	田野村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L5	赤栗	7,546	8,124	0	0	2,284	622	18,576	0	1,568	1,568	29,071	0	313	590	903	0	0	903	50,118
01-R1	渡津	1,832,903	795,776	689,273	309,796	798	279	3,628,826	0	0	0	5,679,113	184,348	28,814	33,076	61,890	75,126	0	321,364	9,629,303
01-R5	長田	3,248,865	2,942,802	619,387	170,531	6,841	1,930	6,990,357	0	3,951	3,951	10,939,909	112,861	104,845	79,841	184,686	163,944	0	461,491	18,395,708
01-R2	太田	99,448	98,427	0	0	455	130	198,460	1,787	0	1,787	310,590	0	3,661	3,016	6,677	0	0	6,677	517,514
01-R3	八神(下流)	185,362	161,893	26,654	13,963	1,392	379	389,643	3,809	932	4,741	609,791	21,591	6,123	4,556	10,680	13,238	0	45,509	1,049,684
01-R4	八神(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L1	川平(本川)	39,328	47,806	25,220	5,691	1,252	384	119,681	0	3,592	3,592	187,301	16,479	2,253	3,523	5,776	13,872	0	36,127	346,701
01-L8	瀬尻(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L2	瀬尻(上流)	0	0	0	0	120	33	153	364	1,076	1,440	239	0	0	0	0	0	0	0	1,832
02-L3	小松	0	0	0	0	0	0	0	0	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	202
02-L4	仁万瀬	18,413	14,469	0	0	0	0	32,882	0	0	0	51,460	0	606	508	1,114	0	0	1,114	85,456
01-L9	田野Ⅰ	106,071	139,762	0	0	589	186	246,608	707	538	1,245	385,942	0	5,311	5,449	10,760	0	0	10,760	644,555
02-L7	田野Ⅱ	20,300	16,500	101,608	85,878	2,855	777	227,917	2,506	0	2,506	356,690	40,558	684	656	1,340	13,708	0	55,606	642,719
02-L8	川平(支川)	188,110	152,690	0	0	1,550	420	342,770	212	0	212	536,435	0	5,748	3,776	9,524	0	0	9,524	888,941
02-L9	川平(その他)	0	0	0	0	29	11	39	556	0	556	61	0	0	0	0	0	0	0	656
02-R1	松川	234,512	232,950	34,796	8,654	7,576	2,102	520,590	10,446	0	10,446	814,723	22,609	8,538	6,962	15,500	16,901	0	55,010	1,400,769
01-R6	松川(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R2	久坪	0	0	0	0	182	53	234	0	0	0	366	0	0	0	0	0	0	0	600
02-R3	橿原	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	67
02-R4	中長良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R5	上長良(本川)	0	0	0	0	135	37	171	243	0	243	268	0	0	0	0	0	0	0	682
02-R9	上長良(支川)	11,893	12,998	0	0	85	25	25,000	485	0	485	39,125	0	442	326	768	0	0	768	65,378
02-R6	大口(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R7	大口(上流)	2,625	1,177	0	0	0	0	3,801	485	2,232	2,717	5,949	0	167	330	497	0	0	497	12,964
02-R8	下原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L6	志谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L4	川戸	1,580,760	795,963	171,146	135,787	4,490	1,228	2,689,376	0	3,513	3,513	4,208,873	84,860	29,467	20,372	49,838	125,306	0	260,004	7,161,766
03-L1	川戸(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L5	近原	0	0	0	0	0	0	0	0	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	340
03-L2	猪ノ瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L3	花河原	656	294	0	0	0	0	950	0	0	0	1,487	0	42	83	124	0	0	124	2,561
03-R1	下原(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R2	臼木(下流)	1,312	588	25,826	17,170	427	116	45,439	0	1,076	1,076	71,112	13,988	83	165	248	10,286	0	24,522	142,149
03-R3	臼木(上流)	0	0	0	0	75	20	95	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	0	244
03-R4	元折	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L5	小原-桜江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-L1	田津	588,442	485,889	9,215	2,625	2,509	689	1,089,369	485	20,592	21,077	1,704,862	8,225	18,314	12,372	30,686	13,238	0	52,149	2,867,457
04-L3	恵梨	656	294	0	0	0	0	950	0	0	0	1,487	0	42	83	124	0	0	124	2,561
04-L4	川越(下流)	45,356	48,226	24,117	5,307	0	0	123,007	0	538	538	192,506	19,164	1,781	1,497	3,279	7,544	0	29,987	346,038
04-L2	川越(上流)	1,099,930	947,433	245,388	79,290	7,467	2,082	2,381,591	3,336	5,383	8,719	3,727,190	192,035	35,338	25,092	60,430	122,679	0	375,144	6,492,644
04-R1	榎谷	0	0	0	0	117	32	149	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	382
04-R2	久井谷	1,886	2,031	0	0	918	248	5,084	0	497	497	7,956	0	78	148	226	0	0	226	13,763
04-R5	和田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-R3	大貫	479,522	426,275	121,326	35,426	2,645	724	1,065,919	485	538	1,023	1,668,163	86,863	15,847	11,557	27,405	52,826	0	167,094	2,902,199
04-R4	坂本	0	0	0	0	1,065	298	1,363	970	0	970	2,133	0	0	0	0	0	0	0	4,466
05-L1	鹿賀(下流)	26,143	35,060	0	0	116	37	61,356	0	0	0	96,022	0	1,306	1,458	2,764	0	0	2,764	160,142
05-L2	鹿賀(上流)	227,314	225,555	0	0	1,490	419	454,778	0	3,722	3,722	711,728	0	8,345	6,686	15,031	0	0	15,031	1,185,259
05-R1	渦巻	9,945	14,875	4,058	646	219	65	29,810	0	0	0	46,653	3,069	583	950	1,533	925	0	5,527	81,990
05-R2	瀬尻(川本町)	656	294	4,095	1,167	0	0	6,212	0	63	63	9,722	3,709	42	83	124	6,619	0	10,452	26,449
05-R3	久料谷	8,530	3,824	0	0	168	46	12,567	69	492	561	19,667	0	542	1,073	1,615	0	0	1,615	34,410
05-R4	尾原	232,991	205,273	53,255	48,618	1,619	440	542,196	0	2,269	2,269	848,537	25,398	7,600	5,246	12,846	19,731	0	57,975	1,450,977
05-R5	松ヶ崎	4,429	4,356	3,685	1,423	0	0	13,893	0	0	0	21,743	2,981	198	378	576	1,395	0	4,952	40,588
06-L1	因原	2,444,052	1,084,140	416,382	219,785	8,388	2,308	4,175,055	849	477	1,326	6,533,961	204,057	40,176	28,598	68,774	125,913	0	398,744	11,109,086
06-L0	因原(支川)	64,995	21,502	9,508	6,134	218	59	102,417	0	477	477	160,283	4,587	809	532	1,341	2,504	0	8,431	271,608
06-L2	日向	0	0	32,726	26,930	133	40	59,829	0	0	0	93,632	8,414	0	0	0	10,282	0	18,696	172,157
06-L5	谷(本川)	1,933	882	2,954	482	0	0	6,252	0	0	0	9,784	3,477	125	248	373	470	0	4,320	20,356

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名:江の川　河川名:江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成57年度末河道)　河川名:江の川(現況河道:平成22年度測量断面)流量規模:1/50　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
06-L3	谷(支川)	754,288	674,507	130,703	75,627	2,111	584	1,637,820	0	0	0	2,563,188	55,884	25,095	17,748	42,843	46,270	0	144,997	4,346,005
06-L4	川本	1,420,098	1,298,450	370,497	195,079	1,397	390	3,285,910	0	0	0	5,142,449	198,773	48,366	33,306	81,672	263,512	0	543,957	8,972,316
06-R1	木谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R2	下三島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R3	上三島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R5	谷戸(本川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R4	谷戸(支川)	24,621	27,874	5,300	1,208	493	133	59,630	0	477	477	93,321	1,783	980	1,045	2,026	6,619	0	10,428	163,856
07-L1	木路原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-L2	銅ヶ丸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-L3	竹	2,946	1,177	0	0	449	122	4,693	909	1,225	2,134	7,345	0	167	330	497	0	0	497	14,669
07-R1	久座仁	3,785	2,913	4,262	395	104	30	11,489	0	0	0	17,980	4,060	203	395	598	940	0	5,598	35,067
07-R2	多田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R3	市井原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R4	君谷湊	736	294	0	0	0	0	1,031	667	200	867	1,614	0	42	83	124	0	0	124	3,636
07-R5	君谷湊(支川)	9,597	11,976	0	0	734	204	22,512	2,208	0	2,208	35,231	0	453	565	1,018	0	0	1,018	60,969
08-L1	乙原	206,948	163,041	0	0	1,086	294	371,370	424	1,752	2,176	581,194	0	5,949	4,051	10,000	0	0	10,000	964,740
08-L2	築瀬	368,489	323,814	15,545	9,059	2,757	813	720,477	0	883	883	1,127,547	10,691	11,169	9,711	20,880	15,359	0	46,930	1,895,837
08-L3	明塚	28,262	17,719	9,180	4,958	88	26	60,233	775	1,328	2,103	94,265	2,200	834	1,593	2,428	925	0	5,553	162,154
08-L5	上明塚	6,950	6,597	13,014	23,093	0	0	49,655	363	0	363	77,710	9,603	217	354	571	7,544	0	17,718	145,446
08-L4	野井	0	0	0	0	0	0	0	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	242
08-R1	栗原	442,757	364,910	36,322	10,045	5,397	1,490	860,921	485	0	485	1,347,341	29,096	13,367	9,844	23,211	26,350	0	78,657	2,287,404
08-R2	吾郷	0	0	0	0	811	223	1,034	1,118	931	2,049	1,618	0	0	0	0	0	0	0	4,701
08-R3	高畑	8,101	2,353	917	150	1,168	316	13,005	311	2,101	2,412	20,353	1,108	334	660	994	470	0	2,572	38,342
09-L1	亀村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R1	小原(邑智)	0	0	1,081	1,297	832	241	3,452	1,033	0	1,033	5,402	1,059	0	0	0	470	0	1,529	11,416
09-R4	狛淵	4,051	4,566	0	0	1,968	547	11,132	1,211	0	1,211	17,422	0	139	207	345	0	0	345	30,110
09-R5	浜原(下流)	4,051	4,566	31,219	22,699	0	0	62,535	242	0	242	97,867	5,151	139	207	345	3,726	0	9,222	169,866
09-R2	浜原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L1	滝原	2,117	2,031	0	0	63	19	4,231	442	0	442	6,622	0	78	148	226	0	0	226	11,521
09-R3	本郷	0	0	66,370	33,043	573	157	100,144	1,454	0	1,454	156,725	27,092	0	0	0	26,413	0	53,505	311,828
10-L2	石見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L3	信喜	2,117	2,031	0	0	36	12	4,196	0	646	646	6,567	0	78	148	226	0	0	226	11,635
10-R1	浜原ダム	0	0	0	0	0	0	0	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	311
10-R2	潮下(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R3	潮下(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-L1	都賀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R1	滝下(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R3	潮上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R2	曲利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L1	郷上	148,491	100,710	4,127	883	1,167	317	255,695	1,468	0	1,468	400,163	3,780	4,107	4,492	8,599	3,745	0	16,124	673,450
12-L3	山根	0	0	0	0	809	219	1,028	849	0	849	1,609	0	0	0	0	0	0	0	3,486
12-L4	高梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L5	大浦(下流)	0	0	0	0	0	0	0	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	128
12-L6	大浦	0	0	0	0	877	251	1,128	1,360	0	1,360	1,765	0	0	0	0	0	0	0	4,253
12-R1	松原	1,151	294	0	0	0	0	1,445	0	0	0	2,261	0	42	83	124	0	0	124	3,830
12-R2	雪谷	0	0	0	0	716	209	924	1,212	0	1,212	1,446	0	0	0	0	0	0	0	3,582
12-R3	原	0	0	0	0	24	9	33	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	85
13-L1	都賀西	148,859	117,911	69,137	36,249	561	195	372,912	2,815	351	3,165	583,607	26,776	4,532	5,047	9,578	23,342	0	59,696	1,019,380
13-L2	乙谷	0	0	0	0	18	5	24	311	0	311	38	0	0	0	0	0	0	0	373
13-R1	都賀本郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R2	上野(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R3	上野(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R4	上野(上流Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L1	下郷(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L2	下郷	0	0	0	0	262	70	333	829	0	829	521	0	0	0	0	0	0	0	1,683
14-R1	柳原(作木)	9,463	7,410	1,834	299	95	36	19,136	0	0	0	29,948	2,215	314	358	672	470	0	3,357	52,441
14-R2	柳原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L1	引城	0	0	0	0	0	0	0	0	376	376	0	0	0	0	0	0	0	0	376
15-L2	西之原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L3	西之原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-R1	伊賀和志	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L1	坂谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名:江の川　河川名:江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成57年度末河道)　河川名:江の川(現況河道:平成22年度測量断面)流量規模:1/50　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
16-L2	坂谷(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L3	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R1	井手平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R5	大津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R2	折敷谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R3	式	9,375	8,628	0	0	1,705	562	20,270	538	0	538	31,723	0	295	502	797	0	0	797	53,328
16-R4	丹波	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L0	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L1	青山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L2	上ヶ畑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R1	港	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R2	熊見下(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R3	熊見下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L1	川根	0	0	0	0	0	0	0	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	79
18-L2	川根(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L3	竹貞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L4	梶矢(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R1	熊見	0	0	0	0	428	129	557	0	0	0	872	0	0	0	0	0	0	0	1,429
18-R2	香淀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R3	門田(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L1	梶矢(上流)	11,566	13,699	0	0	126	47	25,438	1,114	0	1,114	39,810	0	416	620	1,036	0	0	1,036	67,398
19-L2	林	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L3	式敷	4,057	4,566	407	67	0	0	9,097	2,313	0	2,313	14,237	492	139	207	345	470	0	1,307	26,954
19-L4	信木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R1	門田(上流)	202,245	28,756	0	0	136	47	231,184	1,637	0	1,637	361,803	0	1,131	1,186	2,317	0	0	2,317	596,941
19-R2	川毛	10,405	7,998	17,396	13,113	252	83	49,247	673	0	673	77,072	10,114	397	523	921	10,282	0	21,317	148,309
19-R3	上組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L1	所木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L2	船佐(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L3	船佐(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R1	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R2	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R3	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L1	下長谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L2	馬行谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L3	下津河内	964	294	0	0	0	0	1,258	136	0	136	1,969	0	42	83	124	0	0	124	3,487
21-R1	引字根	0	0	85,853	62,423	0	0	148,276	0	0	0	232,052	14,165	0	0	0	3,726	0	17,891	398,219
21-R2	下乙原	3,855	4,566	0	0	0	0	8,422	0	0	0	13,180	0	139	207	345	0	0	345	21,947
21-R3	日下	137,674	113,877	22,525	18,719	406	126	293,326	6,127	0	6,127	459,055	12,054	4,193	5,046	9,239	10,282	0	31,575	790,083
22-L1	荒瀬(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L2	岩脇	3,154	2,031	0	0	0	0	5,185	0	0	0	8,115	0	78	148	226	0	0	226	13,526
22-L3	十日市・南畑敷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R1	板崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R2	中所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R3	三次町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R4	寺戸桧原	1,682,007	1,234,927	4,903,016	990,518	9,240	2,527	8,822,234	5,990	3,463	9,454	13,806,796	507,990	46,288	33,033	79,321	196,617	0	783,928	23,422,412
22-R5	畠敷町(Ⅰ・Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R6	畠敷町(Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L1	中ノ村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L2	亀谷	6,615	6,597	0	0	0	0	13,213	277	0	277	20,678	0	217	354	571	0	0	571	34,739
23-L3	米丸	0	0	173,910	127,769	1,287	479	303,446	1,249	0	1,249	474,893	43,927	0	0	0	21,445	0	65,372	844,960
23-L4	旭	108,273	11,542	0	0	0	0	119,814	1,846	0	1,846	187,509	0	499	897	1,395	0	0	1,395	310,564
23-L5	上村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R1	大村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R2	船所	10,339	8,922	5,423	894	537	174	26,290	272	0	272	41,144	3,485	337	584	921	2,639	0	7,045	74,751
23-R3	青河	13,231	9,805	6,462	10,182	151	44	39,874	3,308	0	3,308	62,403	2,727	462	832	1,294	3,726	0	7,747	113,332
23-R4	鈴江	3,855	4,566	0	0	229	81	8,732	1,235	0	1,235	13,666	0	139	207	345	0	0	345	23,978
24-L1	若屋	0	0	0	0	0	0	0	1,461	0	1,461	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461
24-L2	秋町	897,997	366,222	70,543	48,988	4,277	1,358	1,389,385	9,828	0	9,828	2,174,388	21,199	13,133	12,762	25,896	31,827	0	78,922	3,652,523
24-R1	片山	42,386	40,438	8,931	1,914	0	0	93,670	2,592	0	2,592	146,594	4,529	1,542	1,668	3,210	3,726	0	11,465	254,321
24-R2	下志和地	174,108	44,119	17,494	9,438	678	216	246,053	6,461	0	6,461	385,073	7,227	2,255	3,995	6,250	6,125	0	19,602	657,189
25-L1	深瀬	29,739	5,918	2,462	1,905	199	62	40,284	4,152	0	4,152	63,044	1,105	269	513	782	535	0	2,422	109,902

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名:江の川　河川名:江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成57年度末河道)　河川名:江の川(現況河道:平成22年度測量断面)流量規模:1/50　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
25-L2	甲立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R1	上志和地	1,873,016	838,959	98,628	84,244	10,500	3,230	2,908,577	18,843	2,257	21,100	4,551,923	41,528	30,561	26,701	57,261	67,816	0	166,605	7,648,205
25-R2	川立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R1	高田原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R2	法恩時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-L1	篠原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L1	市ヶ原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L2	高屋	0	0	17,406	4,958	1,161	316	23,841	1,287	0	1,287	37,311	15,356	0	0	0	6,619	0	21,975	84,414
27-R1	下小原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R2	柳原(吉田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R3	国司-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L1	内堀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L2	山手(-常友)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L3	桂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L4	長屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R1	国司-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R2	下入江(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R3	下入江(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R4	上入江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-L1	下土師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-R1	北原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L2	郷川	3,286	882	6,462	10,182	48	17	20,878	1,130	0	1,130	32,674	2,727	125	248	373	3,726	0	6,826	61,508
30-L3	中三原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L5	下三原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L4	小松原	16,736	14,231	10,772	5,965	0	0	47,704	771	0	771	74,657	4,126	544	552	1,096	470	0	5,692	128,824
30-R2	向三原	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	240
30-R3	下布野	0	0	0	0	0	0	0	405	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	405
30-R4	鈩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-R5	河戸	105,389	38,874	83,028	26,959	1,132	402	255,786	498	1,503	2,001	400,305	8,099	1,451	1,781	3,232	4,022	0	15,353	673,445
1/80区間の合計		3,159,560	1,337,089	401,258	290,293	19,019	5,960	5,213,179	52,809	2,257	55,066	8,158,625	141,085	49,413	48,513	97,926	144,459	0	383,469	13,810,339
1/100区間の合計		18,789,901	13,715,673	8,553,907	2,747,160	97,135	27,311	43,931,087	71,321	73,113	144,434	68,752,151	2,036,819	506,624	398,756	905,380	1,472,114	0	4,414,313	117,241,985
合計		21,949,461	15,052,762	8,955,165	3,037,453	116,154	33,271	49,144,266	124,130	75,370	199,498	76,910,779	2,177,904	556,037	447,269	1,003,305	1,616,573	0	4,797,775	131,052,318

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成57年度末河道)　　河川名：江の川(現況河道：平成22年度測量断面，流量規模：1/80　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
				事業所資産		農漁家資産								清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
番号	地先名	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計									
01-L1	江津	1,892,192	726,423	781,718	345,483	999	360	3,747,175	0	0	0	5,864,329	188,096	26,390	32,603	58,993	108,122	0	355,211	9,966,715
01-L2	本町	243,123	293,433	70,059	16,458	613	203	623,888	0	0	0	976,385	9,388	10,746	11,385	22,131	16,041	0	47,560	1,647,833
01-L6	郷田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L3	千金(下流)	4,326	6,597	0	0	152	43	11,119	282	0	282	17,401	0	217	354	571	0	0	571	29,373
01-L7	千金(上流)	209,927	181,153	44,318	29,823	766	212	466,198	438	3,742	4,179	729,600	38,505	6,837	4,880	11,717	19,857	0	70,079	1,270,056
01-L4	田野村	96,167	103,568	0	0	1,242	344	201,320	970	2,348	3,318	315,066	0	3,835	3,270	7,105	0	0	7,105	526,809
01-L5	赤栗	9,760	18,265	0	0	2,423	679	31,128	0	1,737	1,737	48,715	0	555	826	1,381	0	0	1,381	82,961
01-R1	渡津	2,110,077	891,349	757,148	351,158	886	304	4,110,922	0	0	0	6,433,593	203,359	32,395	35,055	67,450	85,964	0	356,773	10,901,288
01-R5	長田	3,692,069	3,129,463	641,504	180,606	7,364	2,049	7,653,056	0	4,035	4,035	11,977,033	123,507	112,757	82,655	195,412	172,129	0	491,049	20,125,173
01-R2	太田	128,974	132,828	0	0	561	160	262,524	1,819	0	1,819	410,850	0	4,827	4,330	9,157	0	0	9,157	684,350
01-R3	八神(下流)	213,125	190,495	26,654	13,963	1,432	389	446,058	3,959	948	4,906	698,081	21,591	7,052	5,280	12,332	13,238	0	47,161	1,196,206
01-R4	八神(上流)	176,955	158,391	47,293	17,115	286	78	400,119	3,395	3,228	6,623	626,186	9,110	5,881	4,226	10,108	13,238	0	32,456	1,065,384
02-L1	川平(本川)	141,277	199,684	67,080	21,761	2,199	720	432,721	0	4,039	4,039	677,208	32,051	6,956	8,133	15,089	38,705	0	85,845	1,199,813
01-L8	瀬尻(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L2	瀬尻(上流)	7,546	8,124	0	0	138	38	15,846	443	1,076	1,519	24,799	0	313	590	903	0	0	903	43,067
02-L3	小松	7,546	8,124	0	0	0	0	15,670	0	404	404	24,524	0	313	590	903	0	0	903	41,501
02-L4	仁万瀬	21,981	23,014	0	0	0	0	44,994	0	0	0	70,416	0	800	756	1,556	0	0	1,556	116,966
01-L9	田野Ⅰ	231,415	254,087	0	0	868	237	486,608	707	538	1,245	761,542	0	8,675	6,472	15,146	0	0	15,146	1,264,541
02-L7	田野Ⅱ	26,984	25,353	102,335	85,990	2,954	802	244,417	2,506	0	2,506	382,513	40,922	993	997	1,990	14,163	0	57,075	686,511
02-L8	川平(支川)	188,110	152,690	0	0	1,550	420	342,770	212	0	212	536,435	0	5,748	3,776	9,524	0	0	9,524	888,941
02-L9	川平(その他)	0	0	0	0	63	17	80	556	0	556	125	0	0	0	0	0	0	0	761
02-R1	松川	577,739	510,247	61,924	18,436	9,666	2,652	1,180,665	11,829	0	11,829	1,847,741	49,640	18,708	13,423	32,131	29,052	0	110,823	3,151,058
01-R6	松川(上流)	870,963	467,071	28,241	10,363	7,267	1,990	1,385,894	1,940	4,304	6,244	2,168,924	16,380	17,344	11,793	29,137	36,237	0	81,754	3,642,816
02-R2	久坪	0	0	2,864	153	220	59	3,296	0	0	0	5,158	2,320	0	0	0	470	0	2,790	11,244
02-R3	橿原	7,546	8,124	0	0	0	0	15,670	279	227	505	24,524	0	313	590	903	0	0	903	41,602
02-R4	中長良	29,301	36,712	0	0	0	0	66,013	0	0	0	103,310	0	1,216	1,376	2,592	0	0	2,592	171,915
02-R5	上長良(本川)	18,454	16,570	44,266	21,909	195	54	101,448	380	470	850	158,766	13,300	881	1,693	2,575	3,700	0	19,575	280,639
02-R9	上長良(支川)	18,987	15,912	0	0	103	29	35,031	485	0	485	54,824	0	601	491	1,092	0	0	1,092	91,432
02-R6	大口(下流)	1,312	588	0	0	0	0	1,901	0	0	0	2,975	0	83	165	248	0	0	248	5,124
02-R7	大口(上流)	9,760	18,265	0	0	0	0	28,025	485	2,422	2,907	43,859	0	555	826	1,381	0	0	1,381	76,172
02-R8	下原	3,199	2,619	0	0	666	236	6,719	1,308	0	1,308	10,515	0	162	313	474	0	0	474	19,016
02-L6	志谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L4	川戸	1,751,816	839,265	181,335	146,841	4,749	1,305	2,925,310	0	3,513	3,513	4,578,110	93,903	31,496	21,462	52,958	130,877	0	277,737	7,784,670
03-L1	川戸(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L5	近原	1,886	2,031	0	0	0	0	3,917	0	340	340	6,130	0	78	148	226	0	0	226	10,613
03-L2	猪ノ瀬	2,440	4,566	0	0	0	0	7,006	0	0	0	10,964	0	139	207	345	0	0	345	18,315
03-L3	花河原	1,886	2,031	0	0	0	0	3,917	0	0	0	6,130	0	78	148	226	0	0	226	10,273
03-R1	下原(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R2	臼木(下流)	7,894	11,682	111,722	80,597	521	151	212,568	0	1,076	1,076	332,669	33,111	411	482	893	26,963	0	60,967	607,280
03-R3	臼木(上流)	6,213	8,628	0	0	92	25	14,958	0	0	0	23,409	0	295	502	797	0	0	797	39,164
03-R4	元折	10,416	18,559	946	1,135	351	116	31,524	364	0	364	49,335	927	597	909	1,505	470	0	2,902	84,125
03-L5	小原-桜江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-L1	田津	637,653	527,153	9,215	2,625	2,943	823	1,180,413	485	20,592	21,077	1,847,346	8,225	19,863	13,629	33,492	13,238	0	54,955	3,103,791
04-L3	恵梨	4,880	9,133	2,331	396	0	0	16,740	0	0	0	26,198	1,259	277	413	690	1,714	0	3,663	46,601
04-L4	川越(下流)	69,880	66,757	40,231	6,557	0	0	183,425	0	538	538	287,060	23,726	2,372	1,665	4,037	10,345	0	38,108	509,131
04-L2	川越(上流)	1,209,015	1,037,484	250,655	81,607	8,075	2,210	2,589,048	3,375	5,383	8,758	4,051,860	203,775	38,618	26,865	65,484	125,698	0	394,957	7,044,623
04-R1	榎谷	19,520	36,530	38,089	21,978	852	265	117,235	0	0	0	183,473	6,695	1,110	1,652	2,762	1,714	0	11,171	311,879
04-R2	久井谷	34,304	40,116	0	0	1,220	338	75,978	0	951	951	118,906	0	1,506	2,549	4,055	0	0	4,055	199,890
04-R5	和田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-R3	大貫	557,849	484,348	125,813	36,984	2,738	746	1,208,478	485	538	1,023	1,891,268	92,933	17,874	12,471	30,345	53,877	0	177,155	3,277,924
04-R4	坂本	16,978	18,279	0	0	1,200	347	36,804	970	0	970	57,598	0	704	1,328	2,032	0	0	2,032	97,404
05-L1	鹿賀(下流)	58,479	66,225	0	0	167	47	124,918	0	0	0	195,497	0	2,313	1,856	4,170	0	0	4,170	324,585
05-L2	鹿賀(上流)	323,420	300,366	0	0	1,743	479	626,008	0	3,722	3,722	979,703	0	10,817	8,221	19,038	0	0	19,038	1,628,471
05-R1	渦巻	26,123	39,612	7,924	1,348	296	97	75,400	0	0	0	118,001	4,394	1,372	1,654	3,025	1,714	0	9,133	202,534
05-R2	瀬尻(川本町)	2,440	4,566	4,095	1,167	29	10	12,307	0	120	120	19,260	3,709	139	207	345	6,619	0	10,673	42,360
05-R3	久料谷	32,377	59,656	0	0	425	137	92,594	121	680	801	144,910	0	1,845	2,767	4,612	0	0	4,612	242,917
05-R4	尾原	260,652	221,409	54,393	52,811	1,700	463	591,428	0	2,269	2,269	925,585	29,365	8,272	5,858	14,130	19,857	0	63,352	1,582,634
05-R5	松ヶ崎	51,303	41,643	24,606	13,380	0	0	130,932	0	0	0	204,909	19,736	1,568	1,030	2,598	13,238	0	35,572	371,413
06-L1	因原	2,640,874	1,169,439	453,050	237,674	8,955	2,488	4,512,480	849	477	1,326	7,062,031	220,844	43,658	30,836	74,493	136,080	0	431,417	12,007,254
06-L0	因原(支川)	64,995	21,502	9,508	6,134	218	59	102,417	0	477	477	160,283	4,587	809	532	1,341	2,504	0	8,431	271,608
06-L2	日向	5,637	4,944	35,007	29,944	204	58	75,795	74	0	74	118,619	12,538	282	543	824	13,645	0	27,007	221,495
06-L5	谷(本川)	34,526	55,314	81,559	28,471	219	78	200,166	0	0	0	313,260	42,622	1,796	2,892	4,688	16,487	0	63,797	577,223

①全体事業(H28～H57)

様式－3　被害額(事業実施後)　水系名:江の川　河川名:江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成57年度末河道)　河川名:江の川(現況河道:平成22年度測量断面)　流量規模:1/80　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
06-L3	谷(支川)	856,133	742,329	130,919	76,250	2,301	626	1,808,559	0	0	0	2,830,395	57,081	27,468	18,677	46,145	46,333	0	149,559	4,788,513
06-L4	川本	1,569,078	1,434,300	407,340	216,213	1,536	421	3,628,888	0	0	0	5,679,210	218,872	53,441	36,163	89,604	292,634	0	601,111	9,909,209
06-R1	木谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R2	下三島	8,053	8,418	23,325	6,725	463	129	47,113	0	498	498	73,732	12,049	355	673	1,028	5,591	0	18,668	140,011
06-R3	上三島	64,944	74,433	8,413	3,968	289	83	152,130	865	101	966	238,083	3,496	2,798	2,951	5,749	1,395	0	10,640	401,819
06-R5	谷戸(本川)	5,355	7,116	0	0	18	5	12,493	0	0	0	19,552	0	272	276	548	1,395	0	1,943	33,988
06-R4	谷戸(支川)	49,020	52,008	8,255	1,690	557	154	111,684	0	477	477	174,785	5,260	2,161	2,693	4,854	7,089	0	17,203	304,149
07-L1	木路原	7,831	13,993	5,285	879	118	42	28,148	190	0	190	44,052	4,770	458	702	1,160	2,184	0	8,114	80,504
07-L2	銅ヶ丸	644	294	29,528	28,529	0	0	58,995	0	0	0	92,327	8,477	42	83	124	6,619	0	15,220	166,542
07-L3	竹	12,428	18,853	0	0	449	122	31,852	909	1,814	2,723	49,848	0	638	991	1,629	0	0	1,629	86,052
07-R1	久座仁	118,635	111,216	79,249	25,486	4,096	1,157	339,838	0	0	0	531,846	54,980	4,096	3,231	7,327	25,297	0	87,604	959,288
07-R2	多田	7,288	11,458	0	0	0	0	18,745	69	0	69	29,336	0	397	643	1,040	0	0	1,040	49,190
07-R3	市井原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R4	君谷湊	5,478	9,133	932	159	0	0	15,701	667	475	1,142	24,572	517	277	413	690	1,714	0	2,921	44,336
07-R5	君谷湊(支川)	24,327	26,711	0	0	898	251	52,187	2,729	0	2,729	81,673	0	931	956	1,887	0	0	1,887	138,476
08-L1	乙原	494,909	381,229	1,101,410	61,231	3,232	892	2,042,903	2,234	6,320	8,553	3,197,143	45,079	14,654	14,824	29,478	13,094	0	87,651	5,336,250
08-L2	�肇瀬	604,528	452,692	31,168	18,947	4,073	1,171	1,112,579	468	1,081	1,549	1,741,186	19,091	17,002	13,369	30,371	26,130	0	75,592	2,930,906
08-L3	明塚	98,779	89,953	31,219	22,699	579	218	243,448	775	2,335	3,110	380,996	5,151	3,405	3,517	6,923	3,726	0	15,800	643,354
08-L5	上明塚	8,101	9,133	15,061	23,465	0	0	55,759	432	0	432	87,263	10,305	277	413	690	8,333	0	19,328	162,782
08-L4	野井	1,013	294	0	0	0	0	1,307	242	0	242	2,045	0	42	83	124	0	0	124	3,718
08-R1	栗原	517,003	409,130	36,590	10,272	5,728	1,564	980,287	485	0	485	1,534,149	31,237	15,017	10,435	25,452	26,413	0	83,102	2,598,023
08-R2	吾郷	75,051	53,451	11,604	2,251	2,308	646	145,310	1,508	2,687	4,195	227,410	7,052	2,063	2,373	4,436	5,576	0	17,064	393,979
08-R3	高畑	39,217	40,886	4,195	714	1,330	368	86,710	485	2,208	2,692	135,701	2,326	1,308	2,030	3,338	1,714	0	7,378	232,481
09-L1	亀村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R1	小原(邑智)	72,082	48,954	13,384	8,190	2,041	573	145,225	2,372	0	2,372	227,277	4,994	1,952	2,410	4,363	3,700	0	13,057	387,931
09-R4	狛淵	7,894	7,116	0	0	1,992	558	17,560	1,211	0	1,211	27,481	0	272	276	548	0	0	548	46,800
09-R5	浜原(下流)	0	0	39,370	38,039	0	0	77,409	242	0	242	121,145	11,302	0	0	0	6,619	0	17,921	216,717
09-R2	浜原	504,529	462,791	1,046,577	175,420	3,108	1,039	2,193,464	1,974	0	1,974	3,432,771	82,843	17,230	18,052	35,283	98,277	0	216,403	5,844,612
10-L1	滝原	8,331	7,998	0	0	108	33	16,470	485	1,005	1,490	25,776	0	397	523	921	0	0	921	44,657
09-R3	本郷	4,419	1,765	66,687	35,012	590	161	108,634	1,488	0	1,488	170,012	29,140	250	495	745	26,476	0	56,361	336,495
10-L2	石見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L3	信喜	6,421	6,037	0	0	45	16	12,519	0	1,164	1,164	19,592	0	347	619	966	0	0	966	34,241
10-R1	浜原ダム	0	0	0	0	0	0	0	363	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	363
10-R2	潮下(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R3	潮下(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-L1	都賀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R1	滝下(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R3	潮上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R2	曲利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L1	郷上	299,537	237,447	33,175	7,985	2,974	847	581,964	1,993	0	1,993	910,774	22,790	8,403	8,468	16,872	24,799	0	64,461	1,559,192
12-L3	山根	19,125	12,984	2,275	1,487	829	225	36,926	1,143	0	1,143	57,789	1,938	493	879	1,373	1,395	0	4,706	100,564
12-L4	高梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L5	大浦(下流)	0	0	0	0	0	0	0	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	145
12-L6	大浦	14,798	9,511	1,429	179	1,215	339	27,470	1,641	0	1,641	42,991	1,488	420	749	1,170	940	0	3,598	75,700
12-R1	松原	12,106	9,147	0	0	0	0	21,252	0	0	0	33,259	0	350	424	774	0	0	774	55,285
12-R2	響谷	19,125	12,984	0	0	1,113	316	33,539	1,960	0	1,960	52,489	0	493	879	1,373	0	0	1,373	89,361
12-R3	原	0	0	0	0	52	14	66	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	169
13-L1	都賀西	277,857	225,219	109,953	64,624	1,023	323	678,999	3,287	351	3,637	1,062,633	48,042	7,940	7,324	15,264	50,092	0	113,398	1,858,667
13-L2	乙谷	0	0	0	0	26	7	33	364	0	364	52	0	0	0	0	0	0	0	449
13-R1	都賀本郷	204,785	166,991	63,768	24,713	741	233	461,231	0	0	0	721,827	32,260	6,097	5,956	12,053	50,701	0	95,014	1,278,072
13-R2	上野(下流)	66,259	60,972	18,313	3,285	91	33	148,954	397	0	397	233,113	8,895	2,261	2,492	4,753	19,555	0	33,203	415,667
13-R3	上野(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R4	上野(上流Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L1	下郷(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L2	下郷	4,543	1,177	0	0	281	76	6,077	1,264	0	1,264	9,511	0	167	330	497	0	0	497	17,349
14-R1	柳原(作木)	32,748	27,524	14,614	3,133	302	91	78,412	0	0	0	122,715	7,606	1,028	960	1,989	3,726	0	13,321	214,448
14-R2	柳原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L1	引城	2,760	2,031	0	0	0	0	4,791	0	376	376	7,498	0	78	148	226	0	0	226	12,891
15-L2	西之原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L3	西之原	273,179	220,022	47,358	17,211	3,436	1,016	562,221	6,559	0	6,559	879,876	32,044	8,012	6,367	14,379	26,650	0	73,073	1,521,729
15-R1	伊賀和志	157,476	136,162	137,395	27,288	4,858	1,355	464,534	1,007	0	1,007	726,996	45,657	4,911	4,383	9,295	14,071	0	69,023	1,261,560
16-L1	坂谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式－3　被害額(事業実施後)　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成57年度末河道)　河川名：江の川(現況河道：平成22年度測量断面，流量規模：1/80　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
16-L2	坂谷(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L3	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R1	井手平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R5	大津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R2	折敷谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R3	式	50,141	41,657	0	0	2,956	868	95,622	752	0	752	149,648	0	1,599	2,304	3,903	0	0	3,903	249,925
16-R4	丹渡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L0	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L1	青山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L2	上ヶ畑	1,928	588	0	0	0	0	2,516	0	0	0	3,938	0	83	165	248	0	0	248	6,702
17-R1	港	134,432	113,415	93,979	26,265	588	183	368,862	0	0	0	577,269	56,929	4,259	4,657	8,916	38,031	0	103,876	1,050,007
17-R2	熊見下(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R3	熊見下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L1	川根	8,280	6,093	0	0	437	127	14,938	567	0	567	23,378	0	235	443	677	0	0	677	39,560
18-L2	川根(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L3	竹貞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L4	梶矢(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R1	熊見	0	0	0	0	628	176	804	0	0	0	1,258	0	0	0	0	0	0	0	2,062
18-R2	香淀	0	0	0	0	0	0	0	449	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	449
18-R3	門田(下流)	4,819	4,860	0	0	0	0	9,680	138	0	138	15,149	0	180	289	469	0	0	469	25,436
19-L1	梶矢(上流)	29,024	25,703	111,097	76,058	839	245	242,966	1,241	188	1,429	380,242	20,216	1,015	1,205	2,220	4,651	0	27,087	651,724
19-L2	林	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L3	式敷	7,906	7,116	1,865	317	0	0	17,203	2,800	0	2,800	26,923	1,034	272	276	548	1,714	0	3,296	50,222
19-L4	信木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R1	門田(上流)	348,316	48,142	0	0	210	76	396,744	1,726	0	1,726	620,904	0	1,677	1,402	3,079	0	0	3,079	1,022,453
19-R2	川毛	31,322	26,501	18,846	18,517	1,060	301	96,548	1,054	0	1,054	151,098	11,835	991	1,127	2,118	13,112	0	27,065	275,765
19-R3	上組	0	0	0	0	0	0	0	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	198
20-L1	所木	0	0	0	0	0	0	0	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	380
20-L2	船佐(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L3	船佐(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R1	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R2	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R3	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L1	下長谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L2	馬行谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L3	下津河内	7,513	7,116	0	0	0	0	14,629	136	0	136	22,894	0	272	276	548	0	0	548	38,207
21-R1	引字根	964	294	85,853	62,423	0	0	149,534	0	0	0	234,021	14,165	42	83	124	3,726	0	18,015	401,570
21-R2	下乙原	7,513	7,116	0	0	0	0	14,629	0	0	0	22,894	0	272	276	548	0	0	548	38,071
21-R3	日下	544,561	396,034	45,008	27,563	1,355	374	1,014,895	6,649	0	6,649	1,588,311	39,363	14,748	9,991	24,739	19,857	0	83,959	2,693,814
22-L1	荒瀬(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L2	岩脇	8,368	7,116	0	0	0	0	15,483	0	0	0	24,231	0	272	276	548	0	0	548	40,262
22-L3	十日市・南畑敷町	24,527,793	11,630,082	7,664,423	1,980,561	30,701	10,249	45,843,809	7,990	376	8,366	71,745,561	1,475,590	430,090	467,565	897,655	1,343,674	0	3,716,919	121,314,655
22-R1	板崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R2	中所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R3	三次町	12,392,331	5,379,475	1,299,627	597,287	8,762	2,712	19,680,194	0	0	0	30,799,504	416,104	194,474	178,716	373,189	630,934	0	1,420,226	51,899,924
22-R4	寺戸桧原	2,346,871	1,681,372	4,962,842	1,029,436	11,708	3,176	10,035,404	5,990	6,588	12,578	15,705,407	549,342	63,261	42,180	105,442	218,427	0	873,211	26,626,600
22-R5	畠敷町(Ⅰ・Ⅱ)	4,712,725	1,791,564	333,968	136,738	6,832	2,249	6,984,076	6,543	1,511	8,054	10,930,079	126,748	69,711	108,055	177,766	98,640	0	403,154	18,325,363
22-R6	畠敷町(Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L1	中ノ村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L2	亀谷	11,369	11,682	0	0	0	0	23,051	331	0	331	36,075	0	411	482	893	0	0	893	60,350
23-L3	米丸	3,724	2,325	213,955	171,082	1,759	582	393,428	1,334	0	1,334	615,715	59,955	120	230	350	23,583	0	83,888	1,094,365
23-L4	旭	122,272	19,288	0	0	0	0	141,560	2,491	0	2,491	221,541	0	669	1,151	1,820	0	0	1,820	367,412
23-L5	上村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R1	大村	0	0	0	0	94	27	121	71	0	71	189	0	0	0	0	0	0	0	381
23-R2	船所	31,281	30,549	52,080	8,525	2,167	706	125,308	828	0	828	196,107	18,470	1,122	1,484	2,606	20,872	0	41,948	364,191
23-R3	青河	34,676	29,317	9,745	15,886	681	213	90,517	3,913	0	3,913	141,659	6,664	1,144	1,822	2,966	7,026	0	16,656	252,745
23-R4	鈴江	7,513	7,116	0	0	287	108	15,024	1,316	0	1,316	23,513	0	272	276	548	0	0	548	40,401
24-L1	若屋	1,928	588	0	0	0	0	2,516	1,638	0	1,638	3,938	0	83	165	248	0	0	248	8,340
24-L2	秋町	1,053,668	423,784	76,058	55,948	5,027	1,511	1,615,996	10,030	0	10,030	2,529,034	24,459	15,049	13,599	28,648	36,732	0	89,839	4,244,899
24-R1	片山	64,160	59,824	8,931	1,914	0	0	134,829	2,723	0	2,723	211,007	4,529	2,088	1,884	3,972	3,726	0	12,227	360,786
24-R2	下志和地	731,935	248,306	68,875	42,411	3,660	1,287	1,096,473	11,677	0	11,677	1,715,980	19,408	8,966	11,506	20,472	23,982	0	63,862	2,887,992
25-L1	深瀬	150,806	41,121	14,791	14,268	617	206	221,809	5,528	0	5,528	347,131	4,589	1,567	1,918	3,485	3,509	0	11,583	586,051

①全体事業(H28～H57)

様式－3　被害額(事業実施後)　水系名:江の川　河川名:江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成57年度末河道)　河川名:江の川(現況河道:平成22年度測量断面; 流量規模:1/80　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
25-L2	甲立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R1	上志和地	2,025,714	899,552	103,716	90,272	11,316	3,421	3,133,992	19,457	2,257	21,714	4,904,697	44,579	32,703	27,765	60,468	73,498	0	178,545	8,238,948
25-R2	川立	164,152	33,254	0	0	0	0	197,406	2,078	0	2,078	308,940	0	1,202	967	2,169	0	0	2,169	510,593
26-R1	高田原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R2	法恩時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-L1	篠原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L1	市ヶ原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L2	高屋	0	0	18,081	5,769	1,174	320	25,344	1,504	0	1,504	39,663	16,018	0	0	0	7,089	0	23,107	89,618
27-R1	下小原	0	0	0	0	0	0	0	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	87
27-R2	柳原(吉田)	2,028	588	0	0	0	0	2,617	960	0	960	4,096	0	83	165	248	0	0	248	7,921
27-R3	国司-1	22,911	19,680	0	0	0	0	42,590	723	0	723	66,653	0	808	1,006	1,814	0	0	1,814	111,780
28-L1	内堀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L2	山手(-常友)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L3	桂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L4	長屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R1	国司-2	1,014	294	0	0	0	0	1,308	0	0	0	2,047	0	42	83	124	0	0	124	3,479
28-R2	下入江(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R3	下入江(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R4	上入江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-L1	下土師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-R1	北原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L2	郷川	16,626	15,730	7,912	15,586	146	44	56,045	1,473	0	1,473	87,710	4,448	494	767	1,261	6,556	0	12,265	157,493
30-L3	中三原	1,095	294	0	0	0	0	1,389	0	0	0	2,174	0	42	83	124	0	0	124	3,687
30-L5	下三原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L4	小松原	16,736	14,231	25,244	13,635	708	234	70,788	1,343	0	1,343	110,783	6,051	544	552	1,096	925	0	8,072	190,986
30-R2	向三原	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	240
30-R3	下布野	1,095	294	0	0	0	0	1,389	461	0	461	2,174	0	42	83	124	0	0	124	4,148
30-R4	鈩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-R5	河戸	159,184	61,439	113,001	40,874	1,787	581	376,865	514	1,503	2,017	589,794	11,343	2,170	2,189	4,359	6,329	0	22,031	990,707
1/80区間の合計		4,429,150	1,827,267	566,232	406,075	26,782	8,382	7,263,888	66,686	2,257	68,943	11,367,985	198,671	66,330	64,503	130,834	200,016	0	529,521	19,230,337
1/100区間の合計		70,687,602	39,540,481	22,388,341	6,794,172	200,827	59,019	139,670,442	119,311	101,249	220,560	218,584,242	5,098,428	1,458,397	1,377,861	2,836,259	4,314,769	0	12,249,456	370,724,700
合計		75,116,752	41,367,748	22,954,573	7,200,248	227,608	67,401	146,934,328	185,998	103,506	289,505	229,952,224	5,297,099	1,524,728	1,442,365	2,967,085	4,514,785	0	12,778,970	389,955,027

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成57年度末河道)　　流量規模：1/100　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
01-L1	江津	2,294,448	832,299	913,685	423,246	1,104	394	4,465,176	0	0	0	6,988,000	219,413	30,963	35,843	66,806	134,141	0	420,360	11,873,536
01-L2	本町	295,582	338,998	74,514	18,663	737	226	728,720	0	0	0	1,140,447	10,721	12,263	11,934	24,197	18,808	0	53,726	1,922,893
01-L6	郷田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L3	千金(下流)	4,880	9,133	0	0	167	48	14,227	289	0	289	22,265	0	277	413	690	0	0	690	37,471
01-L7	千金(上流)	209,927	181,153	44,318	29,823	784	218	466,223	445	3,742	4,186	729,639	38,505	6,837	4,880	11,717	19,857	0	70,079	1,270,127
01-L4	田野村	121,921	127,100	0	0	1,320	358	250,698	970	2,348	3,318	392,342	0	4,515	3,471	7,986	0	0	7,986	654,344
01-L5	赤栗	9,760	18,265	0	0	2,431	683	31,139	0	1,737	1,737	48,733	0	555	826	1,381	0	0	1,381	82,990
01-R1	渡津	2,165,224	906,791	766,167	358,263	903	308	4,197,656	0	0	0	6,569,332	206,744	32,984	35,356	68,340	87,682	0	362,766	11,129,754
01-R5	長田	3,829,109	3,186,955	652,704	185,091	7,553	2,092	7,863,503	0	4,035	4,035	12,306,382	127,230	115,238	83,585	198,823	175,889	0	501,942	20,675,862
01-R2	太田	156,102	156,584	0	0	591	167	313,443	1,819	0	1,819	490,538	0	5,648	4,776	10,424	0	0	10,424	816,224
01-R3	八神(下流)	219,564	196,378	26,654	13,963	1,434	390	458,383	3,959	978	4,937	717,369	21,591	7,222	5,330	12,552	13,238	0	47,381	1,228,070
01-R4	八神(上流)	176,955	158,391	47,293	17,115	286	78	400,119	3,395	3,228	6,623	626,186	9,110	5,881	4,226	10,108	13,238	0	32,456	1,065,384
02-L1	川平(本川)	158,562	222,571	78,359	29,962	2,265	751	492,472	0	4,082	4,082	770,719	34,860	7,865	8,716	16,581	43,518	0	94,959	1,362,232
01-L8	瀬尻(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L2	瀬尻(上流)	8,099	10,659	0	0	141	39	18,938	443	1,076	1,519	29,638	0	373	649	1,023	0	0	1,023	51,118
02-L3	小松	7,546	8,124	0	0	0	0	15,670	0	404	404	24,524	0	313	590	903	0	0	903	41,501
02-L4	仁万瀬	21,981	23,014	0	0	0	0	44,994	0	0	0	70,416	0	800	756	1,556	0	0	1,556	116,966
01-L9	田野Ⅰ	231,415	254,087	0	0	868	237	486,608	707	538	1,245	761,542	0	8,675	6,472	15,146	0	0	15,146	1,264,541
02-L7	田野Ⅱ	29,978	32,454	103,543	86,206	3,045	835	256,060	2,546	0	2,546	400,734	41,415	1,192	1,262	2,454	14,952	0	58,821	718,161
02-L8	川平(支川)	188,110	152,690	0	0	1,550	420	342,770	212	0	212	536,435	0	5,748	3,776	9,524	0	0	9,524	888,941
02-L9	川平(その他)	0	0	0	0	67	18	86	556	0	556	135	0	0	0	0	0	0	0	777
02-R1	松川	656,128	557,857	76,438	29,353	9,967	2,721	1,332,465	11,987	0	11,987	2,085,308	61,513	21,015	14,940	35,955	35,323	0	132,791	3,562,551
01-R6	松川(上流)	916,402	482,341	28,664	10,782	7,547	2,045	1,447,780	1,940	4,304	6,244	2,265,776	17,049	17,938	11,951	29,889	37,230	0	84,169	3,803,969
02-R2	久坪	0	0	6,712	349	225	61	7,347	0	0	0	11,498	3,402	0	0	0	925	0	4,327	23,172
02-R3	橿原	8,653	13,195	0	0	0	0	21,848	279	227	505	34,192	0	434	708	1,142	0	0	1,142	57,687
02-R4	中長良	29,301	36,712	0	0	0	0	66,013	0	0	0	103,310	0	1,216	1,376	2,592	0	0	2,592	171,915
02-R5	上長良(本川)	18,454	16,570	44,266	21,909	195	54	101,448	380	512	892	158,766	13,300	881	1,693	2,575	3,700	0	19,575	280,681
02-R9	上長良(支川)	18,987	15,912	0	0	117	32	35,048	485	0	485	54,850	0	601	491	1,092	0	0	1,092	91,475
02-R6	大口(下流)	3,855	2,913	0	0	0	0	6,768	0	0	0	10,592	0	203	395	598	0	0	598	17,958
02-R7	大口(上流)	12,774	20,814	0	0	0	0	33,589	485	2,422	2,907	52,567	0	688	895	1,584	0	0	1,584	90,647
02-R8	下原	39,205	46,895	8,117	1,293	2,195	634	98,338	1,663	596	2,259	153,899	6,137	1,674	1,801	3,475	1,850	0	11,462	265,958
02-L6	志谷	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791	1,791	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791
03-L4	川戸	1,797,863	858,126	186,023	152,291	4,874	1,336	3,000,512	0	3,513	3,513	4,695,801	96,232	32,188	21,803	53,991	134,041	0	284,264	7,984,090
03-L1	川戸(支川)	15,697	9,948	4,410	3,434	72	25	33,586	0	992	992	52,562	1,675	331	454	785	1,331	0	3,791	90,931
02-L5	近原	2,440	4,566	0	0	0	0	7,006	0	340	340	10,964	0	139	207	345	0	0	345	18,655
03-L2	猪ノ瀬	2,440	4,566	0	0	0	0	7,006	0	0	0	10,964	0	139	207	345	0	0	345	18,315
03-L3	花河原	2,440	4,566	0	0	0	0	7,006	0	0	0	10,964	0	139	207	345	0	0	345	18,315
03-R1	下原(上流)	10,894	9,437	4,011	1,492	41	15	25,889	0	747	747	40,516	2,102	457	786	1,243	2,258	0	5,603	72,755
03-R2	臼木(下流)	10,908	14,231	114,845	83,522	526	154	224,187	0	1,076	1,076	350,853	34,143	544	552	1,096	28,975	0	64,214	640,330
03-R3	臼木(上流)	6,213	8,628	0	0	92	25	14,958	0	0	0	23,409	0	295	502	797	0	0	797	39,164
03-R4	元折	14,661	22,845	2,217	2,595	389	134	42,841	364	0	364	67,046	1,359	767	1,043	1,810	925	0	4,094	114,345
03-L5	小原-桜江	656	294	0	0	0	0	950	0	0	0	1,487	0	42	83	124	0	0	124	2,561
04-L1	田津	652,191	546,525	9,215	2,625	3,139	876	1,214,572	485	20,592	21,077	1,900,805	8,225	20,384	13,906	34,291	13,238	0	55,754	3,192,208
04-L3	恵梨	10,908	14,231	4,059	870	0	0	30,069	0	0	0	47,058	2,058	544	552	1,096	3,726	0	6,880	84,007
04-L4	川越(下流)	69,880	66,757	40,231	6,557	0	0	183,425	0	538	538	287,060	23,726	2,372	1,665	4,037	10,345	0	38,108	509,131
04-L2	川越(上流)	1,224,230	1,046,071	250,655	81,607	8,114	2,223	2,612,900	3,397	5,383	8,779	4,089,189	203,775	39,009	27,093	66,102	125,698	0	395,575	7,106,443
04-R1	榎谷	19,520	36,530	38,089	21,978	852	265	117,235	0	0	0	183,473	6,695	1,110	1,652	2,762	1,714	0	11,171	311,879
04-R2	久井谷	35,514	42,945	0	0	1,220	338	80,017	0	951	951	125,227	0	1,608	2,690	4,299	0	0	4,299	210,494
04-R5	和田	234,204	193,451	13,802	2,959	1,966	533	446,914	0	2,153	2,153	699,420	7,184	7,235	4,789	12,024	3,726	0	22,934	1,171,421
04-R3	大貫	565,108	491,183	129,678	37,686	2,750	752	1,227,158	485	538	1,023	1,920,502	94,258	18,177	12,675	30,852	54,666	0	179,776	3,328,459
04-R4	坂本	21,960	41,097	0	0	1,366	389	64,812	970	0	970	101,431	0	1,248	1,859	3,107	0	0	3,107	170,320
05-L1	鹿賀(下流)	75,334	73,873	0	0	193	52	149,452	0	0	0	233,892	0	2,644	1,941	4,585	0	0	4,585	387,929
05-L2	鹿賀(上流)	376,609	326,895	0	0	1,806	500	705,810	0	3,722	3,722	1,104,593	0	12,228	8,865	21,093	0	0	21,093	1,835,218
05-R1	渦巻	44,618	55,692	13,802	2,959	412	125	117,607	0	0	0	184,055	7,184	2,076	1,981	4,057	3,726	0	14,967	316,629
05-R2	瀬尻(川本町)	5,454	7,116	4,095	1,167	36	13	17,881	0	120	120	27,984	3,709	272	276	548	6,619	0	10,876	56,861
05-R3	久料谷	72,791	94,533	0	0	489	167	167,981	121	718	839	262,890	0	3,617	3,734	7,351	0	0	7,351	439,061
05-R4	尾原	268,302	231,872	54,393	52,811	1,709	467	609,554	0	2,269	2,269	953,952	29,365	8,702	6,197	14,899	19,857	0	64,121	1,629,896
05-R5	松ヶ崎	51,303	41,643	24,606	13,380	0	0	130,932	0	0	0	204,909	19,736	1,568	1,030	2,598	13,238	0	35,572	371,413
06-L1	因原	2,739,857	1,217,145	469,706	247,025	9,237	2,566	4,685,535	849	477	1,326	7,332,862	228,853	45,441	31,732	77,173	142,001	0	448,027	12,467,750
06-L0	因原(支川)	64,995	21,502	9,508	6,134	218	59	102,417	0	477	477	160,283	4,587	809	532	1,341	2,504	0	8,431	271,608
06-L2	日向	10,348	15,226	35,841	30,177	268	81	91,940	79	0	79	143,886	14,015	512	856	1,368	14,163	0	29,546	265,451
06-L5	谷(本川)	64,964	96,004	146,432	62,128	275	103	369,906	0	0	0	578,903	66,576	3,421	3,929	7,350	34,950	0	108,876	1,057,685

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成57年度末河道)　　流量規模：1/100　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
06-L3	谷(支川)	884,498	761,897	130,919	76,250	2,360	645	1,856,570	0	0	0	2,905,532	57,081	28,421	19,657	48,078	46,333	0	151,492	4,913,594
06-L4	川本	1,655,843	1,494,122	421,175	225,323	1,564	428	3,798,457	0	0	0	5,944,585	230,685	55,891	37,383	93,274	304,783	0	628,741	10,371,783
06-R1	木谷	1,933	882	0	0	0	0	2,815	0	0	0	4,405	0	125	248	373	0	0	373	7,593
06-R2	下三島	12,482	11,626	43,075	13,471	554	151	81,358	0	505	505	127,325	23,368	600	1,151	1,750	9,640	0	34,758	243,946
06-R3	上三島	170,031	174,905	45,851	16,053	423	118	407,381	1,091	140	1,232	637,551	24,544	6,566	5,894	12,460	9,195	0	46,199	1,092,363
06-R5	谷戸(本川)	11,676	12,998	0	0	35	9	24,719	0	0	0	38,685	0	442	326	768	10,345	0	11,113	74,517
06-R4	谷戸(支川)	82,116	97,040	28,845	6,255	776	216	215,249	637	477	1,114	336,865	13,722	3,363	3,663	7,026	10,345	0	31,093	584,321
07-L1	木路原	27,842	26,711	13,085	4,114	133	49	71,935	200	0	200	112,578	13,578	1,596	2,556	4,152	4,064	0	21,794	206,507
07-L2	銅ヶ丸	1,852	2,031	29,528	28,529	0	0	61,940	0	0	0	96,936	8,477	78	148	226	6,619	0	15,322	174,198
07-L3	竹	28,722	32,524	0	0	449	122	61,817	909	1,877	2,786	96,744	0	1,245	1,399	2,644	0	0	2,644	163,991
07-R1	久座仁	127,513	118,863	89,276	28,233	4,133	1,174	369,193	0	0	0	577,787	59,617	4,496	3,439	7,936	27,309	0	94,862	1,041,842
07-R2	多田	13,750	19,092	0	0	0	0	32,841	727	0	727	51,396	0	725	841	1,566	0	0	1,566	86,530
07-R3	市井原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R4	君谷湊	8,861	11,682	932	159	0	0	21,633	667	601	1,267	33,856	517	411	482	893	1,714	0	3,124	59,880
07-R5	君谷湊(支川)	48,377	43,730	0	0	985	281	93,372	3,056	0	3,056	146,127	0	1,671	1,534	3,205	0	0	3,205	245,760
08-L1	乙原	608,808	574,147	1,111,747	66,972	4,039	1,196	2,366,909	2,497	8,078	10,576	3,704,213	48,179	19,929	19,361	39,290	18,617	0	106,086	6,187,784
08-L2	築瀬	677,392	514,183	33,101	26,152	4,577	1,279	1,256,685	727	1,136	1,863	1,966,712	21,385	18,853	14,474	33,327	28,960	0	83,672	3,308,932
08-L3	明塚	104,648	93,091	31,219	22,699	638	230	252,525	775	2,335	3,110	395,202	5,151	3,622	3,752	7,374	3,726	0	16,251	667,088
08-L5	上明塚	15,788	14,231	18,172	24,317	0	0	72,509	442	0	442	113,477	11,781	544	552	1,096	10,345	0	23,222	209,650
08-L4	野井	5,800	4,062	0	0	0	0	9,862	442	0	442	15,434	0	156	295	452	0	0	452	26,190
08-R1	栗原	535,921	413,515	36,859	10,500	5,859	1,606	1,004,259	485	0	485	1,571,665	33,379	15,295	10,552	25,846	26,476	0	85,701	2,662,110
08-R2	吾郷	90,103	77,081	17,337	3,825	2,505	720	191,571	1,562	2,803	4,365	299,809	10,855	2,657	2,836	5,492	9,984	0	26,331	522,076
08-R3	高畑	83,797	74,699	7,307	1,566	1,550	449	169,369	485	2,276	2,761	265,062	3,803	2,823	3,132	5,956	3,726	0	13,485	450,677
09-L1	亀村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R1	小原(邑智)	89,251	79,518	29,803	24,474	2,232	626	225,904	2,610	0	2,610	353,540	8,563	2,667	3,194	5,861	8,868	0	23,292	605,346
09-R4	狛淵	7,894	7,116	0	0	2,052	569	17,631	1,280	0	1,280	27,593	0	272	276	548	0	0	548	47,052
09-R5	浜原(下流)	1,013	294	39,370	38,039	0	0	78,716	242	0	242	123,191	11,302	42	83	124	6,619	0	18,045	220,194
09-R2	浜原	935,894	817,378	1,287,882	268,440	5,219	1,450	3,316,264	2,196	0	2,196	5,189,953	133,518	28,329	22,287	50,616	166,695	0	350,829	8,859,242
10-L1	滝原	11,093	11,472	0	0	164	50	22,779	553	2,311	2,864	35,649	0	470	654	1,124	0	0	1,124	62,416
09-R3	本郷	16,939	16,248	106,057	73,051	796	217	213,307	1,653	0	1,653	333,825	40,442	626	1,181	1,807	33,095	0	75,344	624,129
10-L2	石見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L3	信喜	7,894	6,625	0	0	72	24	14,615	0	1,535	1,535	22,872	0	431	784	1,215	0	0	1,215	40,237
10-R1	浜原ダム	0	0	0	0	0	0	0	363	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	363
10-R2	潮下(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R3	潮下(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-L1	都賀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R1	滝下(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R3	潮上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R2	曲利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L1	郷上	383,770	291,248	52,558	13,964	3,205	931	745,676	2,012	0	2,012	1,166,983	30,526	11,078	10,094	21,172	44,208	0	95,906	2,010,577
12-L3	山根	25,500	22,327	4,864	3,362	859	236	57,149	1,248	0	1,248	89,438	2,812	711	1,121	1,833	2,639	0	7,284	155,119
12-L4	高梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L5	大浦(下流)	0	0	0	0	0	0	0	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	145
12-L6	大浦	29,321	22,635	3,348	408	1,335	378	57,425	1,737	0	1,737	89,870	2,182	826	1,214	2,040	1,850	0	6,072	155,104
12-R1	松原	13,510	11,682	0	0	0	0	25,191	0	0	0	39,424	0	411	482	893	0	0	893	65,508
12-R2	響谷	30,978	27,412	0	0	1,189	345	59,923	2,140	0	2,140	93,779	0	905	1,250	2,155	0	0	2,155	157,997
12-R3	原	0	0	0	0	52	14	66	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	169
13-L1	都賀西	452,884	356,282	133,153	84,046	1,436	438	1,028,239	3,889	1,854	5,743	1,609,194	64,461	12,553	13,041	25,594	67,942	0	157,997	2,801,173
13-L2	乙谷	0	0	0	0	27	8	35	364	0	364	55	0	0	0	0	0	0	0	454
13-R1	都賀本郷	302,045	232,754	88,729	43,397	1,003	297	668,226	0	0	0	1,045,774	49,680	8,553	7,915	16,468	73,256	0	139,404	1,853,404
13-R2	上野(下流)	75,097	68,606	19,450	3,492	141	45	166,830	397	0	397	261,089	9,274	2,589	2,690	5,278	20,344	0	34,896	463,212
13-R3	上野(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R4	上野(上流Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L1	下郷(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L2	下郷	38,348	30,059	0	0	344	95	68,846	1,284	0	1,284	107,744	0	1,041	947	1,988	0	0	1,988	179,862
14-R1	柳原(作木)	41,357	35,144	14,614	3,133	302	91	94,640	0	0	0	148,112	7,606	1,235	1,076	2,311	3,726	0	13,643	256,395
14-R2	柳原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L1	引城	3,855	4,566	0	0	0	0	8,422	0	376	376	13,180	0	139	207	345	0	0	345	22,323
15-L2	西之原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L3	西之原	300,648	239,380	61,463	28,348	3,984	1,154	634,977	6,678	0	6,678	993,739	37,858	8,970	7,079	16,048	34,698	0	88,604	1,723,998
15-R1	伊賀和志	195,635	168,196	155,036	33,820	5,196	1,435	559,318	1,007	0	1,007	875,333	58,046	6,075	5,245	11,321	17,826	0	87,193	1,522,851
16-L1	坂谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

①全体事業(H28～H57)

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成57年度末河道)　　流量規模：1/100　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
16-L2	坂谷(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L3	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R1	井手平	0	0	0	0	0	0	0	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	97
16-R5	大津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R2	折敷谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R3	式	67,753	72,892	0	0	3,920	1,116	145,681	808	0	808	227,991	0	2,374	2,943	5,317	0	0	5,317	379,797
16-R4	丹渡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L0	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L1	青山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L2	上ヶ畑	5,520	4,062	0	0	0	0	9,582	0	0	0	14,996	0	156	295	452	0	0	452	25,030
17-R1	港	203,937	175,774	138,913	44,821	707	227	564,378	0	0	0	883,252	78,081	6,531	7,164	13,696	55,588	0	147,365	1,594,995
17-R2	熊見下(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R3	熊見下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L1	川根	14,326	15,730	0	0	664	236	30,957	738	0	738	48,448	0	494	767	1,261	0	0	1,261	81,404
18-L2	川根(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L3	竹貞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L4	梶矢(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R1	熊見	0	0	0	0	653	187	841	0	0	0	1,316	0	0	0	0	0	0	0	2,157
18-R2	香淀	964	294	0	0	0	0	1,258	556	0	556	1,969	0	42	83	124	0	0	124	3,907
18-R3	門田(下流)	6,615	6,597	0	0	0	0	13,213	151	0	151	20,678	0	217	354	571	0	0	571	34,613
19-L1	梶矢(上流)	30,821	27,440	135,145	90,865	1,056	323	285,649	1,250	188	1,438	447,041	22,829	1,051	1,271	2,322	5,440	0	30,591	764,719
19-L2	林	0	0	0	0	0	0	0	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	315
19-L3	式敷	8,920	7,410	3,596	600	0	0	20,526	3,156	0	3,156	32,123	3,072	314	358	672	2,184	0	5,928	61,733
19-L4	信木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R1	門田(上流)	391,594	56,560	0	0	365	109	448,628	1,765	0	1,765	702,103	0	1,908	1,511	3,419	0	0	3,419	1,155,915
19-R2	川毛	36,404	35,844	19,174	18,794	1,083	309	111,609	1,072	0	1,072	174,668	14,385	1,209	1,369	2,578	13,175	0	30,138	317,487
19-R3	上組	0	0	0	0	0	0	0	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	198
20-L1	所木	0	0	0	0	0	0	0	421	0	421	0	0	0	0	0	0	0	0	421
20-L2	船佐(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L3	船佐(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R1	唐香	125,026	118,499	5,162	9,835	3,042	855	262,419	574	0	574	410,686	3,194	4,353	3,459	7,812	3,934	0	14,940	688,619
20-R2	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R3	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L1	下長谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L2	馬行谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L3	下津河内	8,477	7,410	0	0	0	0	15,887	233	0	233	24,863	0	314	358	672	0	0	672	41,655
21-R1	引字根	964	294	105,112	95,552	0	0	201,922	0	0	0	316,008	23,104	42	83	124	6,556	0	29,784	547,714
21-R2	下乙原	7,513	7,116	0	0	0	0	14,629	0	0	0	22,894	0	272	276	548	0	0	548	38,071
21-R3	日下	561,384	402,897	45,008	27,563	1,363	377	1,038,593	6,649	0	6,649	1,625,398	39,363	15,176	10,164	25,340	19,857	0	84,560	2,755,200
22-L1	荒瀬(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L2	岩脇	8,368	7,116	1,121	183	17	5	16,809	0	0	0	26,306	1,319	272	276	548	470	0	2,337	45,452
22-L3	十日市・南畑敷町	24,527,793	11,630,082	7,664,423	1,980,561	30,701	10,249	45,843,809	7,990	376	8,366	71,745,561	1,475,590	430,090	467,565	897,655	1,343,674	0	3,716,919	121,314,655
22-R1	板崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R2	中所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R3	三次町	15,234,283	6,503,002	1,501,381	718,477	10,569	3,180	23,970,891	0	0	0	37,514,444	503,044	235,358	201,765	437,123	764,205	0	1,704,372	63,189,707
22-R4	寺戸 桧原	2,346,871	1,681,372	4,962,842	1,029,436	11,708	3,176	10,035,404	5,990	6,588	12,578	15,705,407	549,342	63,261	42,180	105,442	218,427	0	873,211	26,626,600
22-R5	畠敷町(Ⅰ・Ⅱ)	7,457,017	2,979,064	525,612	234,402	10,351	3,508	11,209,954	8,154	3,176	11,329	17,543,578	180,075	110,753	145,942	256,695	161,936	0	598,706	29,363,567
22-R6	畠敷町(Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L2	郷川	28,258	23,378	8,149	17,063	157	49	77,054	1,473	0	1,473	120,590	5,984	895	975	1,870	6,619	0	14,473	213,590
30-L3	中三原	2,191	588	8,316	1,101	0	0	12,196	198	0	198	19,087	4,852	83	165	248	940	0	6,040	37,521
30-L5	下三原	11,522	9,147	0	0	161	56	20,886	185	0	185	32,687	0	350	424	774	0	0	774	54,532
30-L4	小松原	16,736	14,231	50,412	28,625	1,293	424	111,721	1,612	0	1,612	174,843	9,983	544	552	1,096	2,184	0	13,263	301,439
30-R2	向三原	0	0	0	0	0	0	0	535	0	535	0	0	0	0	0	0	0	0	535
30-R3	下布野	3,154	2,031	0	0	0	0	5,185	466	0	466	8,115	0	78	148	226	0	0	226	13,992
30-R4	鉾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-R5	河戸	192,466	72,527	130,812	50,058	2,065	654	448,581	514	1,503	2,017	702,029	13,314	2,626	2,392	5,017	7,826	0	26,157	1,178,784
合計		79,764,778	44,489,766	23,786,987	7,559,742	225,601	66,126	155,893,000	128,912	114,759	243,671	243,972,545	5,616,372	1,636,215	1,508,240	3,144,455	4,845,015	0	13,605,842	413,715,058

様式－3　　被害額（事業実施後）　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川（平成33年度末河道）　　流量規模：1/5　　②当面事業（H28～H33）　　（千円）

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
01-L1	江津	13,571	4,098	4,432	1,100	7	2	23,209	0	0	0	36,322	2,294	211	406	617	599	0	3,510	63,041
01-L2	本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L6	郷田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L3	千金(下流)	4,880	9,133	0	0	51	17	14,080	152	0	152	22,035	0	277	413	690	0	0	690	36,957
01-L7	千金(上流)	6,397	5,239	8,007	3,524	88	29	23,284	227	1,478	1,706	36,439	6,520	323	625	949	2,320	0	9,789	71,218
01-L4	田野村	656	294	0	0	48	17	1,015	0	723	723	1,588	0	42	83	124	0	0	124	3,450
01-L5	赤栗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R1	渡津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R5	長田	413,771	510,041	173,158	29,639	1,456	480	1,128,545	0	2,298	2,298	1,766,173	26,383	19,278	31,539	50,816	28,353	0	105,552	3,002,568
01-R2	太田	6,543	7,814	0	0	52	16	14,426	421	0	421	22,577	0	283	252	535	0	0	535	37,959
01-R3	八神(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R4	八神(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L1	川平(本川)	0	0	0	0	29	11	39	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	100
01-L8	瀬尻(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L2	瀬尻(上流)	0	0	0	0	0	0	0	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	311
02-L3	小松	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L4	仁万瀬	2,440	4,566	0	0	0	0	7,006	0	0	0	10,964	0	139	207	345	0	0	345	18,315
01-L9	田野Ⅰ	0	0	0	0	0	0	0	40	142	183	0	0	0	0	0	0	0	0	183
02-L7	田野Ⅱ	0	0	0	0	60	18	78	304	0	304	122	0	0	0	0	0	0	0	504
02-L8	川平(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L9	川平(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R1	松川	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R6	松川(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R2	久坪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R3	橿原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R4	中長良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R5	上長良(本川)	4,326	6,597	0	0	101	31	11,056	364	0	364	17,303	0	217	354	571	0	0	571	29,294
02-R9	上長良(支川)	0	0	0	0	8	3	10	121	0	121	16	0	0	0	0	0	0	0	147
02-R6	大口(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R7	大口(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R8	下原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L6	志谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L4	川戸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L1	川戸(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L5	近原	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90
03-L2	猪ノ瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L3	花河原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R1	下原(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R2	臼木(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R3	臼木(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R4	元折	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L5	小原-桜江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-L1	田津	73,427	83,524	407	67	396	128	157,949	121	18,940	19,062	247,190	492	3,366	3,777	7,143	470	0	8,105	432,306
04-L3	恵梨	656	294	0	0	0	0	950	0	0	0	1,487	0	42	83	124	0	0	124	2,561
04-L4	川越(下流)	656	294	1,732	283	0	0	2,965	0	412	412	4,640	2,092	42	83	124	470	0	2,686	10,703
04-L2	川越(上流)	4,819	6,412	2,925	612	19	6	14,793	155	373	528	23,151	1,582	249	314	563	893	0	3,038	41,510
04-R1	榎谷	1,886	2,031	0	0	46	14	3,978	0	0	0	6,226	0	78	148	226	0	0	226	10,430
04-R2	久井谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-R5	和田	26,759	34,821	0	0	639	212	62,430	0	1,861	1,861	97,703	0	1,171	1,536	2,707	0	0	2,707	164,701
04-R3	大貫	1,990	2,252	2,869	360	68	20	7,558	22	12	34	11,828	1,275	83	90	173	649	0	2,097	21,517
04-R4	坂本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-L1	鹿賀(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-L2	鹿賀(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R1	渦巻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R2	瀬尻(川本町)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R3	久料谷	0	0	0	0	157	42	199	0	239	239	311	0	0	0	0	0	0	0	749
05-R4	尾原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R5	松ヶ崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L1	因原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L0	因原(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L2	日向	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L5	谷(本川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式－3　被害額(事業実施後)　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成33年度末河道)　流量規模：1/5　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
06-L3	谷(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L4	川本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R1	木谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R2	下三島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R3	上三島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R5	谷戸(本川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	0	470	470
06-R4	谷戸(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-L1	木路原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-L2	銅ヶ丸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-L3	竹	6,122	7,116	0	0	184	57	13,478	883	738	1,621	21,093	0	272	276	548	0	0	548	36,740
07-R1	久座仁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R2	多田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R3	市井原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R4	君谷湊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R5	君谷湊(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L1	乙原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L2	筆瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L3	明塚	0	0	0	0	0	0	0	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	110
08-L5	上明塚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L4	野井	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-R1	栗原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-R2	吾郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-R3	高畑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-L1	亀村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R1	小原(邑智)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R4	狛淵	0	0	0	0	120	38	158	347	0	347	247	0	0	0	0	0	0	0	752
09-R5	浜原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R2	浜原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L1	滝原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R3	本郷	0	0	0	0	72	24	96	445	0	445	150	0	0	0	0	0	0	0	691
10-L2	石見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L3	信喜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R1	浜原ダム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R2	潮下(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R3	潮下(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-L1	都賀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R1	滝下(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R3	潮上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R2	曲利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L1	郷上	0	0	0	0	0	0	0	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	34
12-L3	山根	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L4	高梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L5	大浦(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L6	大浦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-R1	松原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-R2	響谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-R3	原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-L1	都賀西	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-L2	乙谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R1	都賀本郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R2	上野(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R3	上野(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R4	上野(上流Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L1	下郷(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L2	下郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-R1	柳原(作木)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-R2	柳原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L1	引城	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L2	西之原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L3	西之原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-R1	伊賀和志	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L1	坂谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

②当面事業(H28～H33)

様式－3　被害額(事業実施後)　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成33年度末河道)　流量規模：1/5　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
16-L2	坂谷(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L3	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R1	井手平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R5	大津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R2	折敷谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R3	式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R4	丹渡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L0	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L1	青山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L2	上ヶ畑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R1	港	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R2	熊見下(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R3	熊見下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L1	川根	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L2	川根(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L3	竹貞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L4	梶矢(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R1	熊見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R2	香淀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R3	門田(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L1	梶矢(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L2	林	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L3	式敷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L4	信木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R1	門田(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R2	川毛	0	0	0	0	0	0	0	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	62
19-R3	上組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L1	所木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L2	船佐(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L3	船佐(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R1	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R2	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R3	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L1	下長谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L2	馬行谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L3	下津河内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R1	引字根	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R2	下乙原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R3	日下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L1	荒瀬(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L2	岩脇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L3	十日市・南畑敷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R1	板崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R2	中所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R3	三次町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R4	寺戸桧原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R5	畠敷町(Ⅰ・Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R6	畠敷町(Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L1	中ノ村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L2	亀谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L3	米丸	6,484	4,356	0	0	0	0	10,840	0	0	0	16,965	0	198	378	576	0	0	576	28,381
23-L4	旭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L5	上村	7,513	7,116	0	0	0	0	14,629	294	0	294	22,894	0	272	276	548	0	0	548	38,365
23-R1	大村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R2	船所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R3	青河	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R4	鈴江	0	0	0	0	0	0	0	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	95
24-L1	若屋	0	0	0	0	0	0	0	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	64
24-L2	秋町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-R1	片山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-R2	下志和地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-L1	深瀬	0	0	0	0	181	61	243	785	0	785	380	4,289	1,236	2,036	3,272	2,544	0	10,105	11,513

②当面事業(H28～H33)

様式－3　被害額(事業実施後)　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成33年度末河道)　流量規模：1/5　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
25-L2	甲立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R1	上志和地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R2	川立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R1	高田原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R2	法恩時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-L1	篠原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L1	市ヶ原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L2	高屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R1	下小原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R2	柳原(吉田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R3	国司-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L1	内堀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L2	山手(-常友)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L3	桂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L4	長屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R1	国司-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R2	下入江(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R3	下入江(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R4	上入江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-L1	下土師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-R1	北原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L2	郷川	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L3	中三原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L5	下三原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L4	小松原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-R2	向三原	0	0	0	0	0	0	0	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	188
30-R3	下布野	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-R4	鈩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-R5	河戸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/80区間の合計		13,997	11,472	0	0	181	61	25,712	1,239	0	1,239	40,239	4,289	1,706	2,690	4,396	2,544	0	11,229	78,419
1/100区間の合計		568,902	684,526	193,529	35,583	3,600	1,164	1,487,303	4,308	27,307	31,615	2,327,629	40,638	26,073	40,184	66,257	34,224	0	141,119	3,987,666
合計		582,899	695,998	193,529	35,583	3,781	1,225	1,513,014	5,547	27,307	32,854	2,367,865	44,927	27,779	42,873	70,651	36,768	0	152,346	4,066,079

②当面事業（H28～H33）

様式－3　　被害額（事業実施後）　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川（平成33年度末河道）　　流量規模：1/10　　（千円）

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
01-L1	江津	189,193	59,931	74,069	24,352	134	41	347,720	0	0	0	544,182	32,140	3,228	6,110	9,338	11,863	0	53,342	945,244
01-L2	本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L6	郷田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L3	千金(下流)	10,908	14,231	0	0	93	29	25,261	208	0	208	39,533	0	544	552	1,096	0	0	1,096	66,098
01-L7	千金(上流)	30,101	42,651	29,265	16,186	223	79	118,506	332	2,848	3,180	185,462	14,759	1,490	2,116	3,606	9,166	0	27,531	334,679
01-L4	田野村	2,440	4,566	0	0	219	76	7,301	0	1,531	1,531	11,426	0	139	207	345	0	0	345	20,603
01-L5	赤栗	0	0	0	0	270	84	354	0	974	974	554	0	0	0	0	0	0	0	1,882
01-R1	渡津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R5	長田	1,556,779	1,803,718	471,401	109,682	3,983	1,319	3,946,882	0	3,766	3,766	6,176,870	67,253	65,232	64,568	129,800	103,182	0	300,235	10,427,753
01-R2	太田	12,840	12,280	0	0	81	23	25,224	475	0	475	39,476	0	462	399	861	0	0	861	66,036
01-R3	八神(下流)	12,187	15,042	2,848	1,419	221	67	31,784	967	167	1,134	49,742	1,491	559	620	1,179	1,335	0	4,004	86,664
01-R4	八神(上流)	6,149	9,760	15,174	3,354	21	7	34,465	852	412	1,264	53,938	1,628	322	460	782	1,561	0	3,971	93,638
02-L1	川平(本川)	0	0	0	0	445	121	566	0	1,812	1,812	886	0	0	0	0	0	0	0	3,264
01-L8	瀬尻(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L2	瀬尻(上流)	5,454	7,116	0	0	20	7	12,597	485	538	1,023	19,714	0	272	276	548	0	0	548	33,882
02-L3	小松	2,440	4,566	0	0	0	0	7,006	0	340	340	10,964	0	139	207	345	0	0	345	18,655
02-L4	仁万瀬	12,549	13,293	0	0	0	0	25,841	0	0	0	40,441	0	484	409	893	0	0	893	67,175
01-L9	田野Ⅰ	36,580	45,607	0	0	470	141	82,798	495	538	1,033	129,579	0	1,837	2,050	3,887	0	0	3,887	217,297
02-L7	田野Ⅱ	2,440	4,566	4,058	646	1,925	533	14,169	1,996	0	1,996	22,174	3,069	139	207	345	925	0	4,339	42,678
02-L8	川平(支川)	37,441	38,267	0	0	1,181	334	77,223	212	0	212	120,854	0	1,458	1,633	3,091	0	0	3,091	201,380
02-L9	川平(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R1	松川	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-R6	松川(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R2	久坪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R3	橿原	6,213	8,628	0	0	0	0	14,841	321	135	456	23,226	0	295	502	797	0	0	797	39,320
02-R4	中長良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-R5	上長良(本川)	47,899	53,815	4,970	1,332	214	61	108,290	364	538	902	169,474	3,357	1,955	1,695	3,650	6,556	0	13,563	292,229
02-R9	上長良(支川)	0	0	0	0	36	11	46	321	0	321	72	0	0	0	0	0	0	0	439
02-R6	大口(下流)	5,659	6,093	0	0	0	0	11,752	0	0	0	18,392	0	235	443	677	0	0	677	30,821
02-R7	大口(上流)	4,408	5,449	0	0	0	0	9,857	445	2,327	2,772	15,426	0	264	454	718	0	0	718	28,773
02-R8	下原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L6	志谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L4	川戸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L1	川戸(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L5	近原	0	0	0	0	0	0	0	0	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	340
03-L2	猪ノ瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L3	花河原	656	294	0	0	0	0	950	0	0	0	1,487	0	42	83	124	0	0	124	2,561
03-R1	下原(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R2	臼木(下流)	0	0	0	0	57	15	72	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	185
03-R3	臼木(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R4	元折	28,994	26,879	0	0	366	111	56,350	0	0	0	88,188	0	965	669	1,634	0	0	1,634	146,172
03-L5	小原-桜江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-L1	田津	439,681	401,399	8,946	2,398	1,896	549	854,868	485	20,426	20,911	1,337,868	6,114	14,885	11,138	26,023	13,112	0	45,249	2,258,896
04-L3	恵梨	7,894	11,682	2,331	396	0	0	22,303	0	0	0	34,904	1,259	411	482	893	1,714	0	3,866	61,073
04-L4	川越(下流)	5,454	7,116	13,802	2,959	0	0	29,330	0	538	538	45,901	7,184	272	276	548	3,726	0	11,458	87,227
04-L2	川越(上流)	224,166	193,411	49,113	16,333	1,534	420	484,978	641	1,034	1,674	758,991	39,607	7,157	4,962	12,119	23,580	0	75,305	1,320,948
04-R1	榎谷	17,347	20,114	38,089	21,978	209	64	97,801	0	0	0	153,059	6,695	714	602	1,316	1,714	0	9,725	260,585
04-R2	久井谷	34,448	33,995	0	0	497	145	69,085	0	994	994	108,118	0	1,237	945	2,182	0	0	2,182	180,379
04-R5	和田	103,364	110,963	0	0	1,407	402	216,136	0	2,153	2,153	338,253	0	4,028	3,546	7,574	0	0	7,574	564,116
04-R3	大貫	13,819	12,263	5,209	1,130	106	29	32,555	22	24	45	50,949	3,714	457	349	806	1,878	0	6,398	89,947
04-R4	坂本	0	0	0	0	817	226	1,043	970	0	970	1,632	0	0	0	0	0	0	0	3,645
05-L1	鹿賀(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-L2	鹿賀(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R1	渦巻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R2	瀬尻(川本町)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R3	久料谷	0	0	0	0	168	46	213	0	239	239	333	0	0	0	0	0	0	0	785
05-R4	尾原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R5	松ヶ崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L1	因原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L0	因原(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L2	日向	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L5	谷(本川)	1,288	588	9,792	3,727	0	0	15,396	0	0	0	24,095	9,007	83	165	248	1,880	0	11,135	50,626

様式－3　　被害額（事業実施後）　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川（平成33年度末河道）　　流量規模：1/10　　②当面事業（H28～H33）　　（千円）

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
06-L3	谷(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L4	川本	569,875	742,542	253,065	114,659	610	202	1,680,953	0	0	0	2,630,691	99,415	26,183	23,423	49,606	160,347	0	309,368	4,621,012
06-R1	木谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R2	下三島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R3	上三島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-R5	谷戸(本川)	11,676	12,998	0	0	25	7	24,707	0	0	0	38,666	0	442	326	768	7,452	0	8,220	71,593
06-R4	谷戸(支川)	11,676	12,998	5,146	1,103	280	76	31,280	0	477	477	48,953	1,325	442	326	768	6,556	0	8,649	89,359
07-L1	木路原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-L2	銅ヶ丸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-L3	竹	43,521	40,592	0	0	361	99	84,573	909	1,245	2,154	132,357	0	1,454	1,299	2,753	0	0	2,753	221,837
07-R1	久座仁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R2	多田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R3	市井原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R4	君谷湊	0	0	0	0	0	0	0	285	106	391	0	0	0	0	0	0	0	0	391
07-R5	君谷湊(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L1	乙原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L2	筆瀬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-L3	明塚	0	0	0	0	0	0	0	741	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	741
08-L5	上明塚	0	0	0	0	0	0	0	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	242
08-L4	野井	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-R1	栗原	0	0	0	0	14	4	18	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	46
08-R2	吾郷	0	0	0	0	156	56	213	695	0	695	333	0	0	0	0	0	0	0	1,241
08-R3	高畑	0	0	0	0	75	22	97	0	1,588	1,588	152	0	0	0	0	0	0	0	1,837
09-L1	亀村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R1	小原(邑智)	8,101	9,133	0	0	0	0	17,234	0	0	0	26,971	0	277	413	690	0	0	690	44,895
09-R4	狛淵	0	0	0	0	474	162	636	874	0	874	995	0	0	0	0	0	0	0	2,505
09-R5	浜原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
09-R2	浜原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L1	滝原	0	0	0	0	7	2	9	69	0	69	14	0	0	0	0	0	0	0	92
09-R3	本郷	0	0	22,948	3,094	291	88	26,421	1,077	0	1,077	41,349	4,372	0	0	0	5,440	0	9,812	78,659
10-L2	石見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L3	信喜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R1	浜原ダム	0	0	0	0	0	0	0	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	121
10-R2	潮下(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R3	潮下(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-L1	都賀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R1	滝下(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R3	潮上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R2	曲利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L1	郷上	0	0	0	0	0	0	0	701	0	701	0	0	0	0	0	0	0	0	701
12-L3	山根	0	0	0	0	222	73	295	426	0	426	462	0	0	0	0	0	0	0	1,183
12-L4	高梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L5	大浦(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L6	大浦	0	0	0	0	38	11	49	69	0	69	77	0	0	0	0	0	0	0	195
12-R1	松原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-R2	響谷	4,718	4,566	0	0	136	41	9,461	416	0	416	14,806	0	139	207	345	0	0	345	25,028
12-R3	原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-L1	都賀西	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-L2	乙谷	0	0	0	0	0	0	0	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	69
13-R1	都賀本郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R2	上野(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R3	上野(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R4	上野(上流Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L1	下郷(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L2	下郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-R1	柳原(作木)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-R2	柳原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L1	引城	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L2	西之原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L3	西之原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-R1	伊賀和志	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L1	坂谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

②当面事業（H28～H33）

様式－3　　被害額（事業実施後）　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川（平成33年度末河道）　　流量規模：1/10　　（千円）

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
16-L2	坂谷(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L3	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R1	井手平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R5	大津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R2	折敷谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R3	式	0	0	0	0	229	81	310	107	0	107	485	0	0	0	0	0	0	0	902
16-R4	丹渡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L0	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L1	青山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L2	上ヶ畑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R1	港	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R2	熊見下(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R3	熊見下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L1	川根	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L2	川根(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L3	竹貞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L4	梶矢(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R1	熊見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R2	香淀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R3	門田(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L1	梶矢(上流)	0	0	0	0	66	19	85	1,027	0	1,027	133	0	0	0	0	0	0	0	1,245
19-L2	林	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L3	式敷	0	0	0	0	0	0	0	1,548	0	1,548	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548
19-L4	信木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R1	門田(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R2	川毛	0	0	0	0	52	14	66	437	0	437	103	0	0	0	0	0	0	0	606
19-R3	上組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L1	所木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L2	船佐(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L3	船佐(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R1	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R2	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R3	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L1	下長谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L2	馬行谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L3	下津河内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R1	引字根	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R2	下乙原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R3	日下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L1	荒瀬(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L2	岩脇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L3	十日市・南畑敷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R1	板崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R2	中所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R3	三次町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R4	寺戸 桧原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R5	畠敷町(Ⅰ・Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R6	畠敷町(Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L1	中ノ村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L2	亀谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L3	米丸	7,513	7,116	34,668	14,557	0	0	63,854	306	0	306	99,932	10,161	272	276	548	5,576	0	16,285	180,377
23-L4	旭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L5	上村	0	0	25,244	13,635	0	0	38,879	530	0	530	60,846	6,051	0	0	0	925	0	6,976	107,231
23-R1	大村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R2	船所	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
23-R3	青河	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R4	鈴江	0	0	0	0	0	0	0	382	0	382	0	0	0	0	0	0	0	0	382
24-L1	若屋	0	0	0	0	0	0	0	853	0	853	0	0	0	0	0	0	0	0	853
24-L2	秋町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-R1	片山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-R2	下志和地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-L1	深瀬	91,328	25,632	9,291	8,303	113	37	134,704	1,248	0	1,248	210,812	3,119	966	1,361	2,327	2,081	0	7,526	354,290

②当面事業（H28～H33）

様式－3　　被害額（事業実施後）　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川（平成33年度末河道）　　流量規模：1/10　　（千円）

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
25-L2	甲立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R1	上志和地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R2	川立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R1	高田原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R2	法恩時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-L1	篠原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L1	市ヶ原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L2	高屋	0	0	0	0	0	0	0	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	358
27-R1	下小原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R2	柳原(吉田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R3	国司-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L1	内堀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L2	山手(-常友)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L3	桂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L4	長屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R1	国司-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R2	下入江(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R3	下入江(上流)	41,709	12,239	875	678	209	67	55,777	5,730	960	6,690	87,291	394	661	1,212	1,873	511	0	2,778	152,536
28-R4	上入江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-L1	下土師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-R1	北原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L2	郷川	0	0	1,900	2,224	20	6	4,150	661	0	661	6,495	1,165	0	0	0	925	0	2,090	13,396
30-L3	中三原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L5	下三原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L4	小松原	0	0	0	0	208	69	277	523	0	523	434	0	0	0	0	0	0	0	1,234
30-R2	向三原	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120
30-R3	下布野	0	0	0	0	0	0	0	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	219
30-R4	鉾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-R5	河戸	17,415	4,207	11,593	3,049	172	50	36,487	55	715	770	57,102	1,768	217	416	633	531	0	2,932	97,291
1/80区間の合計		140,550	44,986	70,078	37,174	322	104	293,213	9,410	960	10,370	458,878	19,724	1,900	2,849	4,748	9,093	0	33,565	796,026
1/100区間の合計		3,525,775	3,795,322	1,023,720	330,021	20,029	6,022	8,700,890	21,181	45,803	66,984	13,616,893	305,321	138,459	132,535	270,993	363,443	0	939,758	23,324,525
合計		3,666,326	3,840,308	1,093,798	367,195	20,351	6,126	8,994,098	30,591	46,764	77,356	14,075,763	325,046	140,358	135,383	275,736	372,536	0	973,317	24,120,534

②当面事業(H28～H33)

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名:江の川　河川名:江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成33年度末河道)　　流量規模:1/30　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
01-L1	江津	487,915	187,425	188,844	67,839	358	117	932,498	0	0	0	1,459,359	58,077	6,860	11,519	18,379	24,784	0	101,240	2,493,097
01-L2	本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L6	郷田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L3	千金(下流)	34,202	27,762	0	0	158	44	62,166	254	0	254	97,290	0	1,045	687	1,732	0	0	1,732	161,442
01-L7	千金(上流)	120,034	138,599	43,027	27,242	563	163	329,627	397	3,742	4,139	515,866	28,624	4,820	4,230	9,049	19,668	0	57,341	906,973
01-L4	田野村	81,506	94,253	0	0	1,154	326	177,239	970	2,348	3,318	277,379	0	3,451	3,133	6,585	0	0	6,585	464,521
01-L5	赤栗	15,789	23,364	0	0	2,251	647	42,050	0	1,793	1,793	65,808	0	822	965	1,787	0	0	1,787	111,438
01-R1	渡津	1,671,681	731,104	782,969	302,144	729	254	3,488,882	0	0	0	5,460,100	232,134	26,380	31,325	57,705	68,490	0	358,329	9,307,311
01-R5	長田	3,274,175	2,962,071	623,031	171,810	6,900	1,941	7,039,927	0	3,951	3,951	11,017,486	113,865	105,375	80,104	185,479	165,189	0	464,533	18,525,897
01-R2	太田	27,705	28,078	0	0	147	42	55,972	602	0	602	87,596	0	1,044	926	1,969	0	0	1,969	146,139
01-R3	八神(下流)	41,697	40,085	6,973	3,367	374	103	92,598	1,061	253	1,314	144,916	4,701	1,438	1,107	2,545	3,781	0	11,027	249,855
01-R4	八神(上流)	31,629	34,694	31,139	10,763	72	20	108,316	974	878	1,852	169,515	4,005	1,192	997	2,190	3,781	0	9,976	289,659
02-L1	川平(本川)	0	0	0	0	684	188	872	0	2,556	2,556	1,365	0	0	0	0	0	0	0	4,793
01-L8	瀬尻(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L2	瀬尻(上流)	33,464	35,228	0	0	106	31	68,828	485	807	1,292	107,716	0	1,339	1,171	2,510	0	0	2,510	180,346
02-L3	小松	28,009	28,112	0	0	0	0	56,121	0	404	404	87,829	0	1,067	895	1,962	0	0	1,962	146,316
02-L4	仁万瀬	34,448	33,995	0	0	0	0	68,443	0	0	0	107,113	0	1,237	945	2,182	0	0	2,182	177,738
01-L9	田野Ⅰ	220,630	184,010	0	0	770	212	405,622	606	538	1,144	634,798	0	7,060	5,149	12,209	0	0	12,209	1,053,773
02-L7	田野Ⅱ	17,101	13,881	101,067	85,790	2,810	767	221,417	2,506	0	2,506	346,518	39,779	523	343	866	13,238	0	53,883	624,324
02-L8	川平(支川)	172,485	150,043	0	0	1,550	420	324,499	212	0	212	507,841	0	5,507	3,725	9,232	0	0	9,232	841,784
02-L9	川平(その他)	0	0	0	0	23	8	31	503	0	503	49	0	0	0	0	0	0	0	583
02-R1	松川	10,088	10,449	1,865	317	2,870	843	26,432	6,065	0	6,065	41,366	1,034	433	821	1,253	1,714	0	4,001	77,864
01-R6	松川(上流)	244,808	143,725	10,107	3,115	2,246	648	404,648	1,940	3,551	5,491	633,274	5,477	5,522	5,070	10,592	11,572	0	27,641	1,071,054
02-R2	久坪	0	0	0	0	150	41	190	0	0	0	297	0	0	0	0	0	0	0	487
02-R3	橿原	43,326	44,444	0	0	0	0	87,771	364	248	612	137,362	0	1,546	1,202	2,748	0	0	2,748	228,493
02-R4	中長良	44,372	49,459	0	0	0	0	93,831	0	0	0	146,846	0	1,884	1,723	3,606	0	0	3,606	244,283
02-R5	上長良(本川)	130,943	126,665	61,032	27,060	398	109	346,206	485	807	1,292	541,812	25,585	4,494	3,521	8,015	15,025	0	48,625	937,935
02-R9	上長良(支川)	5,454	7,116	0	0	71	19	12,660	443	0	443	19,813	0	272	276	548	0	0	548	33,464
02-R6	大口(下流)	35,678	38,995	0	0	0	0	74,674	0	0	0	116,865	0	1,327	978	2,305	0	0	2,305	193,844
02-R7	大口(上流)	52,779	52,876	0	0	0	0	105,655	485	2,422	2,907	165,350	0	1,849	1,322	3,171	0	0	3,171	277,083
02-R8	下原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L6	志谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L4	川戸	1,281,252	721,156	158,745	119,049	3,984	1,105	2,285,290	0	3,428	3,428	3,576,479	70,887	26,036	19,028	45,063	116,167	0	232,117	6,097,314
03-L1	川戸(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L5	近原	5,454	7,116	0	0	0	0	12,570	0	340	340	19,672	0	272	276	548	0	0	548	33,130
03-L2	猪ノ瀬	656	294	0	0	0	0	950	0	0	0	1,487	0	42	83	124	0	0	124	2,561
03-L3	花河原	11,893	12,998	0	0	0	0	24,891	0	0	0	38,954	0	442	326	768	0	0	768	64,613
03-R1	下原(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R2	臼木(下流)	5,454	7,116	106,128	77,770	276	83	196,827	0	269	269	308,034	30,830	272	276	548	23,237	0	54,615	559,745
03-R3	臼木(上流)	5,454	7,116	0	0	102	31	12,702	0	0	0	19,879	0	272	276	548	0	0	548	33,129
03-R4	元折	47,981	42,791	0	0	779	211	91,762	364	0	364	143,608	0	1,566	1,160	2,726	0	0	2,726	238,460
03-L5	小原-桜江	5,454	7,116	0	0	0	0	12,570	0	0	0	19,672	0	272	276	548	0	0	548	32,790
04-L1	田津	571,505	482,653	9,215	2,625	2,488	682	1,069,168	485	20,540	21,025	1,673,248	8,225	17,990	12,155	30,145	13,238	0	51,608	2,815,049
04-L3	恵梨	28,994	26,879	4,970	1,332	0	0	62,175	0	0	0	97,304	3,357	965	669	1,634	6,556	0	11,547	171,026
04-L4	川越(下流)	45,356	48,226	24,117	5,307	0	0	123,007	0	538	538	192,506	19,164	1,781	1,497	3,279	7,544	0	29,987	346,038
04-L2	川越(上流)	254,443	210,507	50,979	16,996	1,638	446	535,009	665	1,054	1,719	837,289	41,633	7,933	5,419	13,353	24,607	0	79,593	1,453,610
04-R1	榎谷	41,542	36,908	83,662	80,832	642	195	243,782	0	0	0	381,519	24,017	1,396	1,110	2,506	6,619	0	33,142	658,443
04-R2	久井谷	87,083	85,205	0	0	1,289	372	173,949	0	1,159	1,159	272,230	0	3,205	2,850	6,056	0	0	6,056	453,394
04-R5	和田	227,766	187,568	4,058	646	1,966	533	422,537	0	2,153	2,153	661,270	3,069	7,065	4,739	11,804	925	0	15,798	1,101,758
04-R3	大貫	44,660	40,371	12,922	3,386	271	74	101,685	51	57	108	159,137	9,339	1,489	1,106	2,595	5,304	0	17,238	278,168
04-R4	坂本	5,905	2,647	0	0	1,142	325	10,020	970	0	970	15,681	0	375	743	1,118	0	0	1,118	27,789
05-L1	鹿賀(下流)	42,588	51,910	0	0	143	43	94,684	0	0	0	148,180	0	1,840	1,686	3,526	0	0	3,526	246,390
05-L2	鹿賀(上流)	296,128	278,949	0	0	1,682	457	577,217	0	3,722	3,722	903,345	0	10,084	7,662	17,746	0	0	17,746	1,502,030
05-R1	渦巻	17,880	24,372	4,058	646	261	80	47,298	0	0	0	74,021	3,069	863	1,279	2,142	925	0	6,136	127,455
05-R2	瀬尻(川本町)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-R3	久料谷	0	0	0	0	168	46	213	0	239	239	333	0	0	0	0	0	0	0	785
05-R4	尾原	260,652	221,409	54,393	52,811	1,700	463	591,428	0	2,269	2,269	925,585	29,365	8,272	5,858	14,130	19,857	0	63,352	1,582,634
05-R5	松ヶ崎	51,303	41,643	24,606	13,380	0	0	130,932	0	0	0	204,909	19,736	1,568	1,030	2,598	13,238	0	35,572	371,413
06-L1	因原	2,715,480	1,200,386	465,019	244,501	9,147	2,543	4,637,076	849	477	1,326	7,257,024	226,820	44,918	31,488	76,406	140,023	0	443,249	12,338,675
06-L0	因原(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-L2	日向	31,204	32,174	39,617	31,319	337	100	134,752	100	0	100	210,887	16,559	1,223	1,190	2,414	19,794	0	38,767	384,506
06-L5	谷(本川)	181,304	183,688	215,351	112,358	567	154	693,423	0	0	0	1,085,207	147,337	6,499	4,879	11,378	66,800	0	225,515	2,004,145

様式－3　被害額(事業実施後)　水系名:江の川　河川名:江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成33年度末河道)　流量規模:1/30　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
06-L3	谷(支川)	642,961	580,660	129,172	72,722	1,903	532	1,427,948	0	0	0	2,234,739	53,347	21,607	16,054	37,661	43,377	0	134,385	3,797,072
06-L4	川本	1,427,098	1,310,587	375,808	197,505	1,399	392	3,312,788	0	0	0	5,184,513	200,185	48,829	33,612	82,441	266,624	0	549,250	9,046,551
06-R1	木谷	1,933	882	0	0	0	0	2,815	0	0	0	4,405	0	125	248	373	0	0	373	7,593
06-R2	下三島	8,053	8,418	29,883	10,763	475	132	57,724	0	498	498	90,338	12,762	355	673	1,028	6,380	0	20,170	168,730
06-R3	上三島	39,055	48,338	2,938	1,627	185	51	92,194	0	40	40	144,284	1,125	1,669	1,784	3,453	470	0	5,048	241,566
06-R5	谷戸(本川)	16,790	13,881	0	0	35	9	30,715	0	0	0	48,069	0	523	343	866	13,238	0	14,104	92,888
06-R4	谷戸(支川)	18,722	14,763	5,300	1,208	442	124	40,560	0	477	477	63,476	1,783	648	591	1,239	6,619	0	9,641	114,154
07-L1	木路原	0	0	0	0	0	0	0	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	190
07-L2	銅ヶ丸	16,790	13,881	29,528	28,529	0	0	88,727	0	0	0	138,858	8,477	523	343	866	6,619	0	15,962	243,547
07-L3	竹	103,474	81,521	0	0	449	122	185,566	909	1,908	2,817	290,411	0	2,975	2,025	5,000	0	0	5,000	483,794
07-R1	久座仁	101,262	87,348	62,916	14,005	3,812	1,046	270,388	0	0	0	423,157	45,763	3,337	2,585	5,922	21,189	0	72,874	766,419
07-R2	多田	5,556	6,093	0	0	0	0	11,649	0	0	0	18,231	0	235	443	677	0	0	677	30,557
07-R3	市井原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R4	君谷湊	38,389	27,762	2,048	583	0	0	68,781	667	400	1,067	107,642	1,854	1,045	687	1,732	6,619	0	10,205	187,695
07-R5	君谷湊(支川)	2,854	2,325	0	0	702	192	6,073	1,965	0	1,965	9,504	0	120	230	350	0	0	350	17,892
08-L1	乙原	195,257	161,277	0	0	1,077	291	357,901	424	1,752	2,176	560,115	0	5,789	4,016	9,805	0	0	9,805	929,997
08-L2	築瀬	186,005	159,246	10,111	3,500	1,433	485	360,778	0	856	856	564,618	6,475	6,227	6,743	12,970	10,752	0	30,197	956,449
08-L3	明塚	59,171	52,134	31,219	22,699	403	132	165,759	775	1,969	2,744	259,413	5,151	2,026	2,161	4,187	3,726	0	13,064	440,980
08-L5	上明塚	14,891	12,998	17,562	15,974	0	0	61,425	242	0	242	96,130	9,839	442	326	768	10,282	0	20,889	178,686
08-L4	野井	1,013	294	0	0	0	0	1,307	200	0	200	2,045	0	42	83	124	0	0	124	3,676
08-R1	栗原	367,545	312,286	34,414	8,987	4,690	1,306	729,228	485	0	485	1,141,242	24,554	11,407	8,855	20,263	23,457	0	68,274	1,939,229
08-R2	吾郷	0	0	0	0	647	187	834	1,118	0	1,118	1,305	0	0	0	0	0	0	0	3,257
08-R3	高畑	0	0	0	0	1,016	283	1,299	242	2,101	2,343	2,033	0	0	0	0	0	0	0	5,675
09-L1	亀村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R1	小原(邑智)	40,046	27,762	0	0	67	25	67,900	0	0	0	106,264	0	1,045	687	1,732	0	0	1,732	175,896
09-R4	狛淵	0	0	0	0	1,530	419	1,949	1,159	0	1,159	3,050	0	0	0	0	0	0	0	6,158
09-R5	浜原(下流)	1,013	294	17,924	10,343	0	0	29,574	242	0	242	46,283	3,151	42	83	124	1,714	0	4,989	81,088
09-R2	浜原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L1	滝原	2,117	2,031	0	0	42	12	4,202	200	120	320	6,576	0	78	148	226	0	0	226	11,324
09-R3	本郷	7,089	6,387	95,388	48,310	676	187	158,037	1,527	0	1,527	247,328	27,807	276	525	802	27,246	0	55,855	462,747
10-L2	石見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L3	信喜	10,357	11,178	0	0	62	19	21,615	0	1,006	1,006	33,827	0	429	571	1,000	0	0	1,000	57,448
10-R1	浜原ダム	0	0	0	0	0	0	0	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	121
10-R2	潮下(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R3	潮下(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-L1	都賀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R1	滝下(2)	2,739	4,566	0	0	0	0	7,305	0	0	0	11,432	0	139	207	345	0	0	345	19,082
11-R3	潮上	5,478	9,133	8,616	13,576	67	25	36,895	0	0	0	57,741	3,636	277	413	690	3,726	0	8,052	102,688
11-R2	曲利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L1	郷上	0	0	0	0	0	0	0	862	0	862	0	0	0	0	0	0	0	0	862
12-L3	山根	20,023	18,559	8,616	13,576	812	227	61,814	1,212	0	1,212	96,739	3,636	597	909	1,505	3,726	0	8,867	168,632
12-L4	高梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L5	大浦(下流)	0	0	0	0	0	0	0	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	48
12-L6	大浦	18,734	14,525	0	0	707	239	34,206	1,418	0	1,418	53,532	0	586	634	1,220	0	0	1,220	90,376
12-R1	松原	4,718	4,566	0	0	0	0	9,284	0	0	0	14,529	0	139	207	345	0	0	345	24,158
12-R2	響谷	90,540	62,639	0	0	564	178	153,922	1,655	0	1,655	240,888	0	2,362	1,649	4,011	0	0	4,011	400,476
12-R3	原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-L1	都賀西	17,914	13,653	7,028	3,567	91	29	42,282	228	157	385	66,171	4,425	499	439	938	4,482	0	9,845	118,683
13-L2	乙谷	8,792	7,116	0	0	13	5	15,925	243	0	243	24,923	0	272	276	548	0	0	548	41,639
13-R1	都賀本郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R2	上野(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R3	上野(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R4	上野(上流Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L1	下郷(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L2	下郷	0	0	0	0	63	18	81	775	0	775	127	0	0	0	0	0	0	0	983
14-R1	柳原(作木)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-R2	柳原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L1	引城	14,173	12,998	0	0	0	0	27,171	0	258	258	42,523	0	442	326	768	0	0	768	70,720
15-L2	西之原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L3	西之原	201,352	158,391	27,457	7,056	2,084	623	396,962	5,717	0	5,717	621,246	21,347	5,926	4,457	10,383	17,434	0	49,164	1,073,089
15-R1	伊賀和志	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L1	坂谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式－3　被害額(事業実施後)　水系名:江の川　河川名:江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成33年度末河道)　流量規模:1/30　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
16-L2	坂谷(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L3	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R1	井手平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R5	大津	0	0	811	973	0	0	1,784	0	0	0	2,792	794	0	0	0	470	0	1,264	5,840
16-R2	折敷谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R3	式	8,280	6,093	0	0	1,549	486	16,408	515	0	515	25,679	0	235	443	677	0	0	677	43,279
16-R4	丹波	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L0	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L1	青山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L2	上ヶ畑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R1	港	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R2	熊見下(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R3	熊見下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L1	川根	19,057	13,881	0	0	908	275	34,121	79	0	79	53,399	0	523	343	866	0	0	866	88,465
18-L2	川根(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L3	竹貞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L4	梶矢(下流)	134,232	116,328	39,461	20,519	4,295	1,253	316,089	4,045	376	4,420	494,679	25,126	4,191	3,746	7,937	18,615	0	51,678	866,866
18-R1	熊見	0	0	0	0	363	106	469	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	1,203
18-R2	香淀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-R3	門田(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L1	梶矢(上流)	9,375	5,239	21,545	11,931	618	167	48,875	1,250	188	1,438	76,489	8,252	323	625	949	940	0	10,141	136,943
19-L2	林	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-L3	式敷	0	0	955	152	0	0	1,107	2,685	0	2,685	1,732	722	0	0	0	925	0	1,647	7,171
19-L4	信木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R1	門田(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R2	川毛	15,290	16,024	1,931	1,156	153	43	34,597	859	0	859	54,144	2,113	536	850	1,386	940	0	4,439	94,039
19-R3	上組	0	0	0	0	0	0	0	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	56
20-L1	所木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L2	船佐(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L3	船佐(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R1	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R2	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R3	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L1	下長谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L2	馬行谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L3	下津河内	964	294	0	0	0	0	1,258	136	0	136	1,969	0	42	83	124	0	0	124	3,487
21-R1	引字根	0	0	85,853	62,423	0	0	148,276	0	0	0	232,052	14,165	0	0	0	3,726	0	17,891	398,219
21-R2	下乙原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R3	日下	532,820	389,198	44,471	27,108	1,331	364	995,293	6,649	0	6,649	1,557,634	35,079	14,466	9,839	24,305	19,794	0	79,178	2,638,754
22-L1	荒瀬(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L2	岩脇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L3	十日市・南畑敷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R1	板崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R2	中所	489,032	480,972	333,960	194,087	3,093	991	1,502,135	0	0	0	2,350,841	71,844	16,717	19,018	35,736	20,436	0	128,016	3,980,992
22-R3	三次町	5,028,623	2,192,905	617,395	241,874	3,342	1,143	8,085,282	0	0	0	12,653,466	185,387	82,065	99,824	181,889	257,024	0	624,299	21,363,047
22-R4	寺戸桧原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R5	畠敷町(Ⅰ・Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R6	畠敷町(Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L1	中ノ村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L2	亀谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L3	米丸	15,136	13,293	103,105	65,109	178	52	196,873	798	0	798	308,106	22,241	484	409	893	14,008	0	37,142	542,919
23-L4	旭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L5	上村	3,855	4,566	49,292	28,442	0	0	86,155	738	0	738	134,833	8,664	139	207	345	1,714	0	10,723	232,449
23-R1	大村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R2	船所	1,831	1,678	968	189	42	13	4,723	39	0	39	7,391	540	62	81	143	429	0	1,113	13,266
23-R3	青河	0	0	6,462	10,182	0	0	16,644	2,325	0	2,325	26,048	2,727	0	0	0	3,726	0	6,453	51,470
23-R4	鈴江	2,760	2,031	0	0	151	44	4,985	980	0	980	7,802	0	78	148	226	0	0	226	13,993
24-L1	若屋	0	0	0	0	0	0	0	1,347	0	1,347	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347
24-L2	秋町	893,946	358,305	68,091	49,096	4,283	1,331	1,375,052	9,646	0	9,646	2,151,956	20,764	12,848	12,211	25,059	30,711	0	76,534	3,613,188
24-R1	片山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-R2	下志和地	9,875	1,082	1,061	563	0	0	12,581	1,560	0	1,560	19,689	607	154	304	457	395	0	1,459	35,289
25-L1	深瀬	202,850	52,671	17,445	17,632	591	199	291,389	5,391	0	5,391	456,024	6,172	2,018	2,411	4,429	4,592	0	15,193	767,997

②当面事業(H28～H33)

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成33年度末河道)　　流量規模：1/30　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
25-L2	甲立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R1	上志和地	1,462,321	680,909	82,596	67,225	8,365	2,653	2,304,069	17,882	2,257	20,139	3,605,868	33,781	24,674	23,439	48,113	53,796	0	135,690	6,065,766
25-R2	川立	111,393	23,856	0	0	0	0	135,249	1,617	0	1,617	211,665	0	847	756	1,602	0	0	1,602	350,133
26-R1	高田原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R2	法恩時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-L1	篠原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L1	市ヶ原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L2	高屋	0	0	7,924	1,348	228	77	9,578	931	0	931	14,990	4,281	0	0	0	1,714	0	5,995	31,494
27-R1	下小原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R2	柳原(吉田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R3	国司-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L1	内堀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L2	山手(-常友)	43,179	17,192	6,444	3,216	174	60	70,265	0	0	0	109,965	1,530	659	796	1,455	1,619	0	4,604	184,834
28-L3	桂	389,943	111,932	37,298	20,705	1,366	423	561,668	9,892	0	9,892	879,010	10,797	5,225	7,862	13,087	8,918	0	32,802	1,483,372
28-L4	長屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R1	国司-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R2	下入江(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R3	下入江(上流)	116,659	33,818	2,149	1,771	531	176	155,105	9,431	1,064	10,495	242,739	819	1,794	3,053	4,847	1,131	0	6,797	415,136
28-R4	上入江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-L1	下土師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-R1	北原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L2	郷川	9,463	6,093	7,912	15,586	119	34	39,207	1,224	0	1,224	61,359	4,448	235	443	677	6,556	0	11,681	113,471
30-L3	中三原	1,095	294	19,489	2,517	205	60	23,660	186	0	186	37,028	7,116	42	83	124	1,850	0	9,090	69,964
30-L5	下三原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L4	小松原	0	0	50,412	28,625	1,382	467	80,887	1,765	0	1,765	126,588	9,983	0	0	0	2,184	0	12,167	221,407
30-R2	向三原	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	240
30-R3	下布野	0	0	0	0	0	0	0	401	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	401
30-R4	鈩	1,095	294	0	0	0	0	1,389	0	0	0	2,174	0	42	83	124	0	0	124	3,687
30-R5	河戸	71,232	25,479	55,962	17,415	761	267	171,116	354	1,385	1,739	267,797	5,913	980	1,327	2,306	2,649	0	10,868	451,520
1/80区間の合計		3,253,749	1,301,333	382,835	265,479	15,910	5,029	5,224,335	62,577	3,321	65,898	8,176,084	112,924	48,981	51,675	100,656	122,753	0	336,333	13,802,650
1/100区間の合計		23,139,766	15,649,220	5,283,977	2,561,302	96,531	27,833	46,758,629	64,905	74,034	138,939	73,177,254	1,972,951	574,552	499,231	1,073,783	1,605,864	0	4,652,598	124,727,420
合計		26,393,515	16,950,553	5,666,813	2,826,781	112,441	32,862	51,982,964	127,482	77,355	204,835	81,353,338	2,085,875	623,533	550,906	1,174,440	1,728,617	0	4,988,928	138,530,065

②当面事業(H28～H33)

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名:江の川　河川名:江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成33年度末河道)　　流量規模:1/50　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
01-L1	江津	546,737	230,762	219,555	78,234	407	139	1,075,834	0	0	0	1,683,680	63,956	8,627	13,032	21,659	29,927	0	115,542	2,875,056
01-L2	本町	194,565	249,603	65,781	14,455	480	177	525,060	0	0	0	821,719	8,044	9,414	10,575	19,989	13,473	0	41,506	1,388,285
01-L6	郷田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L3	千金(下流)	34,202	27,762	0	0	182	50	62,196	256	0	256	97,337	0	1,045	687	1,732	0	0	1,732	161,521
01-L7	千金(上流)	163,053	173,211	43,811	29,394	708	193	410,370	429	3,742	4,170	642,229	34,460	6,114	4,725	10,839	19,794	0	65,093	1,121,862
01-L4	田野村	121,921	127,100	0	0	1,320	358	250,698	970	2,348	3,318	392,342	0	4,515	3,471	7,986	0	0	7,986	654,344
01-L5	赤栗	21,817	28,462	0	0	2,533	716	53,527	0	1,793	1,793	83,770	0	1,089	1,104	2,192	0	0	2,192	141,282
01-R1	渡津	2,014,517	860,192	903,040	361,519	857	296	4,140,422	0	0	0	6,479,760	266,204	31,206	34,407	65,613	82,704	0	414,521	11,034,703
01-R5	長田	3,763,102	3,159,502	646,919	182,742	7,441	2,067	7,761,774	0	4,035	4,035	12,147,176	125,424	114,240	83,120	197,359	173,944	0	496,727	20,409,712
01-R2	太田	102,780	102,441	0	0	469	135	205,825	1,797	0	1,797	322,116	0	3,817	3,261	7,078	0	0	7,078	536,816
01-R3	八神(下流)	181,334	161,502	25,883	13,231	1,390	378	383,718	3,814	937	4,752	600,519	20,035	6,067	4,556	10,624	13,220	0	43,879	1,032,868
01-R4	八神(上流)	54,984	49,183	37,754	13,837	91	25	155,874	1,149	1,092	2,241	243,943	5,720	1,845	1,379	3,224	4,479	0	13,423	415,481
02-L1	川平(本川)	39,328	47,806	25,220	5,691	1,252	384	119,681	0	3,592	3,592	187,301	16,479	2,253	3,523	5,776	13,872	0	36,127	346,701
01-L8	瀬尻(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L2	瀬尻(上流)	52,779	52,876	0	0	137	37	105,829	485	992	1,477	165,622	0	1,849	1,322	3,171	0	0	3,171	276,099
02-L3	小松	40,886	39,878	0	0	0	0	80,764	0	404	404	126,396	0	1,407	996	2,403	0	0	2,403	209,967
02-L4	仁万瀬	46,094	40,760	0	0	0	0	86,855	0	0	0	135,928	0	1,487	1,013	2,500	0	0	2,500	225,283
01-L9	田野Ⅰ	246,097	219,980	0	0	842	230	467,149	677	538	1,215	731,088	0	8,060	6,021	14,082	0	0	14,082	1,213,534
02-L7	田野Ⅱ	20,300	16,500	101,608	85,878	2,855	777	227,917	2,506	0	2,506	356,690	40,558	684	656	1,340	13,708	0	55,606	642,719
02-L8	川平(支川)	188,110	152,690	0	0	1,550	420	342,770	212	0	212	536,435	0	5,748	3,776	9,524	0	0	9,524	888,941
02-L9	川平(その他)	0	0	0	0	29	11	39	556	0	556	61	0	0	0	0	0	0	0	656
02-R1	松川	234,512	232,950	34,796	8,654	7,576	2,102	520,590	10,446	0	10,446	814,723	22,609	8,538	6,962	15,500	16,901	0	55,010	1,400,769
01-R6	松川(上流)	700,161	399,477	24,954	8,508	6,229	1,742	1,141,070	1,940	4,304	6,244	1,785,775	13,693	14,608	10,785	25,393	31,001	0	70,087	3,003,176
02-R2	久坪	0	0	0	0	182	53	234	0	0	0	366	0	0	0	0	0	0	0	600
02-R3	橿原	56,757	48,758	0	0	0	0	105,515	364	269	633	165,131	0	1,840	1,306	3,146	0	0	3,146	274,425
02-R4	中長良	76,564	78,873	0	0	0	0	155,438	0	0	0	243,260	0	2,734	1,974	4,708	0	0	4,708	403,406
02-R5	上長良(本川)	164,283	145,603	155,206	102,888	420	118	568,519	485	807	1,292	889,732	42,171	5,504	4,293	9,797	20,690	0	72,658	1,532,201
02-R9	上長良(支川)	11,893	12,998	0	0	85	25	25,000	485	0	485	39,125	0	442	326	768	0	0	768	65,378
02-R6	大口(下流)	51,959	41,937	0	0	0	0	93,896	0	0	0	146,947	0	1,609	1,112	2,722	0	0	2,722	243,565
02-R7	大口(上流)	68,403	55,524	0	0	0	0	123,927	485	2,422	2,907	193,946	0	2,090	1,373	3,463	0	0	3,463	324,243
02-R8	下原	559,961	480,370	203,791	165,751	4,887	1,339	1,416,100	1,791	1,076	2,868	2,216,197	77,104	17,774	12,199	29,973	33,032	0	140,109	3,775,274
02-L6	志谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L4	川戸	1,559,034	790,316	170,786	134,572	4,444	1,219	2,660,371	0	3,513	3,513	4,163,481	84,138	29,254	20,373	49,627	124,687	0	258,452	7,085,817
03-L1	川戸(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L5	近原	11,893	12,998	0	0	0	0	24,891	0	340	340	38,954	0	442	326	768	0	0	768	64,953
03-L2	猪ノ瀬	5,454	7,116	0	0	0	0	12,570	0	0	0	19,672	0	272	276	548	0	0	548	32,790
03-L3	花河原	17,101	13,881	0	0	0	0	30,982	0	0	0	48,487	0	523	343	866	0	0	866	80,335
03-R1	下原(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R2	臼木(下流)	12,549	13,293	129,747	114,989	588	159	271,324	0	1,076	1,076	424,622	47,385	484	409	893	37,039	0	85,317	782,339
03-R3	臼木(上流)	12,549	13,293	0	0	145	39	26,025	0	0	0	40,729	0	484	409	893	0	0	893	67,647
03-R4	元折	56,757	48,758	0	0	786	213	106,515	364	0	364	166,696	0	1,840	1,306	3,146	0	0	3,146	276,721
03-L5	小原-桜江	11,893	12,998	0	0	0	0	24,891	0	0	0	38,954	0	442	326	768	0	0	768	64,613
04-L1	田津	611,428	506,577	9,215	2,625	2,753	751	1,133,349	485	20,592	21,077	1,773,691	8,225	18,946	12,826	31,772	13,238	0	53,235	2,981,352
04-L3	恵梨	34,202	27,762	5,119	1,458	0	0	68,541	0	0	0	107,267	4,517	1,045	687	1,732	6,619	0	12,868	188,676
04-L4	川越(下流)	69,880	66,757	40,231	6,557	0	0	183,425	0	538	538	287,060	23,726	2,372	1,665	4,037	10,345	0	38,108	509,131
04-L2	川越(上流)	1,143,689	979,653	248,660	80,820	7,674	2,131	2,462,627	3,348	5,383	8,730	3,854,011	196,506	36,535	25,754	62,289	123,361	0	382,155	6,707,523
04-R1	榎谷	58,418	56,798	83,662	80,832	967	283	280,960	0	0	0	439,702	24,017	2,096	1,873	3,969	6,619	0	34,605	755,267
04-R2	久井谷	157,742	145,225	0	0	1,817	517	305,300	0	1,159	1,159	477,795	0	5,406	4,187	9,593	0	0	9,593	793,847
04-R5	和田	234,204	193,451	13,802	2,959	1,966	533	446,914	0	2,153	2,153	699,420	7,184	7,235	4,789	12,024	3,726	0	22,934	1,171,421
04-R3	大貫	482,183	427,842	121,894	35,338	2,649	725	1,070,632	485	538	1,023	1,675,539	87,701	15,904	11,571	27,475	52,890	0	168,066	2,915,260
04-R4	坂本	21,960	41,097	0	0	1,295	374	64,726	970	0	970	101,296	0	1,248	1,859	3,107	0	0	3,107	170,099
05-L1	鹿賀(下流)	75,334	73,873	0	0	193	52	149,452	0	0	0	233,892	0	2,644	1,941	4,585	0	0	4,585	387,929
05-L2	鹿賀(上流)	376,609	326,895	0	0	1,822	505	705,831	0	3,722	3,722	1,104,626	0	12,228	8,865	21,093	0	0	21,093	1,835,272
05-R1	渦巻	44,618	55,692	13,802	2,959	412	125	117,607	0	0	0	184,055	7,184	2,076	1,981	4,057	3,726	0	14,967	316,629
05-R2	瀬尻(川本町)	656	294	4,095	1,167	0	0	6,212	0	63	63	9,722	3,709	42	83	124	6,619	0	10,452	26,449
05-R3	久料谷	8,530	3,824	0	0	168	46	12,567	69	492	561	19,667	0	542	1,073	1,615	0	0	1,615	34,410
05-R4	尾原	269,510	233,609	54,393	52,811	1,713	468	612,503	0	2,269	2,269	958,567	29,365	8,738	6,262	15,000	19,857	0	64,222	1,637,561
05-R5	松ヶ崎	51,303	41,643	24,606	13,380	0	0	130,932	0	0	0	204,909	19,736	1,568	1,030	2,598	13,238	0	35,572	371,413
06-L1	因原	2,920,710	1,295,938	488,802	259,261	9,827	2,695	4,977,233	849	477	1,326	7,789,370	242,052	48,189	33,018	81,207	151,304	0	474,563	13,242,492
06-L0	因原(支川)	64,995	21,502	9,508	6,134	218	59	102,417	0	477	477	160,283	4,587	809	532	1,341	2,504	0	8,431	271,608
06-L2	日向	38,210	42,343	39,766	31,446	409	123	152,297	121	0	121	238,345	17,749	1,611	1,447	3,058	19,857	0	40,664	431,427
06-L5	谷(本川)	240,652	207,682	221,538	117,336	592	165	787,965	0	0	0	1,233,165	174,077	7,780	5,341	13,121	69,916	0	257,114	2,278,244

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成33年度末河道)　　流量規模：1/50　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
06-L3	谷(支川)	754,288	674,507	130,703	75,627	2,111	584	1,637,820	0	0	0	2,563,188	55,884	25,095	17,748	42,843	46,270	0	144,997	4,346,005
06-L4	川本	1,604,485	1,441,156	409,234	217,788	1,544	424	3,674,631	0	0	0	5,750,798	223,498	54,108	36,516	90,624	293,439	0	607,561	10,032,990
06-R1	木谷	7,187	13,699	0	0	22	8	20,916	0	0	0	32,734	0	416	620	1,036	0	0	1,036	54,686
06-R2	下三島	30,097	38,267	71,319	25,088	651	185	165,606	0	517	517	259,173	31,073	1,551	1,935	3,486	15,050	0	49,609	474,905
06-R3	上三島	170,031	174,905	45,851	16,053	423	118	407,381	1,091	140	1,232	637,551	24,544	6,566	5,894	12,460	9,195	0	46,199	1,092,363
06-R5	谷戸(本川)	16,790	13,881	0	0	35	10	30,715	0	0	0	48,069	0	523	343	866	13,238	0	14,104	92,888
06-R4	谷戸(支川)	24,621	27,874	5,300	1,208	493	133	59,630	0	477	477	93,321	1,783	980	1,045	2,026	6,619	0	10,428	163,856
07-L1	木路原	63,797	77,291	40,170	10,518	533	174	192,483	242	0	242	301,236	26,038	2,991	4,408	7,399	11,622	0	45,059	539,020
07-L2	鍋ヶ丸	16,790	13,881	29,528	28,529	0	0	88,727	0	0	0	138,858	8,477	523	343	866	6,619	0	15,962	243,547
07-L3	竹	115,166	83,286	0	0	449	122	199,022	909	2,002	2,911	311,469	0	3,135	2,060	5,195	0	0	5,195	518,597
07-R1	久座仁	127,513	118,863	89,276	28,233	4,383	1,222	369,491	0	0	0	578,253	59,617	4,496	3,439	7,936	27,309	0	94,862	1,042,606
07-R2	多田	23,916	30,787	0	0	0	0	54,704	849	0	849	85,612	0	1,209	1,334	2,543	0	0	2,543	143,708
07-R3	市井原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-R4	君谷湊	38,389	27,762	2,048	583	0	0	68,781	667	601	1,267	107,642	1,854	1,045	687	1,732	6,619	0	10,205	187,895
07-R5	君谷湊(支川)	9,597	11,976	0	0	734	204	22,512	2,208	0	2,208	35,231	0	453	565	1,018	0	0	1,018	60,969
08-L1	乙原	335,094	257,631	501,136	17,524	1,780	535	1,113,700	1,844	5,276	7,120	1,742,941	15,459	11,191	11,680	22,872	5,004	0	43,335	2,907,096
08-L2	筆瀬	371,527	324,696	16,972	9,292	2,757	813	726,056	138	883	1,020	1,136,278	12,399	11,295	9,959	21,253	16,299	0	49,951	1,913,305
08-L3	明塚	124,072	106,397	38,223	34,746	821	240	304,500	775	2,335	3,110	476,543	8,402	3,807	3,165	6,971	6,556	0	21,929	806,082
08-L5	上明塚	24,073	18,447	20,080	25,376	0	0	87,977	363	0	363	137,684	16,323	661	550	1,211	13,238	0	30,772	256,796
08-L4	野井	4,051	4,566	0	0	0	0	8,617	242	0	242	13,486	0	139	207	345	0	0	345	22,690
08-R1	栗原	436,911	364,028	36,322	10,045	5,395	1,489	854,190	485	0	485	1,336,807	29,096	13,287	9,827	23,113	26,350	0	78,559	2,270,041
08-R2	吾郷	0	0	917	150	795	217	2,078	1,150	21	1,171	3,252	1,108	0	0	0	470	0	1,578	8,079
08-R3	高畑	8,101	2,353	917	150	1,168	316	13,005	311	2,101	2,412	20,353	1,108	334	660	994	470	0	2,572	38,342
09-L1	亀村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R1	小原(邑智)	40,046	27,762	0	0	656	184	68,647	551	0	551	107,433	0	1,045	687	1,732	0	0	1,732	178,363
09-R4	狛淵	2,900	2,031	0	0	1,904	520	7,356	1,211	0	1,211	11,512	0	78	148	226	0	0	226	20,305
09-R5	浜原(下流)	4,051	4,566	31,219	22,699	0	0	62,535	242	0	242	97,867	5,151	139	207	345	3,726	0	9,222	169,866
09-R2	浜原	308,696	311,194	607,688	84,696	2,363	797	1,315,434	1,679	0	1,679	2,058,654	53,676	10,364	14,090	24,454	56,012	0	134,142	3,509,909
10-L1	滝原	6,858	7,410	0	0	63	20	14,351	390	175	565	22,459	0	314	358	672	0	0	672	38,047
09-R3	本郷	27,457	32,006	104,593	67,789	762	211	232,818	1,614	0	1,614	364,360	35,494	1,190	1,477	2,667	32,969	0	71,130	669,922
10-L2	石見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L3	信喜	24,073	29,457	0	0	305	95	53,931	0	1,652	1,652	84,402	0	1,057	1,408	2,464	0	0	2,464	142,449
10-R1	浜原ダム	0	0	0	0	0	0	0	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	311
10-R2	潮下(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R3	潮下(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-L1	都賀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R1	滝下(2)	6,122	7,116	0	0	0	0	13,237	0	0	0	20,716	0	272	276	548	0	0	548	34,501
11-R3	潮上	19,332	20,618	13,684	21,283	393	117	75,427	0	0	0	118,043	8,516	821	1,077	1,898	8,876	0	19,290	212,760
11-R2	曲利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L1	郷上	148,491	100,710	4,127	883	1,167	317	255,695	1,468	0	1,468	400,163	3,780	4,107	4,492	8,599	3,745	0	16,124	673,450
12-L3	山根	39,885	33,029	10,549	20,782	906	247	105,396	1,212	0	1,212	164,945	5,931	1,228	1,310	2,538	6,556	0	15,025	286,578
12-L4	高梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L5	大浦(下流)	0	0	0	0	0	0	0	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	128
12-L6	大浦	43,130	32,034	0	0	1,221	366	76,750	1,651	0	1,651	120,114	0	1,187	1,041	2,228	0	0	2,228	200,743
12-R1	松原	8,792	7,116	0	0	0	0	15,907	0	0	0	24,894	0	272	276	548	0	0	548	41,349
12-R2	雪谷	97,421	68,522	0	0	894	267	167,105	1,940	0	1,940	261,519	0	2,532	1,699	4,232	0	0	4,232	434,796
12-R3	原	0	0	0	0	24	9	33	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	85
13-L1	都賀西	103,160	80,831	46,443	24,432	390	133	255,389	1,702	354	2,056	399,684	19,339	3,080	3,255	6,334	17,918	0	43,591	700,720
13-L2	乙谷	8,792	7,116	0	0	18	6	15,931	243	0	243	24,932	0	272	276	548	0	0	548	41,654
13-R1	都賀本郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R2	上野(下流)	29,965	29,219	9,587	1,367	64	22	70,223	322	0	322	109,899	4,804	970	1,558	2,528	7,781	0	15,113	195,557
13-R3	上野(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R4	上野(上流Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L1	下郷(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L2	下郷	0	0	0	0	281	76	358	873	0	873	560	0	0	0	0	0	0	0	1,791
14-R1	柳原(作木)	28,871	24,974	8,390	1,427	283	82	64,028	0	0	0	100,204	4,652	895	891	1,786	1,714	0	8,152	172,384
14-R2	柳原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L1	引城	19,057	13,881	0	0	0	0	32,938	0	376	376	51,548	0	523	343	866	0	0	866	85,728
15-L2	西之原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L3	西之原	273,179	220,022	47,358	17,211	3,422	1,009	562,200	6,559	0	6,559	879,843	32,044	8,012	6,367	14,379	26,650	0	73,073	1,521,675
15-R1	伊賀和志	113,425	98,455	95,403	18,676	3,845	1,140	330,944	966	0	966	517,927	37,360	3,619	3,685	7,304	11,270	0	55,934	905,771
16-L1	坂谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成33年度末河道)　　流量規模：1/50　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
16-L2	坂谷(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L3	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R1	井手平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R5	大津	7,711	9,133	3,710	4,639	0	0	25,193	0	0	0	39,427	1,668	277	413	690	1,714	0	4,072	68,692
16-R2	折敷谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R3	式	39,364	31,236	0	0	2,655	780	74,034	743	0	743	115,863	0	1,380	1,913	3,293	0	0	3,293	193,933
16-R4	丹渡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L0	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L1	青山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L2	上ヶ畑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R1	港	20,416	13,363	10,739	4,151	126	39	48,834	0	0	0	76,425	7,802	636	1,216	1,852	3,715	0	13,369	138,628
17-R2	熊見下(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R3	熊見下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L1	川根	20,021	14,175	0	0	1,261	340	35,797	369	0	369	56,022	0	564	426	990	0	0	990	93,178
18-L2	川根(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L3	竹貞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L4	梶矢(下流)	223,156	177,020	48,124	24,834	5,281	1,492	479,906	4,195	376	4,571	751,053	33,668	6,356	4,794	11,150	23,520	0	68,338	1,303,868
18-R1	熊見	0	0	0	0	514	149	664	0	0	0	1,039	0	0	0	0	0	0	0	1,703
18-R2	香淀	0	0	0	0	0	0	0	421	0	421	0	0	0	0	0	0	0	0	421
18-R3	門田(下流)	4,819	4,860	0	0	0	0	9,680	138	0	138	15,149	0	180	289	469	0	0	469	25,436
19-L1	梶矢(上流)	30,448	32,496	98,584	56,884	1,570	463	220,445	1,409	188	1,597	344,996	17,328	1,099	1,378	2,477	3,428	0	23,233	590,271
19-L2	林	0	0	0	0	0	0	0	1,002	0	1,002	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002
19-L3	式敷	2,904	2,031	7,306	1,342	0	0	13,584	3,429	0	3,429	21,259	4,680	78	148	226	4,651	0	9,557	47,829
19-L4	信木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R1	門田(上流)	202,245	28,756	0	0	136	47	231,184	1,637	0	1,637	361,803	0	1,131	1,186	2,317	0	0	2,317	596,941
19-R2	川毛	41,291	38,603	6,336	5,058	779	227	92,294	1,144	0	1,144	144,440	3,603	1,407	1,831	3,238	2,639	0	9,480	247,358
19-R3	上組	0	0	0	0	0	0	0	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	254
20-L1	所木	0	0	0	0	0	0	0	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	53
20-L2	船佐(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L3	船佐(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R1	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R2	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R3	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L1	下長谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L2	馬行谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L3	下津河内	11,369	11,682	0	0	0	0	23,051	136	0	136	36,075	0	411	482	893	0	0	893	60,155
21-R1	引字根	2,760	2,031	105,112	95,552	0	0	205,455	0	0	0	321,537	23,104	78	148	226	6,556	0	29,886	556,878
21-R2	下乙原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-R3	日下	562,480	403,191	45,008	27,563	1,420	388	1,040,050	6,649	0	6,649	1,627,678	39,363	15,217	10,247	25,464	19,857	0	84,684	2,759,061
22-L1	荒瀬(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L2	岩脇	4,491	4,566	0	0	0	0	9,057	0	0	0	14,174	0	139	207	345	0	0	345	23,576
22-L3	十日市・南畑敷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R1	板崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-R2	中所	1,156,284	986,723	395,862	252,933	5,485	1,544	2,798,830	0	0	0	4,380,169	108,824	35,355	26,955	62,310	36,632	0	207,766	7,386,765
22-R3	三次町	12,080,652	5,274,871	1,283,885	587,389	8,590	2,669	19,238,056	0	0	0	30,107,558	406,490	190,490	176,506	366,996	620,183	0	1,393,668	50,739,282
22-R4	寺戸 桧原	1,780,514	1,370,277	4,922,425	1,000,615	9,856	2,711	9,086,398	5,990	5,483	11,473	14,220,213	508,383	50,098	36,918	87,017	202,642	0	798,042	24,116,126
22-R5	畠敷町(Ⅰ・Ⅱ)	3,468,763	1,180,854	238,112	93,690	4,767	1,511	4,987,698	5,719	995	6,713	7,805,747	100,168	50,814	85,779	136,592	70,703	0	307,463	13,107,621
22-R6	畠敷町(Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L1	中ノ村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L2	亀谷	6,615	6,597	0	0	0	0	13,213	277	0	277	20,678	0	217	354	571	0	0	571	34,739
23-L3	米丸	20,657	17,355	128,350	78,744	804	251	246,161	998	0	998	385,242	28,293	640	704	1,344	14,933	0	44,570	676,971
23-L4	旭	108,273	11,542	0	0	0	0	119,814	1,846	0	1,846	187,509	0	499	897	1,395	0	0	1,395	310,564
23-L5	上村	3,855	4,566	85,853	62,423	0	0	156,697	779	0	779	245,231	14,165	139	207	345	3,726	0	18,236	420,943
23-R1	大村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-R2	船所	11,946	10,669	7,157	1,193	581	190	31,736	318	0	318	49,667	4,226	396	653	1,050	3,487	0	8,762	90,483
23-R3	青河	13,231	9,805	6,462	10,182	151	44	39,874	3,308	0	3,308	62,403	2,727	462	832	1,294	3,726	0	7,747	113,332
23-R4	鈴江	3,855	4,566	0	0	229	81	8,732	1,235	0	1,235	13,666	0	139	207	345	0	0	345	23,978
24-L1	若屋	0	0	0	0	0	0	0	1,461	0	1,461	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461
24-L2	秋町	1,100,629	420,978	75,234	57,093	5,112	1,526	1,660,572	10,044	0	10,044	2,598,795	24,823	15,210	13,602	28,813	35,361	0	88,998	4,358,409
24-R1	片山	42,386	40,438	8,931	1,914	0	0	93,670	2,592	0	2,592	146,594	4,529	1,542	1,668	3,210	3,726	0	11,465	254,321
24-R2	下志和地	144,888	34,171	14,415	7,576	560	173	201,782	5,881	0	5,881	315,789	6,187	1,845	3,435	5,281	4,920	0	16,388	539,840
25-L1	深瀬	289,958	81,538	24,331	25,343	1,126	387	422,683	6,759	0	6,759	661,499	8,082	2,825	3,079	5,904	6,570	0	20,556	1,111,497

②当面事業(H28～H33)

様式－3　被害額(事業実施後)　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成33年度末河道)　流量規模：1/50　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
25-L2	甲立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R1	上志和地	1,792,336	806,093	96,266	80,970	10,023	3,126	2,788,813	18,629	2,257	20,886	4,364,492	39,981	29,438	26,211	55,649	64,802	0	160,432	7,334,623
25-R2	川立	130,767	28,080	0	0	0	0	158,847	1,750	0	1,750	248,596	0	980	811	1,791	0	0	1,791	410,984
26-R1	高田原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R2	法恩時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-L1	篠原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L1	市ヶ原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L2	高屋	0	0	17,406	4,958	1,161	316	23,841	1,287	0	1,287	37,311	15,356	0	0	0	6,619	0	21,975	84,414
27-R1	下小原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-R2	柳原(吉田)	2,028	588	0	0	0	0	2,617	1,117	0	1,117	4,096	0	83	165	248	0	0	248	8,078
27-R3	国司-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L1	内堀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-L2	山手(-常友)	75,770	33,015	8,955	5,243	341	100	123,424	0	0	0	193,159	2,405	1,092	1,001	2,093	2,879	0	7,377	323,960
28-L3	桂	448,859	137,780	43,561	23,474	1,696	532	655,902	10,505	0	10,505	1,026,487	12,015	5,942	8,950	14,892	10,145	0	37,052	1,729,946
28-L4	長屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R1	国司-2	9,127	2,647	3,260	532	0	0	15,567	1,774	0	1,774	24,362	3,885	375	743	1,118	940	0	5,943	47,646
28-R2	下入江(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R3	下入江(上流)	135,754	39,867	2,326	1,899	714	229	180,790	10,375	1,220	11,595	282,936	899	2,017	3,474	5,491	1,176	0	7,565	482,886
28-R4	上入江	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-L1	下土師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-R1	北原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L2	郷川	29,594	25,913	8,149	17,063	162	51	80,933	1,515	0	1,515	126,660	5,984	955	1,034	1,990	6,619	0	14,593	223,701
30-L3	中三原	6,309	4,062	38,054	5,250	437	147	54,259	378	0	378	84,915	10,189	156	295	452	3,428	0	14,069	153,621
30-L5	下三原	16,736	14,231	0	0	211	80	31,258	225	0	225	48,919	0	544	552	1,096	0	0	1,096	81,498
30-L4	小松原	1,095	294	88,479	62,841	2,267	750	155,726	2,050	0	2,050	243,711	16,100	42	83	124	4,651	0	20,875	422,362
30-R2	向三原	27,907	22,635	0	0	0	0	50,542	1,174	0	1,174	79,098	0	826	1,214	2,040	0	0	2,040	132,854
30-R3	下布野	0	0	0	0	0	0	0	405	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	405
30-R4	鈩	1,095	294	0	0	0	0	1,389	0	0	0	2,174	0	42	83	124	0	0	124	3,687
30-R5	河戸	105,389	38,874	83,028	26,959	1,132	402	255,786	498	1,503	2,001	400,305	8,099	1,451	1,781	3,232	4,022	0	15,353	673,445
1/80区間の合計		4,340,935	1,690,295	522,506	361,545	22,497	6,955	6,944,734	80,933	3,477	84,409	10,868,509	167,572	63,842	66,992	130,834	163,010	0	461,416	18,359,068
1/100区間の合計		43,857,167	27,574,306	13,967,894	5,064,343	172,063	49,160	90,684,933	109,410	96,599	206,009	141,921,920	3,741,176	1,020,873	882,281	1,903,154	2,828,833	0	8,473,162	241,286,024
合計		48,198,102	29,264,601	14,490,400	5,425,888	194,560	56,115	97,629,663	190,342	100,076	290,415	152,790,421	3,908,747	1,084,715	949,273	2,033,989	2,991,843	0	8,934,580	259,645,079

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成33年度末河道)　　流量規模：1/80　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
01-L1	江津	1,365,943	555,487	563,538	230,142	854	302	2,716,265	0	0	0	4,250,955	144,903	20,264	27,126	47,390	76,555	0	268,848	7,236,068
01-L2	本町	295,582	338,998	74,514	18,663	737	226	728,720	0	0	0	1,140,447	10,721	12,263	11,934	24,197	18,808	0	53,726	1,922,893
01-L6	郷田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L3	千金(下流)	34,202	27,762	0	0	187	52	62,203	286	0	286	97,348	0	1,045	687	1,732	0	0	1,732	161,569
01-L7	千金(上流)	183,886	176,740	44,318	29,823	752	207	435,727	430	3,742	4,172	681,913	38,505	6,435	4,794	11,229	19,857	0	69,591	1,191,403
01-L4	田野村	140,006	139,748	0	0	1,353	366	281,472	970	2,348	3,318	440,504	0	4,935	3,589	8,524	0	0	8,524	733,818
01-L5	赤栗	47,571	51,994	0	0	2,920	790	103,275	0	1,793	1,793	161,625	0	1,769	1,304	3,073	0	0	3,073	269,766
01-R1	渡津	2,217,575	925,577	953,730	392,259	922	313	4,490,376	0	0	0	7,027,438	283,727	33,593	35,714	69,307	89,623	0	442,657	11,960,471
01-R5	長田	4,047,207	3,238,276	657,277	187,587	7,642	2,117	8,140,105	0	4,035	4,035	12,739,264	131,823	118,679	84,979	203,658	177,250	0	512,731	21,396,135
01-R2	太田	138,421	140,912	0	0	571	162	280,066	1,819	0	1,819	438,303	0	5,109	4,482	9,591	0	0	9,591	729,779
01-R3	八神(下流)	211,732	188,028	26,028	13,354	1,428	388	440,958	3,947	949	4,896	690,099	21,196	6,965	5,187	12,152	13,238	0	46,586	1,182,539
01-R4	八神(上流)	173,590	155,317	69,045	25,161	286	78	423,477	3,395	3,228	6,623	662,742	11,747	5,793	4,200	9,993	13,238	0	34,978	1,127,820
02-L1	川平(本川)	141,277	199,684	67,080	21,761	2,199	720	432,721	0	4,039	4,039	677,208	32,051	6,956	8,133	15,089	38,705	0	85,845	1,199,813
01-L8	瀬尻(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L2	瀬尻(上流)	68,403	55,524	0	0	144	40	124,112	485	1,076	1,561	194,235	0	2,090	1,373	3,463	0	0	3,463	323,371
02-L3	小松	46,751	41,055	0	0	0	0	87,805	0	404	404	137,415	0	1,529	1,095	2,624	0	0	2,624	228,248
02-L4	仁万瀬	51,303	41,643	0	0	0	0	92,945	0	0	0	145,459	0	1,568	1,030	2,598	0	0	2,598	241,002
01-L9	田野Ⅰ	275,562	240,360	0	0	860	238	517,021	707	538	1,245	809,138	0	8,985	6,442	15,428	0	0	15,428	1,342,832
02-L7	田野Ⅱ	26,984	25,353	102,335	85,990	2,954	802	244,417	2,506	0	2,506	382,513	40,922	993	997	1,990	14,163	0	57,075	686,511
02-L8	川平(支川)	188,110	152,690	0	0	1,550	420	342,770	212	0	212	536,435	0	5,748	3,776	9,524	0	0	9,524	888,941
02-L9	川平(その他)	0	0	0	0	63	17	80	556	0	556	125	0	0	0	0	0	0	0	761
02-R1	松川	577,739	510,247	61,924	18,436	9,666	2,652	1,180,665	11,829	0	11,829	1,847,741	49,640	18,708	13,423	32,131	29,052	0	110,823	3,151,058
01-R6	松川(上流)	859,451	462,870	28,130	10,250	7,190	1,975	1,369,865	1,940	4,304	6,244	2,143,839	16,216	17,188	11,751	28,940	35,948	0	81,105	3,601,053
02-R2	久坪	0	0	2,864	153	220	59	3,296	0	0	0	5,158	2,320	0	0	0	470	0	2,790	11,244
02-R3	橿原	63,195	54,641	0	0	0	0	117,837	364	269	633	184,415	0	2,010	1,356	3,366	0	0	3,366	306,251
02-R4	中長良	102,605	83,286	0	0	0	0	185,891	0	0	0	290,919	0	3,135	2,060	5,195	0	0	5,195	482,005
02-R5	上長良(本川)	191,698	176,740	184,971	154,088	466	126	708,089	485	807	1,292	1,108,159	55,986	6,365	4,670	11,036	26,350	0	93,372	1,910,912
02-R9	上長良(支川)	18,987	15,912	0	0	103	29	35,031	485	0	485	54,824	0	601	491	1,092	0	0	1,092	91,432
02-R6	大口(下流)	53,743	46,209	0	0	0	0	99,952	0	0	0	156,425	0	1,706	1,236	2,943	0	0	2,943	259,320
02-R7	大口(上流)	68,403	55,524	0	0	0	0	123,927	485	2,422	2,907	193,946	0	2,090	1,373	3,463	0	0	3,463	324,243
02-R8	下原	604,231	499,181	206,230	172,748	5,045	1,382	1,488,816	1,791	1,076	2,868	2,329,997	83,267	18,753	12,550	31,303	33,095	0	147,665	3,969,346
02-L6	志谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-L4	川戸	1,757,572	844,572	182,856	147,761	4,766	1,313	2,938,839	0	3,513	3,513	4,599,283	94,080	31,696	21,539	53,235	131,877	0	279,193	7,820,828
03-L1	川戸(支川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L5	近原	17,101	13,881	0	0	0	0	30,982	0	340	340	48,487	0	523	343	866	0	0	866	80,675
03-L2	猪ノ瀬	11,893	12,998	0	0	0	0	24,891	0	0	0	38,954	0	442	326	768	0	0	768	64,613
03-L3	花河原	17,101	13,881	0	0	0	0	30,982	0	0	0	48,487	0	523	343	866	0	0	866	80,335
03-R1	下原(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-R2	臼木(下流)	14,333	17,565	134,820	120,225	623	170	287,735	0	1,076	1,076	450,305	56,635	581	533	1,114	41,302	0	99,051	838,167
03-R3	臼木(上流)	31,434	31,446	0	0	150	41	63,070	0	0	0	98,705	0	1,103	876	1,979	0	0	1,979	163,754
03-R4	元折	63,851	54,935	946	1,135	786	213	121,868	364	0	364	190,723	927	2,052	1,438	3,490	470	0	4,887	317,842
03-L5	小原-桜江	17,101	13,881	0	0	0	0	30,982	0	0	0	48,487	0	523	343	866	0	0	866	80,335
04-L1	田津	637,653	527,153	9,215	2,625	2,943	823	1,180,413	485	20,592	21,077	1,847,346	8,225	19,863	13,629	33,492	13,238	0	54,955	3,103,791
04-L3	恵梨	34,202	27,762	5,119	1,458	0	0	68,541	0	0	0	107,267	4,517	1,045	687	1,732	6,619	0	12,868	188,676
04-L4	川越(下流)	69,880	66,757	40,231	6,557	0	0	183,425	0	538	538	287,060	23,726	2,372	1,665	4,037	10,345	0	38,108	509,131
04-L2	川越(上流)	1,235,661	1,054,892	253,342	82,753	8,175	2,238	2,637,062	3,380	5,383	8,762	4,127,002	206,134	39,324	27,254	66,578	125,876	0	398,587	7,171,413
04-R1	榎谷	81,998	80,554	83,662	80,832	1,209	352	328,608	0	0	0	514,272	24,017	2,965	2,390	5,355	6,619	0	35,991	878,871
04-R2	久井谷	204,267	185,481	0	0	2,145	582	392,475	0	1,159	1,159	614,223	0	6,784	4,883	11,667	0	0	11,667	1,019,524
04-R5	和田	239,412	194,333	16,898	4,529	1,966	533	457,671	0	2,153	2,153	716,255	11,717	7,316	4,806	12,122	6,556	0	30,395	1,206,474
04-R3	大貫	557,383	483,754	125,986	36,745	2,738	746	1,207,351	485	538	1,023	1,889,504	93,225	17,864	12,471	30,336	53,851	0	177,412	3,275,290
04-R4	坂本	49,088	64,040	0	0	1,504	418	115,050	970	0	970	180,053	0	2,450	2,483	4,933	0	0	4,933	301,006
05-L1	鹿賀(下流)	97,397	82,403	0	0	199	54	180,053	0	0	0	281,783	0	3,055	2,043	5,098	0	0	5,098	466,934
05-L2	鹿賀(上流)	419,812	364,840	0	0	1,901	521	787,075	0	3,722	3,722	1,231,772	0	13,604	9,572	23,176	0	0	23,176	2,045,745
05-R1	渦巻	88,457	91,872	16,898	4,529	575	155	202,486	0	0	0	316,891	11,717	3,176	2,300	5,476	6,556	0	23,749	543,126
05-R2	瀬尻(川本町)	2,440	4,566	4,095	1,167	29	10	12,307	0	120	120	19,260	3,709	139	207	345	6,619	0	10,673	42,360
05-R3	久料谷	32,377	59,656	0	0	425	137	92,594	121	680	801	144,910	0	1,845	2,767	4,612	0	0	4,612	242,917
05-R4	尾原	291,574	255,558	54,393	52,811	1,754	476	656,565	0	2,269	2,269	1,027,524	29,365	9,539	6,629	16,169	19,857	0	65,391	1,751,749
05-R5	松ヶ崎	51,303	41,643	24,606	13,380	0	0	130,932	0	0	0	204,909	19,736	1,568	1,030	2,598	13,238	0	35,572	371,413
06-L1	因原	3,109,733	1,356,091	504,786	269,949	10,283	2,800	5,253,643	849	477	1,326	8,221,951	257,145	50,784	34,279	85,063	157,697	0	499,905	13,976,825
06-L0	因原(支川)	64,995	21,502	9,508	6,134	218	59	102,417	0	477	477	160,283	4,587	809	532	1,341	2,504	0	8,431	271,608
06-L2	日向	63,495	65,875	39,766	31,446	558	154	201,294	121	0	121	315,025	17,749	2,291	1,648	3,939	19,857	0	41,545	557,985
06-L5	谷(本川)	260,260	222,361	222,448	117,798	639	173	823,680	0	0	0	1,289,059	175,410	8,278	5,606	13,884	72,746	0	262,040	2,374,779

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名:江の川　河川名:江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成33年度末河道)　　流量規模:1/80　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
06-L3	谷(支川)	856,133	742,329	130,919	76,250	2,301	626	1,808,559	0	0	0	2,830,395	57,081	27,468	18,677	46,145	46,333	0	149,559	4,788,513
06-L4	川本	1,720,508	1,527,771	427,538	229,686	1,633	443	3,907,577	0	0	0	6,115,358	237,613	57,291	38,226	95,517	310,673	0	643,803	10,666,738
06-R1	木谷	16,065	21,347	0	0	27	10	37,449	0	0	0	58,608	0	817	828	1,644	0	0	1,644	97,701
06-R2	下三島	82,620	101,061	138,437	58,724	841	254	381,936	0	517	517	597,730	64,987	3,606	3,475	7,080	40,197	0	112,264	1,092,447
06-R3	上三島	262,213	268,570	72,446	29,234	536	155	633,154	1,091	159	1,250	990,886	41,814	9,644	8,031	17,675	15,921	0	75,410	1,700,700
06-R5	谷戸(本川)	16,790	13,881	0	0	35	10	30,715	0	0	0	48,069	0	523	343	866	13,238	0	14,104	92,888
06-R4	谷戸(支川)	49,020	52,008	8,255	1,690	557	154	111,684	0	477	477	174,785	5,260	2,161	2,693	4,854	7,089	0	17,203	304,149
07-L1	木路原	171,923	213,705	102,381	37,762	1,236	407	527,414	321	0	321	825,403	54,730	8,073	8,093	16,166	29,730	0	100,626	1,453,764
07-L2	銅ヶ丸	16,790	13,881	29,528	28,529	0	0	88,727	0	0	0	138,858	8,477	523	343	866	6,619	0	15,962	243,547
07-L3	竹	115,166	83,286	0	0	449	122	199,022	909	2,002	2,911	311,469	0	3,135	2,060	5,195	0	0	5,195	518,597
07-R1	久座仁	161,052	149,161	99,203	37,699	4,687	1,291	453,093	0	0	0	709,091	72,636	5,472	3,938	9,409	33,439	0	115,484	1,277,668
07-R2	多田	103,315	107,280	0	0	0	0	210,595	1,048	0	1,048	329,581	0	3,842	2,951	6,794	0	0	6,794	548,018
07-R3	市井原	13,694	22,831	0	0	0	0	36,525	0	0	0	57,162	0	694	1,033	1,726	0	0	1,726	95,413
07-R4	君谷湊	38,389	27,762	2,048	583	0	0	68,781	667	601	1,267	107,642	1,854	1,045	687	1,732	6,619	0	10,205	187,895
07-R5	君谷湊(支川)	24,327	26,711	0	0	898	251	52,187	2,729	0	2,729	81,673	0	931	956	1,887	0	0	1,887	138,476
08-L1	乙原	624,827	594,485	1,111,747	66,972	4,066	1,209	2,403,305	2,519	8,408	10,927	3,761,172	48,179	20,705	19,874	40,579	18,617	0	107,375	6,282,779
08-L2	箪瀬	604,528	452,692	31,168	18,947	4,073	1,171	1,112,579	468	1,081	1,549	1,741,186	19,091	17,002	13,369	30,371	26,130	0	75,592	2,930,906
08-L3	明塚	179,147	135,546	39,370	38,039	1,065	307	393,473	775	2,335	3,110	615,785	11,302	4,927	3,831	8,758	6,619	0	26,679	1,039,047
08-L5	上明塚	27,917	20,996	20,080	25,376	0	0	94,369	363	0	363	147,687	16,323	795	619	1,414	13,238	0	30,975	273,394
08-L4	野井	7,894	7,116	0	0	0	0	15,010	242	0	242	23,491	0	272	276	548	0	0	548	39,291
08-R1	栗原	528,694	410,895	36,859	10,500	5,840	1,600	994,388	485	0	485	1,556,217	33,379	15,178	10,470	25,647	26,476	0	85,502	2,636,592
08-R2	吾郷	75,051	53,451	11,604	2,251	2,308	646	145,310	1,508	2,687	4,195	227,410	7,052	2,063	2,373	4,436	5,576	0	17,064	393,979
08-R3	高畑	39,217	40,886	4,195	714	1,330	368	86,710	485	2,208	2,692	135,701	2,326	1,308	2,030	3,338	1,714	0	7,378	232,481
09-L1	亀村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R1	小原(邑智)	72,082	48,954	13,384	8,190	2,041	573	145,225	2,372	0	2,372	227,277	4,994	1,952	2,410	4,363	3,700	0	13,057	387,931
09-R4	狛淵	7,894	7,116	0	0	1,992	558	17,560	1,211	0	1,211	27,481	0	272	276	548	0	0	548	46,800
09-R5	浜原(下流)	7,894	7,116	38,223	34,746	0	0	87,978	242	0	242	137,686	8,402	272	276	548	6,556	0	15,506	241,412
09-R2	浜原	543,470	491,590	1,050,599	176,735	3,343	1,095	2,266,832	1,974	0	1,974	3,547,592	85,619	18,408	18,634	37,042	103,119	0	225,780	6,042,178
10-L1	滝原	18,205	19,596	0	0	120	35	37,955	485	601	1,085	59,400	0	659	680	1,339	0	0	1,339	99,779
09-R3	本郷	68,768	71,520	106,057	73,051	840	231	320,466	1,635	0	1,635	501,529	40,442	2,572	2,377	4,949	33,095	0	78,486	902,116
10-L2	石見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L3	信喜	32,658	38,169	0	0	357	112	71,296	0	2,012	2,012	111,578	0	1,329	1,599	2,928	0	0	2,928	187,814
10-R1	浜原ダム	0	0	0	0	0	0	0	363	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	363
10-R2	潮下(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R3	潮下(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-L1	都賀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R1	滝下(2)	6,122	7,116	0	0	0	0	13,237	0	0	0	20,716	0	272	276	548	0	0	548	34,501
11-R3	潮上	40,322	48,772	276,248	30,883	1,347	454	398,026	0	0	0	622,911	19,518	1,795	2,088	3,883	16,783	0	40,184	1,061,121
11-R2	曲利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L1	郷上	299,537	237,447	33,175	7,985	2,974	847	581,964	1,993	0	1,993	910,774	22,790	8,403	8,468	16,872	24,799	0	64,461	1,559,192
12-L3	山根	72,634	59,404	11,375	22,834	941	255	167,443	1,281	0	1,281	262,048	8,578	2,083	1,663	3,746	7,089	0	19,413	450,185
12-L4	高梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L5	大浦(下流)	0	0	0	0	0	0	0	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	145
12-L6	大浦	71,967	53,675	2,342	138	1,631	451	130,203	1,746	0	1,746	203,768	798	2,000	1,721	3,721	1,714	0	6,233	341,950
12-R1	松原	16,824	13,293	0	0	0	0	30,116	0	0	0	47,132	0	484	409	893	0	0	893	78,141
12-R2	響谷	103,336	69,699	0	0	1,256	345	174,636	2,019	0	2,019	273,305	0	2,654	1,799	4,453	0	0	4,453	454,413
12-R3	原	0	0	0	0	52	14	66	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	169
13-L1	都賀西	263,958	210,984	106,300	63,727	945	302	646,216	3,213	401	3,615	1,011,328	46,742	7,575	7,170	14,745	46,817	0	108,303	1,769,462
13-L2	乙谷	15,673	12,998	0	0	32	9	28,712	321	0	321	44,934	0	442	326	768	0	0	768	74,735
13-R1	都賀本郷	204,785	166,991	63,768	24,713	741	233	461,231	0	0	0	721,827	32,260	6,097	5,956	12,053	50,701	0	95,014	1,278,072
13-R2	上野(下流)	66,259	60,972	18,313	3,285	91	33	148,954	397	0	397	233,113	8,895	2,261	2,492	4,753	19,555	0	33,203	415,667
13-R3	上野(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R4	上野(上流Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L1	下郷(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L2	下郷	41,020	35,130	0	0	377	110	76,637	1,399	0	1,399	119,937	0	1,162	1,065	2,227	0	0	2,227	200,200
14-R1	柳原(作木)	53,777	44,444	17,892	4,795	429	116	121,454	0	0	0	190,076	12,406	1,546	1,202	2,748	6,556	0	21,710	333,240
14-R2	柳原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L1	引城	19,057	13,881	0	0	0	0	32,938	0	376	376	51,548	0	523	343	866	0	0	866	85,728
15-L2	西之原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L3	西之原	479,437	364,840	83,081	49,006	6,371	1,776	984,512	7,940	0	7,940	1,540,761	64,484	13,559	9,341	22,900	51,773	0	139,157	2,672,370
15-R1	伊賀和志	285,665	231,578	174,660	42,010	5,675	1,560	741,147	1,158	0	1,158	1,159,895	76,745	8,437	6,532	14,969	21,508	0	113,222	2,015,422
16-L1	坂谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成33年度末河道)　　流量規模：1/80　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
16-L2	坂谷(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-L3	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R1	井手平	25,826	22,873	3,667	599	258	95	53,318	152	0	152	83,443	4,431	980	1,473	2,453	940	0	7,824	144,737
16-R5	大津	36,757	30,941	9,032	15,769	0	0	92,500	0	0	0	144,763	5,767	1,166	1,195	2,361	7,026	0	15,154	252,417
16-R2	折敷谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R3	式	142,515	128,682	0	0	4,913	1,360	277,470	808	0	808	434,241	0	4,639	3,905	8,544	0	0	8,544	721,063
16-R4	丹渡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L0	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L1	青山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L2	上ヶ畑	5,520	4,062	0	0	0	0	9,582	0	0	0	14,996	0	156	295	452	0	0	452	25,030
17-R1	港	227,988	197,975	144,007	45,402	771	242	616,385	0	0	0	964,643	80,999	7,211	7,738	14,949	56,968	0	152,916	1,733,944
17-R2	熊見下(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R3	熊見下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L1	川根	40,831	33,561	0	0	1,554	446	76,392	811	0	811	119,553	0	1,331	1,349	2,680	0	0	2,680	199,436
18-L2	川根(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L3	竹貞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L4	梶矢(下流)	282,606	205,861	58,385	27,863	6,237	1,704	582,656	4,234	376	4,610	911,857	45,828	7,811	5,816	13,627	28,127	0	87,582	1,586,705
18-R1	熊見	0	0	0	0	724	200	924	0	0	0	1,446	0	0	0	0	0	0	0	2,370
18-R2	香淀	2,760	2,031	0	0	90	26	4,907	635	0	635	7,679	0	78	148	226	0	0	226	13,447
18-R3	門田(下流)	11,369	11,682	0	0	0	0	23,051	185	0	185	36,075	0	411	482	893	0	0	893	60,204
19-L1	梶矢(上流)	58,399	54,459	171,705	124,846	1,797	525	411,731	1,449	188	1,637	644,359	28,330	1,973	1,756	3,729	7,452	0	39,511	1,097,238
19-L2	林	0	0	0	0	0	0	0	1,134	0	1,134	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134
19-L3	式敷	7,906	7,116	17,778	4,024	155	55	37,034	3,763	0	3,763	57,958	9,756	272	276	548	10,282	0	20,586	119,341
19-L4	信木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R1	門田(上流)	348,316	48,142	0	0	210	76	396,744	1,726	0	1,726	620,904	0	1,677	1,402	3,079	0	0	3,079	1,022,453
19-R2	川毛	87,421	82,039	15,393	12,097	1,000	307	198,257	1,257	0	1,257	310,272	7,256	2,957	2,949	5,906	7,452	0	20,614	530,400
19-R3	上組	0	0	0	0	0	0	0	262	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	262
20-L1	所木	0	0	0	0	0	0	0	413	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	413
20-L2	船佐(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L3	船佐(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R1	唐香	72,579	72,302	3,279	5,934	1,818	541	156,453	374	0	374	244,849	1,853	2,579	2,160	4,739	2,327	0	8,919	410,595
20-R2	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R3	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L1	下長谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L2	馬行谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L3	下津河内	15,027	14,231	0	0	0	0	29,258	240	0	240	45,789	0	544	552	1,096	0	0	1,096	76,383
21-R1	引字根	7,513	7,116	108,268	104,607	0	0	227,504	0	0	0	356,044	31,081	272	276	548	6,619	0	38,248	621,796
21-R2	下乙原	2,760	2,031	0	0	0	0	4,791	0	0	0	7,498	0	78	148	226	0	0	226	12,515
21-R3	日下	562,480	403,191	45,008	27,563	1,420	388	1,040,050	6,649	0	6,649	1,627,678	39,363	15,217	10,247	25,464	19,857	0	84,684	2,759,061
22-L1	荒瀬(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-L2	岩脇	8,368	7,116	14,138	3,225	108	30	32,983	257	0	257	51,618	10,392	272	276	548	7,496	0	18,436	103,294
22-L3	十日市・南畑敷町	45,696,613	21,119,432	13,787,618	3,622,980	57,418	17,354	84,301,416	8,587	575	9,162	131,931,716	2,645,005	754,770	706,396	1,461,166	2,621,706	0	6,727,877	222,970,171
22-R1	板崎	2,191	588	0	0	0	0	2,779	0	0	0	4,349	0	83	165	248	0	0	248	7,376
22-R2	中所	1,407,032	1,140,618	403,742	264,596	6,369	1,729	3,224,085	0	0	0	5,045,693	124,452	40,931	28,597	69,529	39,588	0	233,569	8,503,347
22-R3	三次町	17,981,419	7,543,438	1,662,998	822,564	12,382	3,622	28,026,423	0	0	0	43,861,352	585,912	272,540	220,394	492,934	878,145	0	1,956,991	73,844,766
22-R4	寺戸 桧原	2,206,985	1,632,740	4,961,530	1,027,050	10,968	3,026	9,842,299	5,990	6,765	12,755	15,403,198	539,240	60,534	41,421	101,955	218,238	0	859,433	26,117,685
22-R5	畠敷町(Ⅰ・Ⅱ)	5,865,552	2,118,838	406,807	150,128	10,009	3,083	8,554,418	8,726	5,121	13,847	13,387,664	164,102	82,727	147,255	229,982	116,616	0	510,699	22,466,628
22-R6	畠敷町(Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L1	中ノ村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-L2	亀谷	11,369	11,682	0	0	0	0	23,051	331	0	331	36,075	0	411	482	893	0	0	893	60,350
23-L3	米丸	26,637	20,772	149,863	112,962	1,150	416	311,800	1,096	0	1,096	487,967	41,314	781	780	1,561	20,656	0	63,531	864,394
23-L4	旭	122,272	19,288	0	0	0	0	141,560	2,491	0	2,491	221,541	0	669	1,151	1,820	0	0	1,820	367,412
23-L5	上村	7,513	7,116	85,853	62,423	0	0	162,905	779	0	779	254,946	14,165	272	276	548	3,726	0	18,439	437,069
23-R1	大村	0	0	0	0	94	27	121	71	0	71	189	0	0	0	0	0	0	0	381
23-R2	船所	33,633	32,534	53,260	8,993	2,205	719	131,344	877	0	877	205,553	19,092	1,199	1,549	2,749	21,534	0	43,374	381,148
23-R3	青河	34,676	29,317	9,745	15,886	681	213	90,517	3,913	0	3,913	141,659	6,664	1,144	1,822	2,966	7,026	0	16,656	252,745
23-R4	鈴江	7,513	7,116	0	0	287	108	15,024	1,316	0	1,316	23,513	0	272	276	548	0	0	548	40,401
24-L1	若屋	1,928	588	0	0	0	0	2,516	1,638	0	1,638	3,938	0	83	165	248	0	0	248	8,340
24-L2	秋町	1,197,658	456,186	78,774	60,485	5,554	1,620	1,800,278	10,169	0	10,169	2,817,435	26,820	16,374	14,195	30,569	38,847	0	96,236	4,724,118
24-R1	片山	64,160	59,824	8,931	1,914	0	0	134,829	2,723	0	2,723	211,007	4,529	2,088	1,884	3,972	3,726	0	12,227	360,786
24-R2	下志和地	643,916	217,583	61,652	36,656	3,353	1,164	964,324	11,390	0	11,390	1,509,167	17,733	7,824	10,719	18,543	20,886	0	57,161	2,542,042
25-L1	深瀬	408,313	111,451	32,538	36,149	1,667	575	590,692	7,893	0	7,893	924,433	10,891	3,956	3,693	7,649	9,176	0	27,717	1,550,735

②当面事業(H28～H33)

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成33年度末河道)　　流量規模：1/80　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
25-L2	甲立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-R1	上志和地	2,015,480	895,237	103,462	89,746	11,230	3,406	3,118,560	19,330	2,257	21,587	4,880,546	44,374	32,579	27,728	60,307	72,979	0	177,660	8,198,353
25-R2	川立	163,224	33,006	0	0	0	0	196,230	2,039	0	2,039	307,100	0	1,193	949	2,142	0	0	2,142	507,511
26-R1	高田原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-R2	法恩時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-L1	篠原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L1	市ヶ原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-L2	高屋	1,014	294	18,081	5,769	1,174	320	26,652	1,646	0	1,646	41,710	16,018	42	83	124	7,089	0	23,231	93,239
27-R1	下小原	230,397	189,473	132,652	88,028	12,663	3,526	656,738	14,834	0	14,834	1,027,795	24,505	6,667	5,301	11,968	5,910	0	42,383	1,741,750
27-R2	柳原(吉田)	7,837	4,650	0	0	0	0	12,487	1,854	0	1,854	19,542	0	240	460	700	0	0	700	34,583
27-R3	国司-1	15,212	14,581	0	0	0	0	29,794	767	0	767	46,628	0	541	867	1,408	0	0	1,408	78,597
28-L1	内堀	4,850,508	1,297,662	1,402,482	726,971	3,536	1,204	8,282,363	3,202	0	3,202	12,961,898	310,828	46,487	66,661	113,148	130,737	0	554,713	21,802,176
28-L2	山手(-常友)	75,770	33,015	8,955	5,243	341	100	123,424	0	0	0	193,159	2,405	1,092	1,001	2,093	2,879	0	7,377	323,960
28-L3	桂	523,469	169,789	50,422	27,147	2,145	685	773,657	11,036	0	11,036	1,210,773	13,369	6,889	10,150	17,039	11,852	0	42,260	2,037,726
28-L4	長屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R1	国司-2	117,826	81,016	16,975	6,902	1,362	438	224,519	4,843	0	4,843	351,372	11,709	3,580	6,609	10,188	5,550	0	27,447	608,181
28-R2	下入江(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-R3	下入江(上流)	201,584	58,868	3,002	2,393	1,263	389	267,499	12,452	1,220	13,672	418,636	1,224	2,808	4,974	7,783	1,377	0	10,384	710,191
28-R4	上入江	1,160,505	411,892	76,153	42,193	5,540	1,885	1,698,168	12,948	1,609	14,557	2,657,633	21,058	16,347	23,050	39,397	29,406	0	89,861	4,460,219
29-L1	下土師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-R1	北原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-L2	郷川	65,255	57,275	15,569	26,342	263	75	164,779	1,943	0	1,943	257,879	9,320	1,955	1,815	3,769	10,047	0	23,136	447,737
30-L3	中三原	13,954	11,976	77,052	17,488	761	267	121,498	474	0	474	190,144	20,785	453	565	1,018	7,922	0	29,725	341,841
30-L5	下三原	23,285	20,114	0	0	337	102	43,838	256	0	256	68,606	0	714	602	1,316	0	0	1,316	114,016
30-L4	小松原	4,491	4,566	114,043	97,466	3,310	980	224,857	2,315	0	2,315	351,901	27,633	139	207	345	10,282	0	38,260	617,333
30-R2	向三原	65,737	57,709	0	0	0	0	123,446	1,674	634	2,307	193,193	0	2,081	2,119	4,199	0	0	4,199	323,145
30-R3	下布野	1,095	294	0	0	0	0	1,389	461	0	461	2,174	0	42	83	124	0	0	124	4,148
30-R4	鈩	4,250	2,325	0	0	0	0	6,575	0	0	0	10,290	0	120	230	350	0	0	350	17,215
30-R5	河戸	159,184	61,439	113,001	40,874	1,787	581	376,865	514	1,503	2,017	589,794	11,343	2,170	2,189	4,359	6,329	0	22,031	990,707
1/80区間の合計		11,922,413	4,162,940	2,292,798	1,329,860	54,244	16,795	19,779,051	129,636	5,086	134,722	30,954,215	586,698	153,538	184,825	338,363	393,356	0	1,318,416	52,186,404
1/100区間の合計		#########	57,363,707	31,165,775	9,988,716	279,791	80,381	204,564,900	138,265	113,094	251,359	320,144,069	7,473,269	2,088,909	1,835,132	3,924,041	6,347,591	0	17,744,901	542,705,229
合計		#########	61,526,647	33,458,573	11,318,576	334,035	97,176	224,343,950	267,901	118,180	386,075	351,098,280	8,059,966	2,242,447	2,019,957	4,262,402	6,740,947	0	19,063,314	594,891,619

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成33年度末河道)　　流量規模：1/100　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
01-L1	江津	1,556,883	614,612	636,166	269,735	908	321	3,078,624	0	0	0	4,818,047	161,492	22,665	29,134	51,799	89,562	0	302,852	8,199,523
01-L2	本町	383,953	428,838	82,385	22,351	950	272	918,750	0	0	0	1,437,844	13,069	15,262	14,082	29,344	23,406	0	65,819	2,422,413
01-L6	郷田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-L3	千金(下流)	34,202	27,762	0	0	196	56	62,216	289	0	289	97,368	0	1,045	687	1,732	0	0	1,732	161,605
01-L7	千金(上流)	235,680	204,684	44,318	29,823	772	215	515,494	438	3,742	4,179	806,748	38,505	7,517	5,081	12,598	19,857	0	70,960	1,397,381
01-L4	田野村	172,485	150,043	1,732	283	1,370	371	326,284	970	2,348	3,318	510,634	2,092	5,507	3,725	9,232	470	0	11,794	852,030
01-L5	赤栗	57,987	53,759	0	0	2,943	797	115,486	0	1,793	1,793	180,736	0	1,930	1,339	3,268	0	0	3,268	301,283
01-R1	渡津	2,275,183	948,927	964,711	397,115	954	323	4,587,212	0	0	0	7,178,987	289,135	34,350	36,107	70,458	92,219	0	451,811	12,218,010
01-R5	長田	4,283,254	3,313,575	673,089	194,183	7,860	2,169	8,474,130	0	4,035	4,035	13,262,013	139,257	122,581	86,531	209,111	182,130	0	530,498	22,270,676
01-R2	太田	158,638	159,848	0	0	594	168	319,248	1,819	0	1,819	499,623	0	5,750	4,851	10,601	0	0	10,601	831,291
01-R3	八神(下流)	218,117	195,171	26,028	13,354	1,434	390	454,495	3,959	978	4,937	711,285	21,196	7,192	5,329	12,521	13,238	0	46,955	1,217,672
01-R4	八神(上流)	181,911	162,720	69,045	25,161	287	78	439,200	3,395	3,228	6,623	687,348	11,747	6,009	4,264	10,273	13,238	0	35,258	1,168,429
02-L1	川平(本川)	158,562	222,571	78,359	29,962	2,265	751	492,472	0	4,082	4,082	770,719	34,860	7,865	8,716	16,581	43,518	0	94,959	1,362,232
01-L8	瀬尻(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-L2	瀬尻(上流)	68,403	55,524	0	0	144	40	124,112	485	1,076	1,561	194,235	0	2,090	1,373	3,463	0	0	3,463	323,371
02-L3	小松	53,189	43,674	0	0	0	0	96,863	0	404	404	151,591	0	1,646	1,177	2,823	0	0	2,823	251,681
02-L4	仁万瀬	51,303	41,643	0	0	0	0	92,945	0	0	0	145,459	0	1,568	1,030	2,598	0	0	2,598	241,002
01-L9	田野Ⅰ	278,576	242,909	0	0	866	241	522,592	707	538	1,245	817,856	0	9,119	6,512	15,631	0	0	15,631	1,357,324
02-L7	田野Ⅱ	29,978	32,454	103,543	86,206	3,045	835	256,060	2,546	0	2,546	400,734	41,415	1,192	1,262	2,454	14,952	0	58,821	718,161
02-L8	川平(支川)	188,110	152,690	0	0	1,550	420	342,770	212	0	212	536,435	0	5,748	3,776	9,524	0	0	9,524	888,941
02-L9	川平(その他)	0	0	0	0	67	18	86	556	0	556	135	0	0	0	0	0	0	0	777
02-R1	松川	656,128	557,857	76,438	29,353	9,967	2,721	1,332,465	11,987	0	11,987	2,085,308	61,513	21,015	14,940	35,955	35,323	0	132,791	3,562,551
01-R6	松川(上流)	902,316	477,873	28,553	10,703	7,465	2,028	1,428,939	1,940	4,304	6,244	2,236,290	16,839	17,758	11,904	29,662	36,938	0	83,439	3,754,912
02-R2	久坪	0	0	6,712	349	225	61	7,347	0	0	0	11,498	3,402	0	0	0	925	0	4,327	23,172
02-R3	橿原	68,403	55,524	0	0	0	0	123,927	364	269	633	193,946	0	2,090	1,373	3,463	0	0	3,463	321,969
02-R4	中長良	102,605	83,286	0	0	0	0	185,891	0	0	0	290,919	0	3,135	2,060	5,195	0	0	5,195	482,005
02-R5	上長良(本川)	216,365	187,035	184,971	154,088	467	127	743,053	485	807	1,292	1,162,878	55,986	7,007	4,930	11,937	26,350	0	94,273	2,001,496
02-R9	上長良(支川)	18,987	15,912	0	0	117	32	35,048	485	0	485	54,850	0	601	491	1,092	0	0	1,092	91,475
02-R6	大口(下流)	56,757	48,758	0	0	0	0	105,515	0	0	0	165,131	0	1,840	1,306	3,146	0	0	3,146	273,792
02-R7	大口(上流)	68,403	55,524	0	0	0	0	123,927	485	2,422	2,907	193,946	0	2,090	1,373	3,463	0	0	3,463	324,243
02-R8	下原	604,231	499,181	206,230	172,748	5,061	1,389	1,488,840	1,791	1,076	2,868	2,330,035	83,267	18,753	12,550	31,303	33,095	0	147,665	3,969,408
02-L6	志谷	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791	1,791	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791
03-L4	川戸	1,834,425	870,718	188,341	155,010	4,955	1,356	3,054,805	0	3,513	3,513	4,780,770	97,969	32,654	21,999	54,653	135,977	0	288,599	8,127,687
03-L1	川戸(支川)	15,697	9,948	4,410	3,434	72	25	33,586	0	992	992	52,562	1,675	331	454	785	1,331	0	3,791	90,931
02-L5	近原	17,101	13,881	0	0	0	0	30,982	0	340	340	48,487	0	523	343	866	0	0	866	80,675
03-L2	猪ノ瀬	11,893	12,998	0	0	0	0	24,891	0	0	0	38,954	0	442	326	768	0	0	768	64,613
03-L3	花河原	17,101	13,881	0	0	0	0	30,982	0	0	0	48,487	0	523	343	866	0	0	866	80,335
03-R1	下原(上流)	283,220	208,188	468,817	40,213	2,228	696	1,003,362	865	4,126	4,991	1,570,262	24,024	7,850	7,457	15,307	31,452	0	70,783	2,649,398
03-R2	臼木(下流)	22,555	20,996	140,501	130,248	632	174	315,106	0	1,076	1,076	493,141	64,783	795	619	1,414	43,440	0	109,637	918,960
03-R3	臼木(上流)	34,448	33,995	0	0	150	41	68,633	0	0	0	107,411	0	1,237	945	2,182	0	0	2,182	178,226
03-R4	元折	70,290	57,555	2,217	2,595	786	213	133,656	364	0	364	209,172	1,359	2,168	1,521	3,689	925	0	5,973	349,165
03-L5	小原-桜江	17,101	13,881	0	0	0	0	30,982	0	0	0	48,487	0	523	343	866	0	0	866	80,335
04-L1	田津	658,219	551,624	9,215	2,625	3,156	884	1,225,723	485	20,592	21,077	1,918,256	8,225	20,651	14,045	34,697	13,238	0	56,160	3,221,216
04-L3	恵梨	34,202	27,762	5,119	1,458	0	0	68,541	0	0	0	107,267	4,517	1,045	687	1,732	6,619	0	12,868	188,676
04-L4	川越(下流)	85,504	69,405	45,352	7,405	0	0	207,666	0	538	538	324,997	28,752	2,613	1,716	4,329	13,175	0	46,256	579,457
04-L2	川越(上流)	1,252,773	1,065,806	254,206	82,970	8,216	2,252	2,666,222	3,397	5,383	8,779	4,172,637	206,747	39,787	27,501	67,287	126,039	0	400,073	7,247,711
04-R1	榎谷	96,659	89,869	83,662	80,832	1,466	417	352,905	0	0	0	552,296	24,017	3,349	2,527	5,876	6,619	0	36,512	941,713
04-R2	久井谷	217,677	194,347	0	0	2,164	588	414,776	0	1,159	1,159	649,124	0	7,144	5,183	12,326	0	0	12,326	1,077,385
04-R5	和田	239,412	194,333	17,406	4,958	1,966	533	458,608	0	2,153	2,153	717,722	15,762	7,316	4,806	12,122	6,619	0	34,503	1,212,986
04-R3	大貫	566,501	492,696	130,432	37,637	2,749	752	1,230,767	485	538	1,023	1,926,150	95,119	18,232	12,720	30,952	55,321	0	181,392	3,339,332
04-R4	坂本	49,088	64,040	0	0	1,599	439	115,166	970	0	970	180,235	0	2,450	2,483	4,933	0	0	4,933	301,304
05-L1	鹿賀(下流)	102,605	83,286	0	0	199	54	186,144	0	0	0	291,315	0	3,135	2,060	5,195	0	0	5,195	482,654
05-L2	鹿賀(上流)	444,787	388,582	0	0	1,981	538	835,887	0	3,811	3,811	1,308,163	0	14,349	10,165	24,514	0	0	24,514	2,172,375
05-R1	渦巻	104,082	94,519	17,406	4,958	595	161	221,720	0	0	0	346,992	15,762	3,417	2,351	5,768	6,619	0	28,149	596,861
05-R2	瀬尻(川本町)	5,454	7,116	4,095	1,167	36	13	17,881	0	120	120	27,984	3,709	272	276	548	6,619	0	10,876	56,861
05-R3	久料谷	72,791	94,533	0	0	489	167	167,981	121	718	839	262,890	0	3,617	3,734	7,351	0	0	7,351	439,061
05-R4	尾原	314,443	269,088	54,393	52,811	1,760	477	692,973	0	2,269	2,269	1,084,503	29,365	10,040	6,764	16,804	19,857	0	66,026	1,845,771
05-R5	松ヶ崎	51,303	41,643	24,606	13,380	0	0	130,932	0	0	0	204,909	19,736	1,568	1,030	2,598	13,238	0	35,572	371,413
06-L1	因原	3,163,724	1,372,976	511,775	272,994	10,423	2,846	5,334,737	849	477	1,326	8,348,863	261,214	51,461	34,839	86,300	159,182	0	506,696	14,191,622
06-L0	因原(支川)	64,995	21,502	9,508	6,134	218	59	102,417	0	477	477	160,283	4,587	809	532	1,341	2,504	0	8,431	271,608
06-L2	日向	73,722	67,640	39,766	31,446	569	158	213,301	121	0	121	333,816	17,749	2,452	1,682	4,134	19,857	0	41,740	588,978
06-L5	谷(本川)	271,031	226,661	222,597	117,924	645	175	839,034	0	0	0	1,313,088	176,600	8,499	5,699	14,199	72,809	0	263,608	2,415,730

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成33年度末河道)　　流量規模：1/100　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
06-L3	谷(支川)	884,498	761,897	130,919	76,250	2,360	645	1,856,570	0	0	0	2,905,532	57,081	28,421	19,657	48,078	46,333	0	151,492	4,913,594
06-L4	川本	1,755,824	1,543,561	431,619	231,932	1,644	446	3,965,027	0	0	0	6,205,267	241,889	58,032	38,631	96,663	312,219	0	650,770	10,821,064
06-R1	木谷	16,065	21,347	0	0	27	10	37,449	0	0	0	58,608	0	817	828	1,644	0	0	1,644	97,701
06-R2	下三島	99,732	120,026	148,273	63,515	1,098	314	432,957	0	517	517	677,578	75,143	4,367	4,177	8,544	47,237	0	130,924	1,241,976
06-R3	上三島	312,280	306,753	84,521	39,507	571	168	743,801	1,091	159	1,250	1,164,049	46,590	11,214	8,783	19,998	20,329	0	86,917	1,996,017
06-R5	谷戸(本川)	16,790	13,881	0	0	35	10	30,715	0	0	0	48,069	0	523	343	866	13,238	0	14,104	92,888
06-R4	谷戸(支川)	82,116	97,040	28,845	6,255	776	216	215,249	637	477	1,114	336,865	13,722	3,363	3,663	7,026	10,345	0	31,093	584,321
07-L1	木路原	204,597	242,881	105,592	44,229	1,337	445	599,080	364	0	364	937,560	55,965	9,023	8,896	17,919	31,742	0	105,626	1,642,630
07-L2	銅ヶ丸	16,790	13,881	29,528	28,529	0	0	88,727	0	0	0	138,858	8,477	523	343	866	6,619	0	15,962	243,547
07-L3	竹	115,902	83,580	0	0	449	122	200,053	909	2,108	3,017	313,083	0	3,177	2,142	5,319	0	0	5,319	521,472
07-R1	久座仁	176,191	156,724	105,431	40,947	5,161	1,403	485,857	0	0	0	760,366	77,904	5,825	4,332	10,158	35,367	0	123,429	1,369,652
07-R2	多田	114,750	110,781	0	0	0	0	225,531	1,091	0	1,091	352,956	0	4,040	3,051	7,090	0	0	7,090	586,668
07-R3	市井原	30,610	35,578	0	0	0	0	66,187	0	0	0	103,583	0	1,361	1,379	2,741	0	0	2,741	172,511
07-R4	君谷湊	38,389	27,762	2,048	583	0	0	68,781	667	601	1,267	107,642	1,854	1,045	687	1,732	6,619	0	10,205	187,895
07-R5	君谷湊(支川)	48,377	43,730	0	0	985	281	93,372	3,056	0	3,056	146,127	0	1,671	1,534	3,205	0	0	3,205	245,760
08-L1	乙原	797,368	724,498	1,127,461	80,146	4,397	1,354	2,735,225	2,545	8,408	10,953	4,280,627	54,704	27,513	23,414	50,927	32,701	0	138,332	7,165,137
08-L2	箪瀬	681,236	516,732	36,213	27,005	4,616	1,298	1,267,100	770	1,266	2,036	1,983,012	22,862	18,987	14,543	33,530	30,972	0	87,364	3,339,512
08-L3	明塚	203,542	152,214	39,370	38,039	1,232	342	434,738	775	2,335	3,110	680,365	11,302	5,715	4,324	10,038	6,619	0	27,959	1,146,172
08-L5	上明塚	27,917	20,996	20,080	25,376	0	0	94,369	442	0	442	147,687	16,323	795	619	1,414	13,238	0	30,975	273,473
08-L4	野井	14,891	12,998	0	0	0	0	27,889	242	0	242	43,646	0	442	326	768	0	0	768	72,545
08-R1	栗原	562,687	429,581	36,859	10,500	6,079	1,679	1,047,384	485	0	485	1,639,156	33,379	15,856	10,746	26,601	26,476	0	86,456	2,773,481
08-R2	吾郷	94,291	83,888	20,448	4,678	2,542	736	206,583	1,562	2,809	4,371	323,302	12,332	2,814	3,019	5,833	11,996	0	30,161	564,417
08-R3	高畑	83,797	74,699	7,307	1,566	1,550	449	169,369	485	2,276	2,761	265,062	3,803	2,823	3,132	5,956	3,726	0	13,485	450,677
09-L1	亀村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-R1	小原(邑智)	89,251	79,518	29,803	24,474	2,232	626	225,904	2,610	0	2,610	353,540	8,563	2,667	3,194	5,861	8,868	0	23,292	605,346
09-R4	狛淵	7,894	7,116	0	0	2,052	569	17,631	1,280	0	1,280	27,593	0	272	276	548	0	0	548	47,052
09-R5	浜原(下流)	14,891	12,998	39,370	38,039	0	0	105,298	242	0	242	164,791	11,302	442	326	768	6,619	0	18,689	289,020
09-R2	浜原	913,892	799,436	1,092,966	250,572	4,942	1,399	3,063,207	2,196	0	2,196	4,793,919	121,510	27,777	22,054	49,831	163,395	0	334,736	8,194,058
10-L1	滝原	24,327	26,711	0	0	170	52	51,260	553	2,098	2,652	80,222	0	931	956	1,887	0	0	1,887	136,021
09-R3	本郷	82,209	86,829	106,057	73,051	854	236	349,236	1,704	0	1,704	546,554	40,442	3,061	2,923	5,984	33,095	0	79,521	977,015
10-L2	石見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-L3	信喜	42,876	49,221	0	0	398	129	92,624	74	2,280	2,354	144,957	0	1,842	2,103	3,945	0	0	3,945	243,880
10-R1	浜原ダム	0	0	0	0	0	0	0	363	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	363
10-R2	潮下(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-R3	潮下(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-L1	都賀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-R1	滝下(2)	6,122	7,116	0	0	0	0	13,237	0	0	0	20,716	0	272	276	548	0	0	548	34,501
11-R3	潮上	55,396	63,074	277,481	31,647	1,365	463	429,427	0	0	0	672,053	19,812	2,196	2,247	4,443	17,572	0	41,827	1,143,307
11-R2	曲利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L1	郷上	383,770	291,248	52,558	13,964	3,205	931	745,676	2,012	0	2,012	1,166,983	30,526	11,078	10,094	21,172	44,208	0	95,906	2,010,577
12-L3	山根	100,735	70,553	13,196	23,147	954	259	208,845	1,291	0	1,291	326,842	9,237	2,611	1,847	4,458	8,333	0	22,028	559,006
12-L4	高梨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-L5	大浦(下流)	0	0	0	0	0	0	0	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	145
12-L6	大浦	82,922	62,107	4,995	452	1,783	483	152,742	1,746	0	1,746	239,041	2,413	2,304	1,840	4,144	4,196	0	10,753	404,282
12-R1	松原	23,751	15,912	0	0	0	0	39,663	0	0	0	62,073	0	601	491	1,092	0	0	1,092	102,828
12-R2	響谷	105,499	71,436	0	0	1,372	382	178,689	2,130	0	2,130	279,648	0	2,691	1,864	4,555	0	0	4,555	465,022
12-R3	原	0	0	0	0	52	14	66	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	169
13-L1	都賀西	396,096	312,935	128,510	79,715	1,294	397	918,946	3,607	1,226	4,832	1,438,150	60,529	11,058	10,859	21,916	62,474	0	144,919	2,506,847
13-L2	乙谷	20,437	13,881	0	0	34	10	34,362	364	0	364	53,777	0	523	343	866	0	0	866	89,369
13-R1	都賀本郷	302,045	232,754	88,729	43,397	1,003	297	668,226	0	0	0	1,045,774	49,680	8,553	7,915	16,468	73,256	0	139,404	1,853,404
13-R2	上野(下流)	75,097	68,606	19,450	3,492	141	45	166,830	397	0	397	261,089	9,274	2,589	2,690	5,278	20,344	0	34,896	463,212
13-R3	上野(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-R4	上野(上流Ⅱ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L1	下郷(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-L2	下郷	96,891	68,060	10,772	5,965	464	140	182,293	1,853	0	1,853	285,289	4,126	2,581	2,467	5,049	470	0	9,645	479,080
14-R1	柳原(作木)	62,189	47,876	17,892	4,795	429	116	133,298	0	0	0	208,611	12,406	1,760	1,289	3,048	6,556	0	22,010	363,919
14-R2	柳原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L1	引城	19,057	13,881	0	0	0	0	32,938	0	376	376	51,548	0	523	343	866	0	0	866	85,728
15-L2	西之原(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-L3	西之原	520,356	391,230	87,836	55,565	7,024	1,960	1,063,971	8,230	0	8,230	1,665,115	68,401	14,589	10,217	24,806	56,615	0	149,822	2,887,138
15-R1	伊賀和志	320,034	260,278	185,714	46,586	5,940	1,629	820,180	1,256	0	1,256	1,283,582	90,865	9,415	6,956	16,372	24,523	0	131,760	2,236,778
16-L1	坂谷	0	0	0	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	71

②当面事業(H28～H33)

様式－3　　被害額(事業実施後)　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川(平成33年度末河道)　　流量規模：1/100　　(千円)

氾濫ブロック		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計
番号	地先名	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等の出費	小計				
				償却	在庫	償却	在庫													
16-L2	坂谷(上流)	0	0	0	0	0	0	0	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	121
16-L3	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R1	井手平	81,728	65,441	10,819	2,168	706	211	161,073	223	0	223	252,079	8,746	2,682	3,251	5,933	2,790	0	17,469	430,844
16-R5	大津	54,938	53,927	13,039	16,459	0	0	138,363	0	0	0	216,538	7,218	1,845	1,824	3,669	8,270	0	19,157	374,058
16-R2	折敷谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-R3	式	142,515	128,682	0	0	4,913	1,360	277,470	808	0	808	434,241	0	4,639	3,905	8,544	0	0	8,544	721,063
16-R4	丹渡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L0	江平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L1	青山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-L2	上ヶ畑	7,711	9,133	0	0	0	0	16,843	0	0	0	26,359	0	277	413	690	0	0	690	43,892
17-R1	港	265,052	240,878	190,153	65,309	864	270	762,527	0	0	0	1,193,355	97,718	8,729	9,067	17,796	73,824	0	189,338	2,145,220
17-R2	熊見下(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-R3	熊見下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L1	川根	50,973	43,856	0	0	1,655	480	96,964	919	0	919	151,749	0	1,634	1,673	3,307	0	0	3,307	252,939
18-L2	川根(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-L3	竹貞	1,928	588	0	0	131	38	2,685	19	0	19	4,202	0	83	165	248	0	0	248	7,154
18-L4	梶矢(下流)	302,473	222,907	64,019	29,663	6,496	1,791	627,349	4,234	376	4,610	981,801	51,859	8,292	6,197	14,488	30,202	0	96,549	1,710,309
18-R1	熊見	3,154	2,031	4,297	684	776	217	11,160	0	0	0	17,465	3,249	78	148	226	925	0	4,400	33,025
18-R2	香淀	82,013	60,678	1,121	183	137	49	144,180	769	0	769	225,642	1,319	2,312	1,745	4,057	470	0	5,846	376,437
18-R3	門田(下流)	25,410	22,439	0	0	0	0	47,849	230	0	230	74,884	0	834	832	1,667	0	0	1,667	124,630
19-L1	梶矢(上流)	85,036	77,991	210,225	191,104	2,202	610	567,168	1,449	188	1,637	887,618	46,209	2,653	1,957	4,610	13,112	0	63,931	1,520,354
19-L2	林	0	0	0	0	0	0	0	1,142	0	1,142	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142
19-L3	式敷	9,934	7,704	19,306	4,274	297	103	41,618	3,891	0	3,891	65,132	11,602	356	441	797	10,752	0	23,151	133,792
19-L4	信木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-R1	門田(上流)	391,594	56,560	0	0	365	109	448,628	1,765	0	1,765	702,103	0	1,908	1,511	3,419	0	0	3,419	1,155,915
19-R2	川毛	106,069	95,864	15,393	12,097	1,125	333	230,880	1,414	0	1,414	361,327	7,256	3,569	3,290	6,859	7,452	0	21,567	615,188
19-R3	上組	0	0	0	0	0	0	0	297	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	297
20-L1	所木	0	0	0	0	0	0	0	431	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	431
20-L2	船佐(下流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-L3	船佐(上流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R1	唐香	182,086	165,379	7,172	13,790	4,172	1,212	373,811	749	0	749	585,014	4,630	6,180	4,640	10,820	5,283	0	20,733	980,307
20-R2	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-R3	唐香	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L1	下長谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L2	馬行谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-L3	下津河内	21,686	20,114	0	0	0	0	41,800	298	0	298	65,417	0	714	602	1,316	0	0	1,316	108,831
21-R1	引字根	7,513	7,116	108,268	104,607	0	0	227,504	0	0	0	356,044	31,081	272	276	548	6,619	0	38,248	621,796
21-R2	下乙原	3,855	4,566	0	0	0	0	8,422	0	0	0	13,180	0	139	207	345	0	0	345	21,947
21-R3	日下	562,480	403,191	45,008	27,563	1,420	388	1,040,050	6,649	0	6,649	1,627,678	39,363	15,217	10,247	25,464	19,857	0	84,684	2,759,061
22-L1	荒瀬(下流)	7,513	7,116	16,712	22,035	554	178	54,107	1,104	0	1,104	84,677	7,636	272	276	548	10,282	0	18,466	158,354
22-L2	岩脇	8,368	7,116	30,489	4,789	496	158	51,416	349	0	349	80,466	17,663	272	276	548	11,270	0	29,481	161,712
22-L3	十日市・南畑敷町	45,696,613	21,119,432	13,787,618	3,622,980	57,418	17,354	84,301,416	8,587	575	9,162	131,931,716	2,645,005	754,770	706,396	1,461,166	2,621,706	0	6,727,877	222,970,171
22-R1	板崎	8,499	4,650	2,241	366	10	3	15,770	0	0	0	24,680	2,638	240	460	700	940	0	4,278	44,728
22-R2	中所	1,554,125	1,173,759	403,979	266,073	6,447	1,755	3,406,138	0	0	0	5,330,606	125,987	43,484	29,198	72,682	39,651	0	238,320	8,975,064
22-R3	三次町	20,868,554	8,585,035	1,822,569	932,120	14,394	4,085	32,226,755	0	0	0	50,434,872	677,938	311,280	238,829	550,109	992,384	0	2,220,431	84,882,058
22-R4	寺戸 桧原	2,206,985	1,632,740	4,961,530	1,027,050	10,968	3,026	9,842,299	5,990	6,765	12,755	15,403,198	539,240	60,534	41,421	101,955	218,238	0	859,433	26,117,685
22-R5	畠敷町(Ⅰ・Ⅱ)	26,324,866	10,268,040	1,405,474	787,299	36,987	10,753	38,833,418	12,911	8,172	21,083	60,774,299	518,381	363,803	303,093	666,896	606,242	0	1,791,518	101,420,318
22-R6	畠敷町(Ⅲ)	111,869	105,991	23,960	19,359	292	88	261,559	1,393	0	1,393	409,340	9,255	4,015	4,377	8,392	12,103	0	29,750	702,042
30-L2	郷川	80,896	70,791	22,737	38,449	308	87	213,267	2,062	0	2,062	333,763	12,866	2,452	2,063	4,515	15,011	0	32,392	581,484
30-L3	中三原	20,985	16,556	77,905	17,537	854	312	134,150	606	0	606	209,945	21,418	664	782	1,446	8,392	0	31,256	375,957
30-L5	下三原	34,369	26,879	2,626	418	480	130	64,902	293	0	293	101,572	1,935	965	669	1,634	925	0	4,494	171,261
30-L4	小松原	10,558	7,704	114,043	97,466	4,002	1,119	234,893	2,393	0	2,393	367,608	27,633	356	441	797	10,282	0	38,712	643,606
30-R2	向三原	81,137	68,984	0	0	0	0	150,121	1,884	951	2,835	234,939	0	2,560	2,390	4,950	0	0	4,950	392,845
30-R3	下布野	3,154	2,031	0	0	0	0	5,185	486	0	486	8,115	0	78	148	226	0	0	226	14,012
30-R4	鉾	4,250	2,325	0	0	0	0	6,575	0	0	0	10,290	0	120	230	350	0	0	350	17,215
30-R5	河戸	192,466	72,527	130,812	50,058	2,065	654	448,581	514	1,503	2,017	702,029	13,314	2,626	2,392	5,017	7,826	0	26,157	1,178,784
合計		#########	69,214,350	33,417,460	11,253,428	327,665	93,769	247,307,815	151,798	126,641	278,439	387,036,730	8,279,018	2,512,160	2,079,024	4,591,184	7,287,768	0	20,157,970	654,780,954

①全体事業（H28～H57）

江の川直轄河川改修事業（全体事業）　1/100区間①

様式－４　年平均被害軽減期待額　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川

対象河道：平成27年度末河道～平成57年度末河道　　単位：百万円

確率規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	被害軽減額 (①－②) ③				
1/2	0.50000	0	0	0	－－	－－	－－	0
1/5	0.20000	4,501	6	4,495	2,248	0.3000	674	674
1/10	0.10000	31,215	414	30,801	17,648	0.1000	1,765	2,439
1/30	0.03333	139,094	6,736	132,358	81,580	0.0667	5,441	7,880
1/50	0.02000	247,603	117,242	130,361	131,360	0.0133	1,747	9,627
1/80	0.01250	544,294	370,725	173,569	151,965	0.0075	1,140	10,767
1/100	0.01000	655,590	413,715	241,875	207,722	0.0025	519	11,286

①全体事業（H28～H57）

江の川直轄河川改修事業（全体事業）　1/80区間②

様式－４　年平均被害軽減期待額　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川

対象河道：平成27年度末河道～平成57年度末河道　　単位：百万円

確率規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	被害軽減額 (①－②) ③				
1/2	0.50000	0	0	0	－－	－－	－－	0
1/5	0.20000	79	0	79	40	0.3000	12	12
1/10	0.10000	849	2	847	463	0.1000	46	58
1/30	0.03333	14,215	85	14,130	7,489	0.0667	499	557
1/50	0.02000	18,577	13,810	4,767	9,449	0.0133	126	683
1/80	0.01250	52,421	19,230	33,191	18,979	0.0075	142	825

年平均被害額の合計　　12,111

②当面事業（H28～H33）

江の川直轄河川改修事業（当面6年）　1/100区間①

様式－４　年平均被害軽減期待額　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川

対象河道：平成27年度末河道～平成33年度末河道　　単位：百万円

確率規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	被害軽減額 (①－②) ③				
1/2	0.50000	0	0	0	－－	－－	－－	0
1/5	0.20000	4,501	3,988	513	257	0.3000	77	77
1/10	0.10000	31,215	23,325	7,890	4,202	0.1000	420	497
1/30	0.03333	139,094	124,727	14,367	11,129	0.0667	742	1,239
1/50	0.02000	247,603	241,286	6,317	10,342	0.0133	138	1,377
1/80	0.01250	544,294	542,705	1,589	3,953	0.0075	30	1,407
1/100	0.01000	655,590	654,781	809	1,199	0.0025	3	1,410

②当面事業（H28～H33）

江の川直轄河川改修事業（当面6年）　1/80区間②

様式－４　年平均被害軽減期待額　　水系名：江の川　河川名：江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川

対象河道：平成27年度末河道～平成33年度末河道　　単位：百万円

確率規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	被害軽減額 (①－②) ③				
1/2	0.50000	0	0	0	－－	－－	－－	0
1/5	0.20000	79	78	1	1	0.3000	0	0
1/10	0.10000	849	796	53	27	0.1000	3	3
1/30	0.03333	14,215	13,803	412	233	0.0667	16	19
1/50	0.02000	18,577	18,359	218	315	0.0133	4	23
1/80	0.01250	52,421	52,186	235	227	0.0075	2	25

年平均被害額の合計　　1,435

①全体事業（H28～H57）

様式－５　　費用対便益　　水系名：　江の川　　河川名：　江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川

単位：百万円

年次	年度	t	便益（B）				費用（C）						費用便益比 B／C	純現在価値 B－C
			便益①		残存価値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
	H27	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
整備期間（30年）	H28	1	0	0			1,701	1,636	0	0	1,701	1,636		
	H29	2	69	64			2,287	2,114	2	2	2,289	2,116		
	H30	3	340	303			2,499	2,222	6	5	2,505	2,227		
	H31	4	608	520			1,890	1,616	9	8	1,899	1,624		
	H32	5	794	653			2,562	2,106	11	9	2,573	2,115		
	H33	6	1,089	861			2,243	1,773	15	12	2,258	1,785		
	H34	7	1,435	1,090			2,512	1,909	20	15	2,532	1,924		
	H35	8	1,939	1,417			2,341	1,711	26	19	2,367	1,730		
	H36	9	2,409	1,693			2,361	1,659	31	22	2,392	1,681		
	H37	10	2,883	1,948			2,773	1,873	37	25	2,810	1,898		
	H38	11	3,440	2,235			2,707	1,759	43	28	2,750	1,787		
	H39	12	3,983	2,488			2,771	1,731	49	31	2,820	1,762		
	H40	13	4,539	2,726			2,695	1,618	55	33	2,750	1,651		
	H41	14	5,080	2,934			2,652	1,532	61	35	2,713	1,567		
	H42	15	5,612	3,116			2,670	1,483	67	37	2,737	1,520		
	H43	16	6,148	3,282			2,530	1,351	73	39	2,603	1,390		
	H44	17	6,656	3,417			2,211	1,135	79	41	2,290	1,176		
	H45	18	7,100	3,505			2,315	1,143	84	41	2,399	1,184		
	H46	19	7,565	3,591			2,247	1,066	89	42	2,336	1,108		
	H47	20	8,016	3,658			2,287	1,044	94	43	2,381	1,087		
	H48	21	8,475	3,719			2,200	965	99	43	2,299	1,008		
	H49	22	8,917	3,763			2,269	957	104	44	2,373	1,001		
	H50	23	9,372	3,802			2,037	826	109	44	2,146	870		
	H51	24	9,781	3,816			2,088	815	114	44	2,202	859		
	H52	25	10,200	3,826			2,035	763	119	45	2,154	808		
	H53	26	10,608	3,826			1,709	616	124	45	1,833	661		
	H54	27	10,951	3,798			1,937	672	128	44	2,065	716		
	H55	28	11,340	3,782			1,183	394	133	44	1,316	438		
	H56	29	11,577	3,712			1,534	492	136	44	1,670	536		
	H57	30	11,885	3,664			1,128	348	140	43	1,268	391		
施設完成後の評価期間（50年）	H58	31	12,111	3,590					144	43	144	43		
	H59	32	12,111	3,452					144	41	144	41		
	H60	33	12,111	3,320					144	39	144	39		
	H61	34	12,111	3,192					144	38	144	38		
	H62	35	12,111	3,069					144	36	144	36		
	H63	36	12,111	2,951					144	35	144	35		
	H64	37	12,111	2,838					144	34	144	34		
	H65	38	12,111	2,728					144	32	144	32		
	H66	39	12,111	2,623					144	31	144	31		
	H67	40	12,111	2,523					144	30	144	30		
	H68	41	12,111	2,426					144	29	144	29		
	H69	42	12,111	2,332					144	28	144	28		
	H70	43	12,111	2,243					144	27	144	27		
	H71	44	12,111	2,156					144	26	144	26		
	H72	45	12,111	2,073					144	25	144	25		
	H73	46	12,111	1,994					144	24	144	24		
	H74	47	12,111	1,917					144	23	144	23		
	H75	48	12,111	1,843					144	22	144	22		
	H76	49	12,111	1,772					144	21	144	21		
	H77	50	12,111	1,704					144	20	144	20		
	H78	51	12,111	1,639					144	19	144	19		
	H79	52	12,111	1,576					144	19	144	19		
	H80	53	12,111	1,515					144	18	144	18		
	H81	54	12,111	1,457					144	17	144	17		
	H82	55	12,111	1,401					144	17	144	17		
	H83	56	12,111	1,347					144	16	144	16		
	H84	57	12,111	1,295					144	15	144	15		
	H85	58	12,111	1,245					144	15	144	15		
	H86	59	12,111	1,197					144	14	144	14		
	H87	60	12,111	1,151					144	14	144	14		
	H88	61	12,111	1,107					144	13	144	13		
	H89	62	12,111	1,064					144	13	144	13		
	H90	63	12,111	1,023					144	12	144	12		
	H91	64	12,111	984					144	12	144	12		
	H92	65	12,111	946					144	11	144	11		
	H93	66	12,111	910					144	11	144	11		
	H94	67	12,111	875					144	10	144	10		
	H95	68	12,111	841					144	10	144	10		
	H96	69	12,111	809					144	10	144	10		
	H97	70	12,111	778					144	9	144	9		
	H98	71	12,111	748					144	9	144	9		
	H99	72	12,111	719					144	9	144	9		
	H100	73	12,111	691					144	8	144	8		
	H101	74	12,111	665					144	8	144	8		
	H102	75	12,111	639					144	8	144	8		
	H103	76	12,111	615					144	7	144	7		
	H104	77	12,111	591					144	7	144	7		
	H105	78	12,111	568					144	7	144	7		
	H106	79	12,111	546					144	6	144	6		
	H107	80	12,111	525					144	6	144	6		
合　計			778,361	157,422	552	157,974	66,372	39,329	9,257	1,881	75,629	41,210	3.8	116,764

②当面事業（H28～H33）

様式－５　費用対便益　水系名：　江の川　河川名：　江の川・馬洗川・西城川・神野瀬川　単位：百万円

年次	年度	t	便　益（B）				費　用（C）						費用便益比 B／C	純現在価値 B－C
			便益①		残存価値②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
	H27	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
（整備期間（6年）	H28	1	0	0			1,701	1,636	0	0	1,701	1,636		
	H29	2	69	64			2,287	2,114	2	2	2,289	2,116		
	H30	3	340	303			2,499	2,222	6	5	2,505	2,227		
	H31	4	608	520			1,890	1,616	9	8	1,899	1,624		
	H32	5	794	653			2,562	2,106	11	9	2,573	2,115		
	H33	6	1,089	861			2,243	1,773	15	12	2,258	1,785		
施設完成後の評価期間（５０年）	H34	7	1,435	1,090					20	15	20	15		
	H35	8	1,435	1,049					20	15	20	15		
	H36	9	1,435	1,008					20	14	20	14		
	H37	10	1,435	969					20	14	20	14		
	H38	11	1,435	932					20	13	20	13		
	H39	12	1,435	896					20	12	20	12		
	H40	13	1,435	862					20	12	20	12		
	H41	14	1,435	829					20	12	20	12		
	H42	15	1,435	797					20	11	20	11		
	H43	16	1,435	766					20	11	20	11		
	H44	17	1,435	737					20	10	20	10		
	H45	18	1,435	708					20	10	20	10		
	H46	19	1,435	681					20	9	20	9		
	H47	20	1,435	655					20	9	20	9		
	H48	21	1,435	630					20	9	20	9		
	H49	22	1,435	606					20	8	20	8		
	H50	23	1,435	582					20	8	20	8		
	H51	24	1,435	560					20	8	20	8		
	H52	25	1,435	538					20	8	20	8		
	H53	26	1,435	518					20	7	20	7		
	H54	27	1,435	498					20	7	20	7		
	H55	28	1,435	479					20	7	20	7		
	H56	29	1,435	460					20	6	20	6		
	H57	30	1,435	442					20	6	20	6		
	H58	31	1,435	425					20	6	20	6		
	H59	32	1,435	409					20	6	20	6		
	H60	33	1,435	393					20	5	20	5		
	H61	34	1,435	378					20	5	20	5		
	H62	35	1,435	364					20	5	20	5		
	H63	36	1,435	350					20	5	20	5		
	H64	37	1,435	336					20	5	20	5		
	H65	38	1,435	323					20	5	20	5		
	H66	39	1,435	311					20	4	20	4		
	H67	40	1,435	299					20	4	20	4		
	H68	41	1,435	287					20	4	20	4		
	H69	42	1,435	276					20	4	20	4		
	H70	43	1,435	266					20	4	20	4		
	H71	44	1,435	255					20	4	20	4		
	H72	45	1,435	246					20	3	20	3		
	H73	46	1,435	236					20	3	20	3		
	H74	47	1,435	227					20	3	20	3		
	H75	48	1,435	218					20	3	20	3		
	H76	49	1,435	210					20	3	20	3		
	H77	50	1,435	202					20	3	20	3		
	H78	51	1,435	194					20	3	20	3		
	H79	52	1,435	187					20	3	20	3		
	H80	53	1,435	180					20	3	20	3		
	H81	54	1,435	173					20	2	20	2		
	H82	55	1,435	166					20	2	20	2		
	H83	56	1,435	160					20	2	20	2		
合　計			74,650	26,764	400	27,164	13,182	11,467	1,043	376	14,225	11,843	2.3	15,321

様式-6 事業費の内訳書 （全事業）

事業費の内訳書

河川事業

事業名	江の川直轄河川改修事業（全事業費）

評価年度	H27	再評価

区分	費目	工種	単位	数量	金額（百万円）	備考
工事費			式	1	33,094	
	本工事費		式	1	30,377	
		築堤	千m3	6,925	6,898	
		掘削	千m2	3,624	8,635	
		特殊堤	m	417	19	
		護岸	千m	556	9,135	
		地盤改良	箇所	5	2,091	
		水路	千m	75	741	
		樋門・樋管	箇所	14	1,046	
		陸閘門	箇所	3	252	
		その他	式	－	1,560	仮設工等
	附帯工事費		式	1	2,717	
		橋梁	箇所	5	1,941	
		付替道路	箇所	51	776	
		揚水機場	箇所	0	0	
用地費及び補償費			式	1	14,843	
間接経費等			式	1	18,435	
事業費　計			式	1	66,372	

維持管理費	式	1	9,257	

様式-6 事業費の内訳書 （当面の整備）

事業費の内訳書

河川事業

事業名	江の川直轄河川改修事業（当面事業費）

評価年度	H27	再評価

区分	費目	工種	単位	数量	金額（百万円）	備考
工事費			式	1	7,303	
	本工事費		式	1	6,883	
		築堤	千m3	906	2,385	
		掘削	千m2	168	859	
		特殊堤	m	392	18	
		護岸	千m	116	1,983	
		地盤改良	箇所	1	648	
		水路	千m	33	77	
		樋門・樋管	箇所	6	540	
		陸閘門	箇所	1	132	
		その他	式	－	241	仮設工等
	附帯工事費		式	1	420	
		橋梁	箇所	3	99	
		付替道路	箇所	1	321	
		揚水機場	箇所	0	0	
用地費及び補償費			式	1	2,971	
間接経費等			式	1	2,908	
事業費　計			式	1	13,182	

維持管理費	式	1	1,043	
