特定緊急砂防事業実施状況

令和4年6月30日現在

大谷川　1-9-226渓流（東区　馬木地区）

大谷川２号及び３号砂防堰堤の掘削・床堀、並びに管理用道路の工事を進めています。

全　景

位置図

大谷川３号砂防堰堤　施工状況（掘削・床堀）

砂防堰堤　施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年6月30日現在

深山の滝川　2-23-15渓流（安芸区矢野町地内）

広島市安芸区矢野東地区において、深山の滝川下流の砂防堰堤の工事に着手しました。

深山の滝川施工状況(R4.6月末時点)

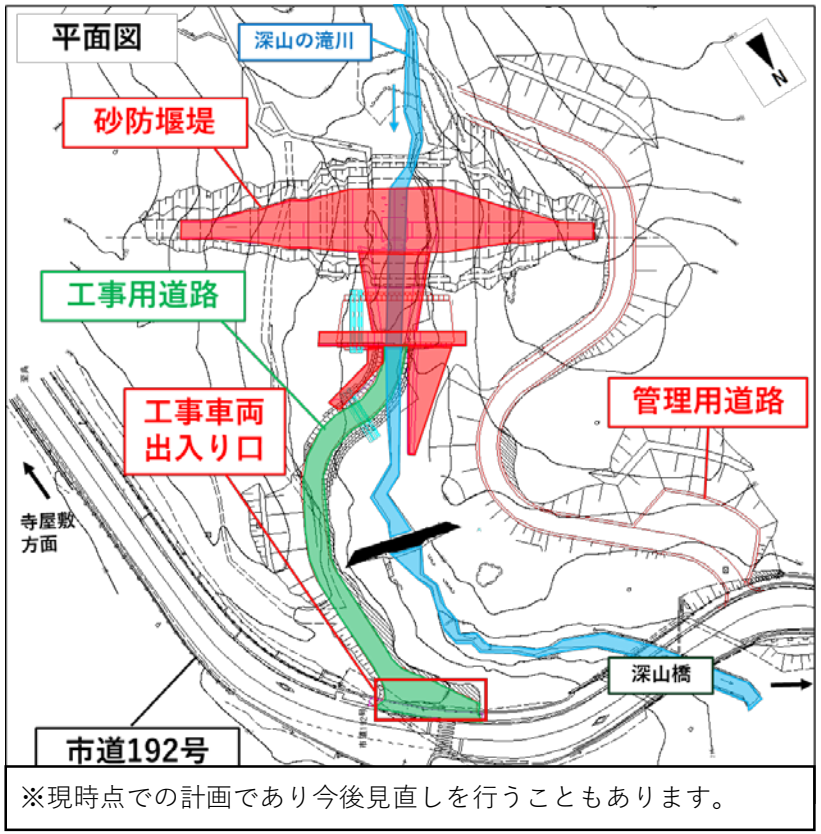

※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。

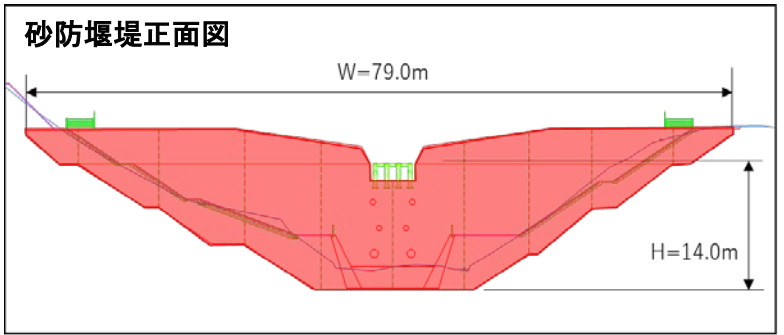

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年6月30日現在

大屋大川（呉市天応地区）

- 呉市天応地区において、深山の滝の上流に砂防堰堤を作るための工事用道路兼管理道の整備を実施しています。
- 砂防堰堤１基（既設堰堤下流堰堤）の施工に着手しています。

■位置図

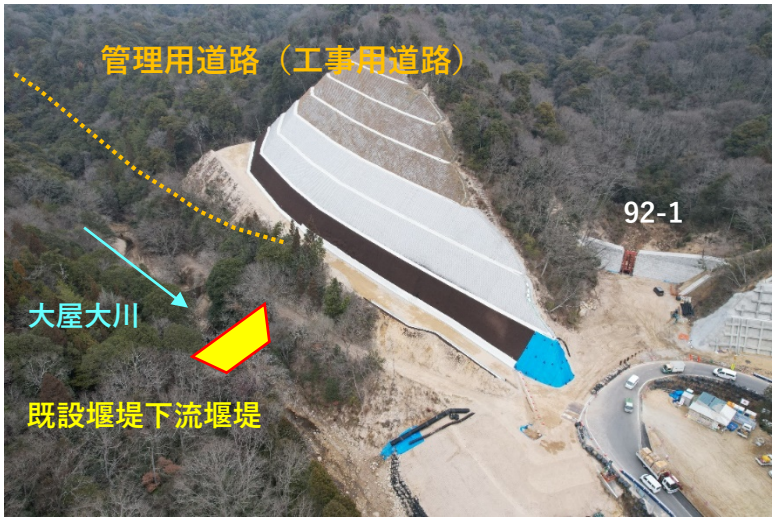

■管理道（工事用道路）全景

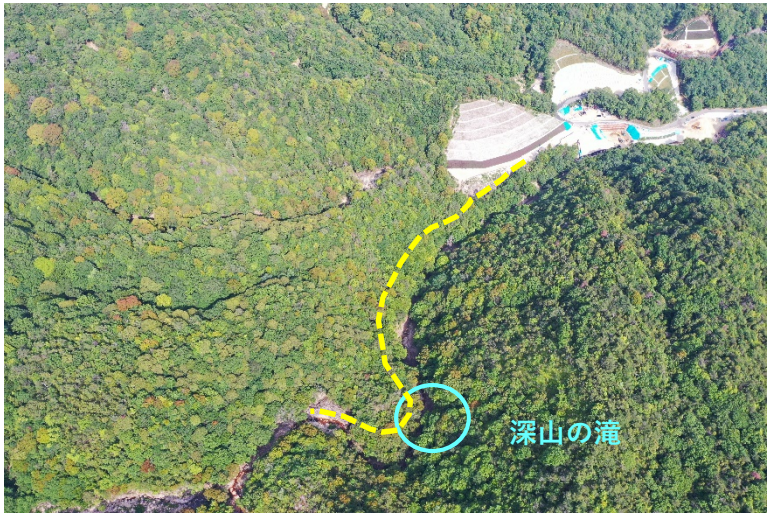

■既設堰堤下流堰堤施工箇所

進入路及び作業ヤード整備

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年6月30日現在

大屋大川 3-81-92隣e及びh 渓流（呉市天応地区）

- 92隣e渓流の管理用道路、流木捕捉工、堆積工を施工しています。
- 92隣h渓流の砂防堰堤本体、前庭保護工の打設が完了しました。引き続き堰堤の仕戻し、管理用道路を施工しています。

９２隣ｅ、９２隣h渓流　全景（R4.6月末時点）

92隣h渓流　施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年6月30日現在

総頭川・大判川・明神川　2-24-7・2-24-6397・2-24-6渓流（安芸郡坂町地区）

位置図

明神川
砂防堰堤
前庭保護工
渓流保全工
明神川
三田尾公園
大判川
総頭川
砂防堰堤
大判川
砂防堰堤
前庭保護工
渓流保全工
総頭川下流
砂防堰堤
前庭保護工
前庭保護工
渓流保全工
総頭川
向井田橋
旗橋
町道付替
本総頭橋
中央公園
坂小学校
森浜橋
荒神橋
総頭川
県道坂小屋浦線
みみょう
保育園
恵美須橋
坂町
役場
JR呉線
国道31号

安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年6月30日現在

総頭川・大判川　2-24-7・6397渓流（安芸郡坂町地区）

渓流保全工を施工しています。

総頭川・大判川施工状況(着手前H31.4時点)

総頭川・大判川施工状況(R4.6月末時点)

大判川施工状況（R4.6月末時点）

総頭川施工状況（R4.6月末時点）

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年6月30日現在

総頭川　2-24-7渓流（安芸郡坂町地区）

準備工として除草作業を行っています。

総頭川施工状況(着手前R4.4時点)

総頭川施工状況(R4.6月末時点)

砂防堰堤（本堤）正面図

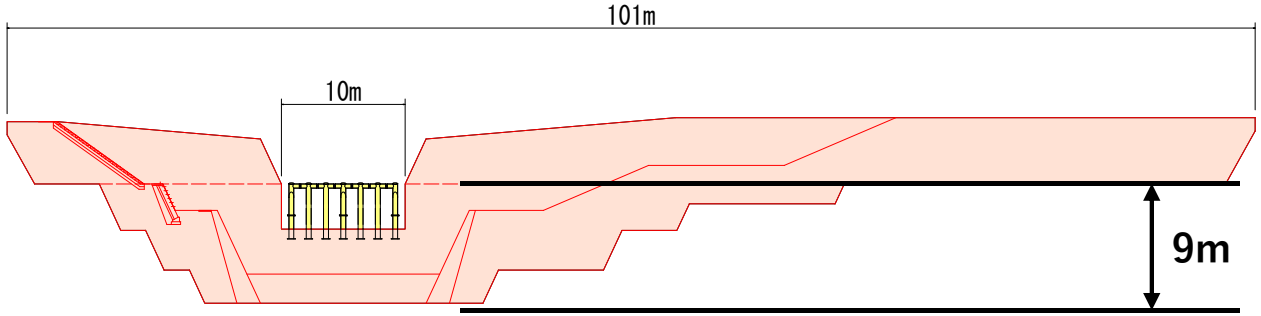

砂防堰堤断面図

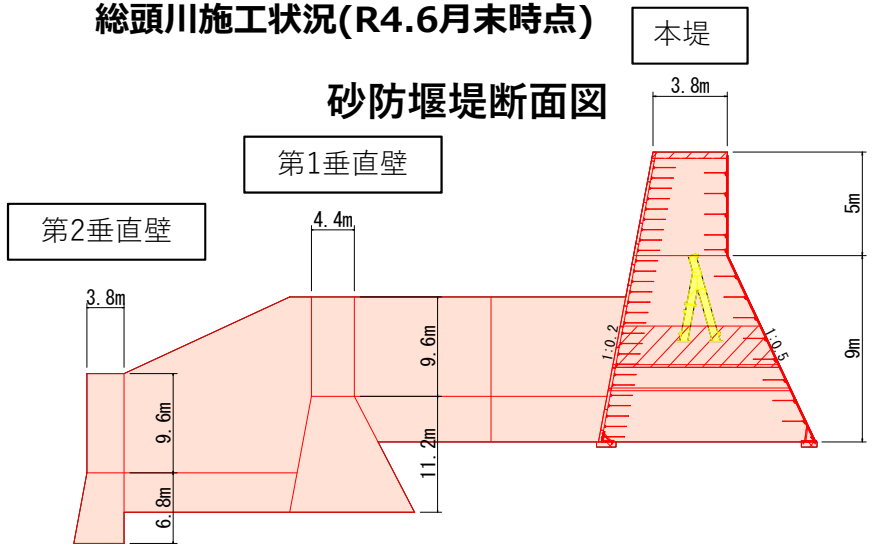

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年6月30日現在

明神川　2-24-6渓流（安芸郡坂町地区）
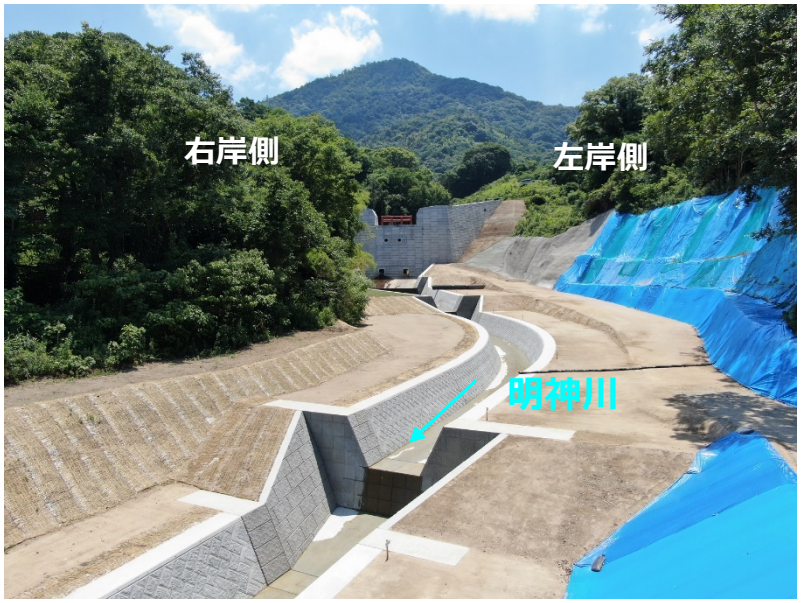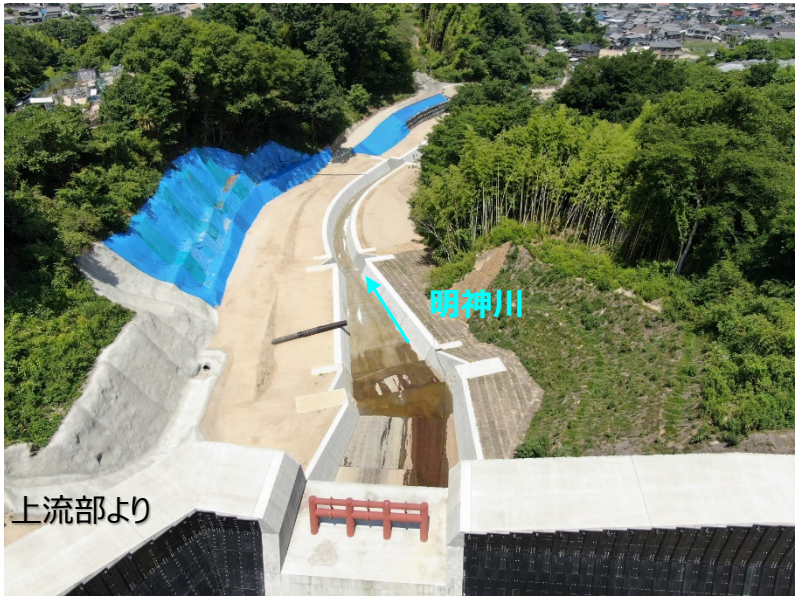
渓流保全工が完成しました。
