

# 山陰道の概要



## 山陰道の概要

- 山陰道は、山陰地方の産業・経済の発展や観光振興及び国土強靱化を目的とした鳥取県から山口県に至る約380kmの高規格道路です。
- 島根県内は、約113kmが開通し、約60kmの事業を推進しています。



※朱書きは浜田河川国道事務所事業中区間


|                 |  |
|-----------------|--|
| 開通区間            |  |
| 開通区間(NEXCO管理区間) |  |
| 事業中区間           |  |

### <山陰道整備状況>

|     | 島根県<br>(R4.4.1時点) |
|-----|-------------------|
| 延長  | 約180km            |
| 開通済 | 約113km(63%)       |
| 事業中 | 約60km(33%)        |

※中国横断自動車道尾道松江線(松江玉造IC～宍道JCT間)は除く。

# 山陰道の整備状況

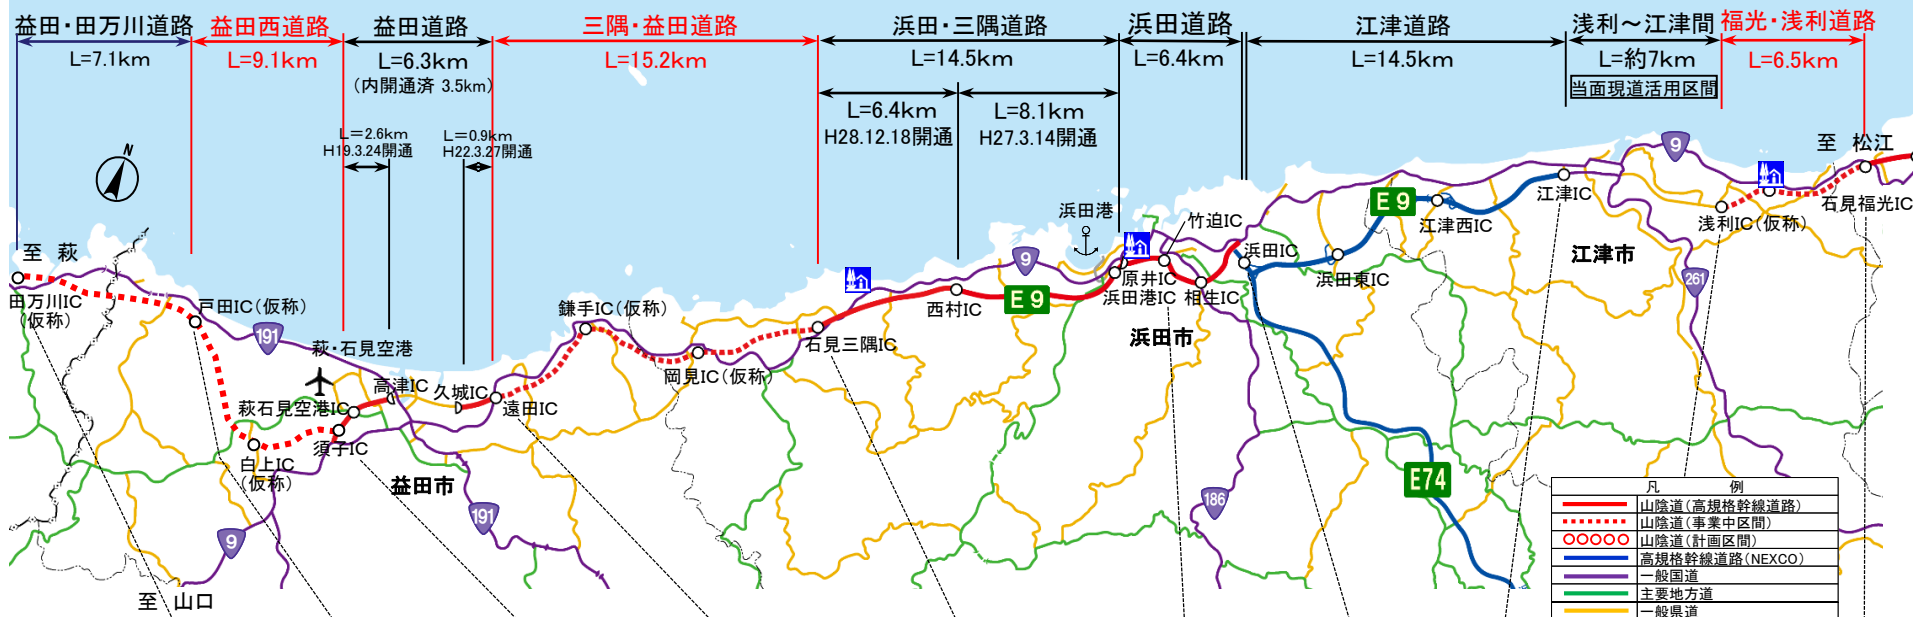

| 項目              | 益田・田万川道路          | 益田西道路           | 益田道路   | 三隅・益田道路                      | 浜田・三隅道路   | 浜田道路           | 江津道路             | 浅利～江津間  | 福光・浅利道路                                    |
|-----------------|-------------------|-----------------|--|------------------------------|---|----------------|------------------|---|--|
| 事業化年度           | R3年度              | R2年度            | H8年度   | H24年度                        | H16年度   | S53年度          | S48年度            |   | H28年度                                      |
| 開通年度            | —                 | —               | 遠田IC～久城IC<br>H22.3.27 開通<br>高津IC～国道9号<br>(県)久城インター線<br>H19.3.24 開通 | 令和7年度開通予定                    | 原井IC～西村IC<br>H27.3.14 開通<br>西村IC～石見三隅IC<br>H28.12.18 開通 | H5. 6. 3<br>開通 | H15. 9. 21<br>開通 | 江津バイパス<br>H5.3.25開通<br>(県)浅利渡津線<br>H31.3.17開通 | —  |
| 事業進捗率<br>R4年度   | 約 1 %             | 約 3 %           | —  | 約 75 %                       | —   | —              | —                | —   | 約 34 %                                     |
| 用地進捗率<br>R4.3月末 | 0 %               | 0 %             | —  | 約 100 %                      | —   | —              | —                | —   | 約 96 %                                     |
| 全体事業費           | 370億円             | 330億円           | —  | 860億円                        | —   | —              | —                | —   | 290億円                                      |
| R4事業費           | 約1億<br>(島根県:0.7億) | 約3億             | —  | 約98億                         | —   | —              | —                | —   | 約21億                                       |
| 令和4年度<br>事業概要   | 調査・設計             | 調査・設計<br>用地取得着手 | —  | 改良、橋梁工事<br>舗装工事<br>(H27工事着手) | —   | —              | —                | —   | 構造物等設計、<br>用地取得、橋梁工事<br>道路改良工事<br>(R3工事着手) |
