

工事請負契約に係る 設計・契約変更ガイドライン(案)

平成20年3月

国土交通省 中国地方整備局

目

1. 設計・契約変更ガイドライン策定の目的	P 1
公共工事の特徴	
設計・契約変更の現状	
設計・契約変更の課題	
ガイドライン策定の目的	
2. 設計・契約変更の基本事項	P 3
設計変更と契約変更	
契約変更の範囲	
設計・契約変更の対象となる事項	
指定・任意の考え方	
施工条件の明示	
3. 発注者・請負者の留意事項	P 7
発注者の留意事項	
受注者の留意事項	
4. 設計・契約変更の考え方	P 8
請負者が照査結果の確認を請求した場合	
発注者が必要と認め変更する場合	
工事を一時中止する必要がある場合	

次

5. 契約変更の手續	P 16
6. 契約金額の変更に代える 設計図書の変更	P 17
7. 参考資料	P 18
工事請負契約書関係事項	
土木工事共通仕様書関係事項	
条件明示に係る通達	

1. 設計・契約変更ガイドライン策定の目的

公共工事の特徴

公共工事は、多岐にわたる目的物について個別に設計を行い、多種多様な自然条件・施工条件の下で構築されるという特殊性を有している。



発注者は、当初設計積算時に予見できない地質・湧水等の変化に対応できるよう施工条件を設計図書に明示し、設計変更等工事の円滑化に努める必要がある。

設計・契約変更の現状

設計・契約変更の現状

契約図書に条件明示されている事項



契約図書に条件明示されている事項と現場条件が一致しない場合には、契約書の関連事項に基づき、設計図書に条件明示した事項を変更し必要に応じて請負代金額の変更を行っている。
このことから、設計変更に係る問題はない。

契約図書に条件明示が脱漏又は不明確となっている事項や任意仮設等一式計上されている事項



契約書の関連事項に基づく手続が適正に行われておらず、発注者・請負者間での変更対応が問題となっている場合がある。

設計・契約変更の課題

設計・契約変更の課題

「適正な設計・契約変更対応」は、各建設業団体との意見交換会においても議論されているところであり、発注者・請負者間における喫緊の課題

ガイドライン策定の目的

設計変更の課題に対して、発注者・請負者相互で設計変更に必要な手続き等についての認識を深め、設計・契約変更の円滑化・適性化を図ることを目的に、本ガイドラインを策定した。

2. 設計・契約変更の基本事項

設計変更と契約変更

設計変更及び契約変更の基本原則

工事の施工は、設計図書に基づいて施工すべきであるが、やむを得ず当初設計に差異を生じた場合に設計変更及び契約変更を行う。

設計変更と契約変更

設計変更とは、工事の施工にあたり設計図書の内容の変更に係るもの。
契約変更とは、設計変更に伴う請負代金額の変更又は工期の変更の決定に基づく契約の変更を行うもの。

契約変更の範囲

[「設計変更に伴う契約変更の取り扱い(官房長通達昭和44年3月31日
中国建契発第113号昭和44年4月1日)]

設計表示単位に満たない設計変更は、契約変更の対象としない。
一式工事については、請負者に図面、仕様書又は現場説明において設計条件又は施工方法を明示したものに付き、当該設計条件又は施工方法を変更した場合のほか、原則として契約変更の対象としない。
変更見込金額が請負代金額の30%をこえる工事は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則として、別途契約するものとする。

設計・契約変更の対象となる事項

公共工事標準請負契約約款(以下、契約約款)で定められている設計・契約変更は以下のとおり。

設計・契約変更の対象となる事項	契約約款
1. 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない場合(これらの優先順位が定められている場合を除く)	第18条第1項第1号
2. 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合	第18条第1項第2号
3. 設計図書の表示が明確でない場合	第18条第1項第3号
4. 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合	第18条第1項第4号
5. 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場合	第18条第1項第5号
6. 発注者が必要と認め、設計図書の内容を変更する場合	第19条
7. 工事を一時中止する必要がある場合	第20条

契約約款では、上記表における条文に起因する場合のほか、第8条(特許権等の使用)、第15条(支給材料及び貸与品)、第17条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)、第22条(甲の請求による工期の短縮等)、第25条(賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更)、第26条(臨機の措置)、第27条(一般的損害)、第29条(不可抗力による損害)、第33条(部分使用)で設計・契約変更する場合があることを規定している。

指定・任意の考え方

契約約款第1条3項

仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがない場合を除き、乙がその責任において定める。



指定とは、工事目的物を施工するにあたり、設計図書で指定したとおり施工を行わなければならないもの。

任意とは、工事目的物を施工するにあたり、設計図書では指定せず、請負者の責任において施工を行うことができるものである。

仮設、施工方法の一切の手段の選択は請負者の責任で行う。

仮設、施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象としない。(但し、請負者の責によらない場合を除く)

当初設計時の想定と現地条件が異なることによる変更は行う。(但し、請負者の責による場合を除く)

指定・任意の考え方

	指 定	任 意
設計図書での取り扱い	施工方法等について具体的に指定 (契約条件として位置付け)	施工方法について具体的に指定しない (契約条件ではないが、参考図として標準的工法等を示すことがある)
施工方法等の変更	発注者の指示又は承諾が必要	請負者の任意 (施工計画書等の修正、提出は必要)
施工方法の変更が生じた場合の設計変更	対象とする (但し、請負者の責による場合を除く)	対象としない (但し、請負者の責によらない場合を除く)
当初明示した条件の変更が生じた場合の設計変更	対象とする (但し、請負者の責による場合を除く)	対象とする (但し、請負者の責による場合を除く)

施工条件の明示

発注者は、契約約款第18条第1項4項に定めたとおり、請負者が工事に即した適切な施工ができるよう設計図書(現場説明書等)に必要な施工条件を明示しなければならない。施工条件の明示にあたっては、「条件明示マニュアル(平成14年4月22日通達)」に記載されている事項について明示する。

3. 発注者・請負者の留意事項

発注者の留意事項

発注者は、請負者が工事の目的に即した適切な施工ができるよう、設計図書には必要な条件を明示しなければならない。

また、変更の必要がある場合は請負者に対して書面により指示を行わなければならない。



設計積算にあたり工事の施工に係る制約事項については、設計図書に条件明示を行う。

[契約約款第18条第1項4項、「条件明示マニュアル(平成14年3月28日通達)」]

請負者が実施する設計図書の照査の結果、請負者から確認の請求があった場合は、調査を行いその結果を請負者に通知し、必要があると認められる時は設計変更又は契約変更を行う。

[契約約款第18条第1項第1号から第5号、土木工事共通仕様書1-1-3(設計図書の照査等)]

設計変更を行う必要が生じた場合など必要な指示、協議等は書面で行う。[契約約款1条第5項]

請負者の留意事項

請負者は、工事の目的が達せられるよう施工する義務があり、工事に係る発注者の意図、設計図書、現場条件等を確認する必要がある。



請負者(入札参加者)は、仕様、図面、契約書案、現場説明書について不明瞭な事項がある場合は質問にて確認のうえ入札書を提出する。[競争契約入札心得第4条(入札等)]

工事着手時点においては設計図書を照査し疑義を明確にするとともに、施工中疑義が生じた場合は、発注者と書面による協議を行い、発注者からの書面での指示に従い施工する。

4. 設計・契約変更の考え方

請負者が照査結果の確認を請求した場合 [契約約款第18条第1項]

設計図書の照査と設計・契約変更

請負者は、契約約款第18条第1項第1号から第5号及び土木工事共通仕様書1-1-3(設計図書の照査等)で定めている照査を実施。

監督職員は、請負者から照査に基づき確認を請求され、自ら事実を発見したときは請負者の立会いのうえ調査を実施。(請負者の立会いを得ずに行うこともできる。)

監督職員は、調査の結果をとりまとめ、調査終了後14日以内に、結果を請負者に通知。

調査の結果、事実を確認

必要があると認められる時は、設計図書を訂正又は変更。

「必要があると認められる時」とは、発注者の意志ではなく客観的に決定。

従って、確認された事実が軽微で、当初の設計図書に従って施工を継続しても支障がない場合を除き、訂正又は変更を行うべき。

設計図書を訂正又は変更した場合、必要があると認められる時は、工期若しくは請負代金額を変更

「必要があると認められる時」とは、発注者又は請負者が認めるときではなく客観的に決定。

従って、設計図書の変更等が行われても、全く工期又は請負代金額に影響を及ぼさない等特殊な場合を除き変更を行うべき。

「設計図書の照査」の範囲を超える事項

請負者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える事項としては以下の事項が想定される。

現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの。又は縦断計画の見直しを伴う横断図の再作成が必要となるもの。

現地調査の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。又は土工の縦横断計画の見直しが必要となるもの。

構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり構造物の再計算が必要となるもの。

構造物の載荷高さが変更となり、構造計算の再計算が必要となるもの。

現地測量の結果、構造物のタイプが変更となるが標準設計で修正可能なもの。

構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの。

基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成。

土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成。

「設計要領」・「各種示方書」等との対比設計。

構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査。

設計根拠まで遡る設計図書の見直し。

舗装修繕工事の縦横断設計(当初の設計図書において縦横断図面が示されており、その修正を行う場合とする。

なお、設計図書で縦横断図が示されておらず土木工事共通仕様書第10編17-4-3路面切削工、17-4-5切削オーバーレイ工等に該当し縦横断設計を行うものは設計照査に含まれる。

なお、適正な設計図書に基づく数量の算出及び完成図については、請負者の費用負担によるものとする。

設計図書がお互いに一致しない場合 [契約約款第18条第1項1号]

(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書がお互いに一致しない場合)

事 例

図面と設計書(金抜き)の材料の寸法、規格、数量等の記載が一致しない。
平面図と縦断図の延長、材料名称、仕様等の記載が一致しない。… etc

設計図書に誤謬又は脱漏がある場合 [契約約款第18条第1項2号]

事 例

設計図書に誤謬がある場合

設計図書に示されている施工方法では、条件明示されている土質に対応できない。
図面に記載されている材料の規格が間違っている。… etc

設計図書に脱漏がある場合

図面に使用材料の規格が記載されていない。
一式工事について、図面、仕様書又は現場説明書に設計条件又は施工方法に係る必要事項が記載されていない。… etc

設計図書の表示が明確でない場合 [契約約款第18条第1項3号]

事 例

材料の使用量が共通仕様書の記載と特記仕様書の記載とが異なる。
水替工の記載はあるが、作業時、常時など運転状況の記載がない。
用地買収が未了との記載はあるが、着工見込み時期の記載がない… etc

設計図書と実際の工事現場が一致しない場合 [契約約款第18条第1項4号]

事 例


設計図書に明示された土質や地下水位が工事現場と一致しない。
設計図書に明示された地盤高が工事現場と一致しない。
設計図書に明示された地下埋設物の位置が工事現場と一致しない。… etc

予期することのできない特別な状況が生じた場合 [契約約款第18条第1項5号]

事 例


施工中に埋蔵文化財が発見され、調査が必要となった。
工事範囲の一部に軟弱地盤があり、地盤改良が必要となった。… etc

契約約款第18条第1項に係る変更手続

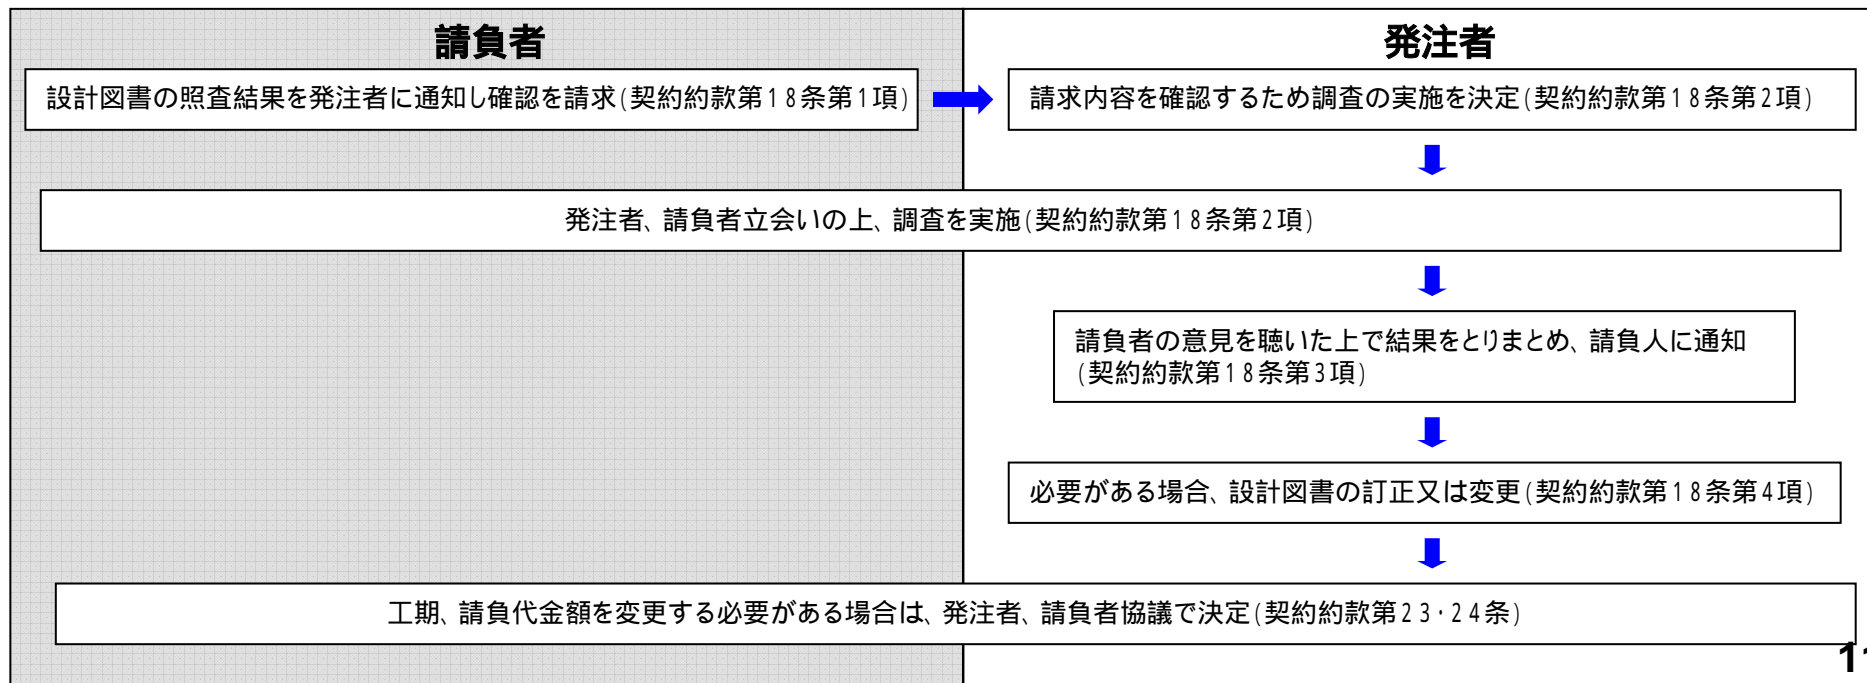


発注者が必要と認め変更する場合 [契約約款第19条]

発注者は、工事の施工途中において、当初発注の内容を変更せざるを得ない事態が生じた場合



必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知し、設計図書の変更を行う。
「必要があると認める」とは、発注者の判断であり、その理由を請負者に示す必要はない。




この場合、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額の変更を行う
「必要があると認められるとき」とは、発注者又は請負者が認めるときではなく客観的に決定。
従って、設計図書の変更等が行われても、全く工期又は請負代金額に影響を及ぼさない等特殊な場合を除き変更を行うべき。

事 例

地元調整、関係機関協議の結果、施工範囲、施工内容、施工日・時間の変更を行う。
新たに施工する必要のある工種が判明し、その工種を追加する。
関連する工事の影響による施工条件の変更により、施工内容の変更を行う。
工事現場の安全管理上、フェンス等の防護施設(共通仮設費の率分以外)を必要と判断し、追加する。 … etc

契約約款第19条に係る変更手続

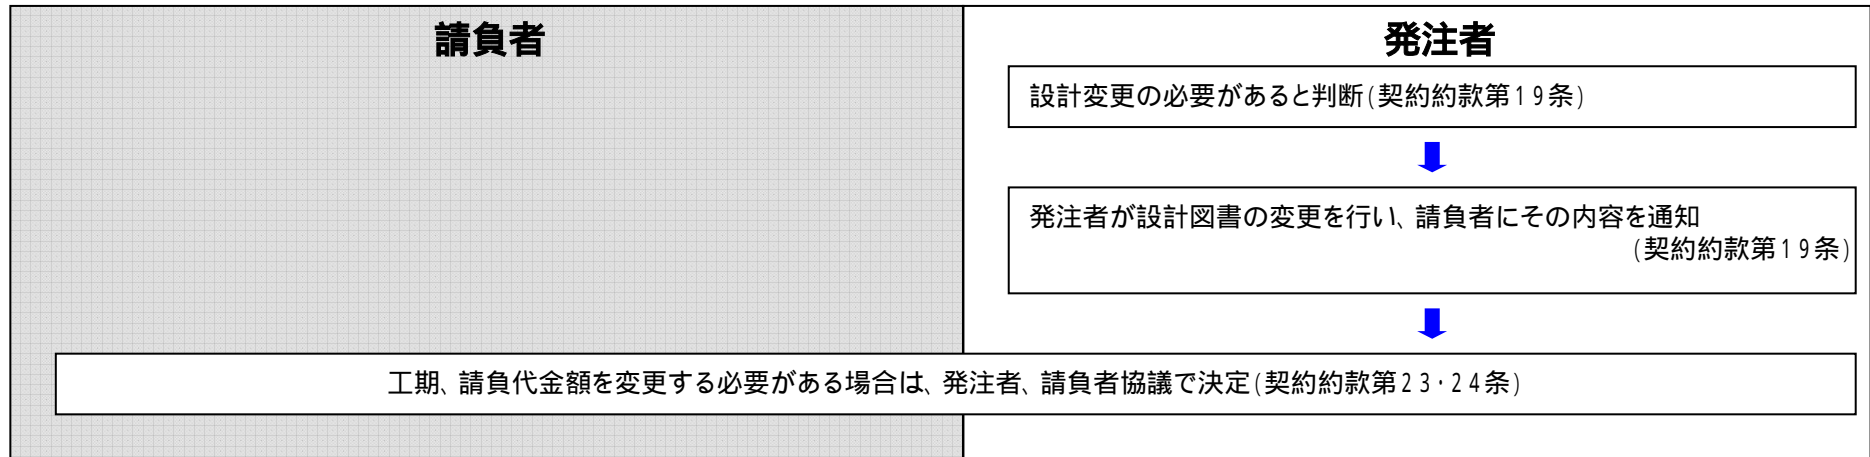

工事を一時中止する必要がある場合 [契約約款第20条]

「工事一時中止に係るガイドライン」参照

工事用地等の確保ができない等のため又は自然的若しくは人為的な事象であって請負者の責に帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認められる場合。 [契約約款第20条第1項]

「工事を施工できないと認められるとき」とは、客観的に認められる場合を意味し、発注者又は請負者の主観的判断により決まるものではない。

上記以外に、発注者が必要であると認める場合。 [契約約款第20条第2項]

「必要であると認める」とは、発注者の判断。

発注者は、工事の中止内容を請負者に通知し、工事の全部又は一部の施工を中止させることができる。 [契約約款第20条第1・2項]

工事の中止に伴う増加費用等の負担については、請負者から請求があった場合に適用する。増加費用として積算する範囲は、「工事現場の維持に要する費用」、「工事体制の縮小に要する費用」、「工事の再開準備に要する費用」とする。 [契約約款第20条第1・2項]

事 例


工事用地の等の確保ができない場合

発注者の義務である工事用地等(施工上必要な用地)の確保が行われていない。

自然的若しくは人為的な事象により工事を施工できない場合

暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、反対運動等の妨害活動、埋蔵文化財の発掘又は調査等

契約約款第20条に係る変更手続

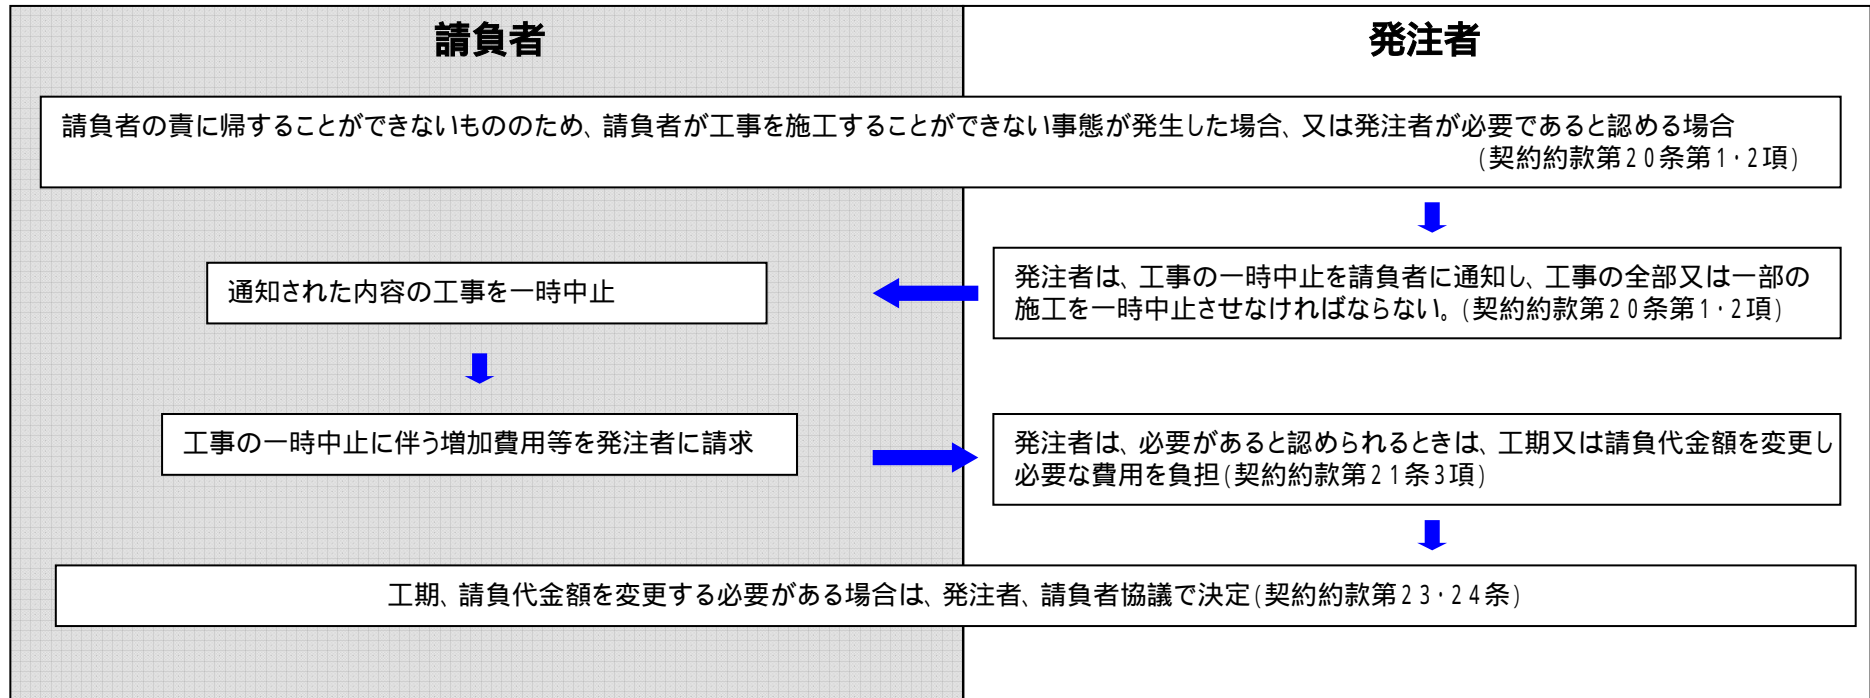

5. 契約変更の手続 [契約約款第23・24条]

工期の変更 [契約約款第23条]

工期の変更については、発注者・請負者協議。

協議開始日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め請負者に通知。

協議の開始日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知

発注者が工期の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始日を通知しない場合、請負者は協議開始日を定め発注者に通知。

請負代金額の変更 [契約約款第24条]

請負代金額の変更については、発注者・請負者協議。

協議開始日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め請負者に通知。

協議の開始日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知

発注者が工期の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始日を通知しない場合、請負者は協議開始日を定め発注者に通知。

請負者が増加費用を必要した場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者・請負者協議。

6. 契約金額の変更に代える設計図書の変更 [契約約款第30条]

請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別な理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。

請負代金額の増額が発生する場合、発注者は予算を確保しておかなければならないが、予算が確保できていない場合は、会計制度上問題となる

このよう場合には、設計図書を変更し、当初の請負代金額又は発注者の負担しうる範囲内の増額等に相応する工事量とすることができる。

設計図書の変更内容は、発注者・請負者協議して定める。

協議開始日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め請負者に通知。

協議の開始日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知

発注者が工期の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始日を通知しない場合、請負者は協議開始日を定め発注者に通知。

7. 参考資料

工事請負契約書関係条項

(総則)

- 第1条 発注者及び請負者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を言う。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
3. 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法」)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。

(条件変更等)

- 第18条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
- 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く)
 - 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること
 - 三 設計図書の明示が明確でないこと
 - 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
 - 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
- 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いに応じない場合は、乙の立会いを得ずに行うことができる。
- 3 甲は、乙の意見を聴いて、調査結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
- 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
- 一 第1項第1号から3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 甲が行う。
 - 二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 甲が行う。
 - 三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 甲が行う。
- 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第19条 甲は、前条第4項の既定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知し、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更に係る乙の提案)

第19条の2 乙は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、甲に提案することができる。

- 2 甲は、前項の規定に基づく乙の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認められるときは設計図書を変更し、これを乙に通知しなければならない。
- 3 甲は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。

(工事の中止)

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって乙の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

- 2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
- 3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(乙の請求による工期の延長)

第21条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。

(甲の請求による工期の短縮等)

第22条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。

- 2 甲は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
- 3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更)

第23条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

- 2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が工期延期の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始日を定め、甲に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第24条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

- 2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
- 3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第30条 甲は、第8条、第15条、第17から第20条まで、第22条、第25条から第27条までの規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

- 2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

土木工事共通仕様書関係事項

1 - 1 - 3 設計図書の照査等

1. 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、請負者が備えなければならない。
2. 請負者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。
なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取り合図、施工図等を含むものとする。また、請負者は、監督職員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
3. 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。

1 - 1 - 13 工事の一時中止

1. 発注者は、契約書第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合には、請負者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については1 - 1 - 41臨機の措置により、請負者は、適切に対応しなければならない。
 - (1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適當または不可能となった場合
 - (2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適當と認めた場合
 - (3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適當または不可能となった場合
2. 発注者は、請負者が契約図書に違反したまたは監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を請負者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができるものとする。
3. 前1項及び2項の場合において、請負者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、請負者は工事の続行に備え工事現場を保全しなければならない。

1 - 1 - 14 設計図書の変更

設計図書の変更とは、入札に際して発注者が指示した設計図書を、請負者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。

1 - 1 - 15 工期変更

1. 契約書第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条及び第43条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第23条の工期の変更協議の対象であるか否かを監督職員と請負者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督職員はその結果を請負者に通知するものとする。
2. 請負者は、契約書第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出しなければならない。
3. 請負者は、契約書第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出するものとする。
4. 請負者は、契約書第21条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出するものとする。
5. 請負者は、契約書第22条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出しなければならない。

条件明示に係る通達[平成14年3月28日]

国官技第 369号
平成14年3月28日

中国地方整備局 企画部長 殿

国土交通省大臣官房技術調査課長

条件明示について

国土交通省直轄の土木工事を請負施工に付する場合における工事の設計図書に明示すべき施工条件について、「建設省技調発第24号」（平成3年1月25日付け）に補足追加し、明示項目及び明示事項（案）をとりまとめたので参考にされたく通知する。
なお、「条件明示について」（平成3年1月25日）建設省技調発第24号は廃止する。

記

1. 目的
「対象工事」を施工するにあたって、制約を受ける当該工事に関する施工条件を設計図書に明示することによって、工事の円滑な執行に資することを目的とする。
2. 対象工事
平成14年4月1日以降に入札する国土交通省直轄の土木工事とする。
3. 明示項目及び明示事項（案）
別紙
4. 明示方法
施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。
5. その他
(1) 明示されない施工条件、明示事項が不明確な施工条件についても、契約書の関連する条項に基づき甲・乙協議できるものであること。
(2) 現場説明時の質問回答のうち、施工条件に関するものは、質問回答書により、文書化すること。
(3) 施工条件の明示は、工事規模、内容に応じて適切に対応すること。なお、施工方法、機械施設等の仮設については、施工者の創意工夫を損なわないよう表現上留意すること。

中国地方整備局
技管第18号
14.4

明示項目	明示事項
安全対策関係	4. 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容 5. 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容
工事用道路関係	1. 一般道路を搬入路として使用する場合 (1) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等 (2) 搬入路の使用及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 2. 仮道路を設置する場合 (1) 仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容期間 (2) 仮道路の工事終了後の処置（存置又は撤去） (3) 仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容
仮設備関係	1. 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等 2. 仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法 3. 仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容
建設副産物物関係	1. 建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの、距離、時間等の処分及び保管条件 2. 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容 3. 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件。 なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件
工事支障物件等	1. 地上、地下等への占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 2. 地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び期間等
薬液注入関係	1. 薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等 2. 周辺環境への調査が必要な場合は、その内容
その他	1. 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等 2. 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無引き渡し場所等

別紙

明示項目及び明示事項（案）

明示項目	明 示 事 項
工 程 関 係	<ol style="list-style-type: none"> 1. 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期。 2. 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法 3. 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期 4. 関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲 5. 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期 6. 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間 7. 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数
用 地 関 係	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期 2. 工事用地等の使用終了後における復旧内容 3. 工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 4. 施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等
公 害 関 係	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容 2. 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間 3. 濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容（処理施設、処理条件等） 4. 工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等
安全対策関係	<ol style="list-style-type: none"> 1. 交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 2. 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 3. 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容

明示項目	明 示 事 項
そ の 他	<ol style="list-style-type: none"> 3. 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等 4. 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容 5. 架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 6. 工事用電力等を指定する場合は、その内容 7. 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 8. 部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 9. 給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等
