

# 令和4年度 芦田川水系流域治水プロジェクト (案)



福山市



府中市



世羅町



広島県

農林水産省  
林野庁



森林研究・整備機構



国土交通省

芦田川流域治水協議会 事務局  
(福山河川国道事務所)



国土を**整**え、**全**力で**備**える  
国土交通省  
中国地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism  
Chugoku Regional Development Bureau

令和5年6月

# 芦田川水系流域治水プロジェクト【位置図】

～備後地域の産業と暮らしを守る流域治水対策の推進～

- 令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、芦田川水系においても事前防災対策を進める必要があります。
- 芦田川は、一度氾濫が起これば、下流低平地に広範囲に浸水被害が広がりが長期化する特性を有しており、平成30年7月豪雨においても広範囲に浸水被害が発生したことを踏まえ、洪水時の水位を下げる河道掘削や内水被害を軽減する排水機能増強などの事前防災対策を進めます。
- 以下の取り組みを実施していくことで、国管理区間においては、流域で甚大な被害が発生した戦後最大の平成30年7月豪雨と同規模の洪水に対して、家屋浸水を防止し、流域における浸水被害の軽減を図ります。あわせて、迅速かつ適切な情報収集・提供体制を構築し、ホットラインを含めた確実な避難行動に資する情報発信などの取り組みを実施し「逃げ遅れゼロ」を目指します。



# 芦田川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～備後地域の産業と暮らしを守る流域治水対策の推進～

- 芦田川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市町が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。  
平成30年7月豪雨では、福山・府中市域において内水による浸水被害が先行して発生していることから
- 【短期・中期】 福山市街地等での浸水被害を防ぐため、下流部の河道掘削、排水機場の整備、雨水貯留施設の整備、浸水対策補助制度の検討・創設や防災ステーションの整備等を実施し、あわせて、逃げ遅れゼロを目指した、避難計画策定・ハザードマップ改訂周知・関係機関との実践的な訓練・排水計画の策定などソフト対策を継続的に実施する。
- 【中長期】 芦田川の中流部及び上流部の浸水被害を防ぐため、河道掘削、浸水対策補助制度の検討・創設や防災ステーションの整備等を実施し、流域全体の安全度向上を図る。

区分	対策内容	事業主体	対策工程			
			短期	中期	中長期	
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	福山市街地等での浸水被害を防ぐため、下流部の河道掘削	国交省 広島県	草戸水呑地区 河道掘削			
	芦田川の中流部及び上流部の浸水被害を防ぐため、河道掘削及び支川の河道拡幅、護岸整備、排水機場整備		草戸・水呑地区			
			福川・天王前川排水機場	土生・目崎・父石地区		
			西谷川・加茂川・福川・吉野川	御幸・郷分・駅家地区 新市・芦田地区 中須地区		
				神谷川・瀬戸川・有地川・御調川・服部川		
	内水被害を軽減させるため排水機能の向上		福山市 府中市	ポンプ増設 分解整備、更新等		ポンプ場増設等
				大橋、御幸、小山、川南、掛上樋門、戸手ほか	森脇、千田、小森・谷尻、佐波、津之郷ほか	
	ため池を活用した雨水貯留施設等整備		福山市	珠池、豊田池、丙里池 平田池、正藤池ほか		
砂防堰堤等の整備による土砂流出対策	広島県	砂防堰堤等の整備				
森林整備、治山施設整備による雨水の流出抑制	林野庁 広島県 森林整備センター	森林整備				
		治山施設整備				
被害対象を減少させるための対策	防災・減災のための住まい方や土地利用の推進	福山市 府中市	浸水対策補助制度の検討・創設			
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	広域避難を考慮したハザードマップの改訂周知等、タイムラインに基づく実践的訓練、防災教育や防災知識の普及  より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化、避難行動、水防活動、排水活動に資する水防資機材の配備  排水計画の作成および排水訓練の実施	国交省 気象庁 広島県 福山市 府中市	危機管理水位計増設 避難計画等の策定	関係機関との実践的訓練など継続的な取組		
			広域避難計画の策定、要配慮者施設の避難計画の作成	要配慮者施設の避難計画に基づく訓練促進、タイムラインに基づく実践的な訓練、防災リーダー研修、マイタイムライン普及促進等		
			防災ステーションの整備・検討	防災ステーション整備		
			関係機関が連携した水防訓練、水防団との連絡体制確保と伝送訓練、洪水リスクの高い箇所共同点検、水防活動を支援するための資機材等の配備等			
			排水計画の作成	大規模水害を想定した排水計画に基づく訓練の実施		
グリーンインフラの取組	詳細次ページ	詳細次ページ	詳細次ページ			

**■事業規模**  
 河川対策 約382億円  
 砂防対策 約290億円(他流域含む広島県全体、R3～7年度)  
 下水道対策 約99億円

気候変動を踏まえた更なる対策を推進

# 芦田川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～備後地域の産業と暮らしを守る流域治水対策の推進～

## グリーンインフラの取組ロードマップ

区分	対策内容	事業主体	対策工程		
			短期	中期	中長期
グリーン インフラ の取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 浅場環境の創出、多様な水際環境の創出、滞筋や瀬・淵・河畔林の保全、ワンド・たまり等の保全、親水性の確保</li> </ul>	国交省 広島県	浅場環境の創出 (草戸・水呑地区)	多様な水際環境の創出、瀬や河畔林の保全、浅場環境の創出 (御幸・郷分・駅家地区)	
			多様な水際環境の創出、ワンド・たまり等の保全 (新市・芦田地区)		
			多様な水際環境の創出、河畔林保全 (中須地区)		
			多様な水際環境の創出、滞筋や瀬・淵の保全 (西谷川・加茂川・福川)	親水性の確保 (土生・目崎・父石地区)	
			多様な水際環境の創出、滞筋や瀬・淵の保全 (神谷川・瀬戸川・有地川・御調川)		
	魚がのぼりやすい川づくり		魚がのぼりやすい川づくり		
	・ かわまちづくりの推進	国交省 福山市	かわまちづくりの推進		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 河川に関する学習支援（出前講座の実施、学習の場の提供）</li> <li>・ 地元自治体や地域住民、NPO等の参加した河川の協働管理</li> </ul>	国交省 広島県 福山市 府中市 世羅町	河川に関する学習支援（出前講座の実施、学習の場の提供）		
	・ 八田原ダム周辺の地域づくりの推進		八田原ダム周辺の地域づくりの推進		
	・ 森林整備、治山対策における自然環境の保全	林野庁 広島県 森林整備センター	生物多様性等への配慮		

# 芦田川水系流域治水プロジェクト【位置図】

～備後地域の産業と暮らしを守る流域治水対策の推進～



## ●グリーンインフラの取り組み 『ふるさとの豊かな自然と歴史をはぐくむ芦田川らしい自然環境の保全・再生』

- 芦田川は備前地方の中心に位置し、豊かな自然環境と悠久の歴史を有する河川であり、中流から上流では瀬と淵が見られ、魚類等の良好な生息・生育・繁殖環境となっているほか、下流では広大な水面の広がる河口堰貯水池や干潟など特徴ある景観を有するなど、次世代へ引き継ぐべき豊かな自然環境が多く存在しています。
- 芦田川水系では、河道掘削、堰改築等にあたり、清浄で多様な生物がみられるような川らしい自然環境の保全・再生を目指し、今後概ね30年間で淵や河畔林の保全、浅場環境や多様な水際環境の創出、魚類の遡上・降下環境の改善を行うなど、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの取組を推進します。



# 芦田川水系流域治水プロジェクト【事業効果(国直轄区間)の見える化】

～備後地域の産業と暮らしを守る流域治水対策の推進～


○草戸・水呑地区の河道掘削の短期整備完了に伴い、平成30年7月豪雨による洪水と同規模の洪水でも資産の集中する福山市街地で計画高水位以下で流下させることが可能となる。

## 整備効果

- ・国交省で実施する河川対策を抜き出し分析(県による河川対策や市による流域対策は含まれていない)
- ・支川の対策や内水対策の効果は今後分析予定


## 国交省短期整備(5カ年加速化対策)目標: 河川整備率 約51% → 約65%

### 実施箇所・対策内容


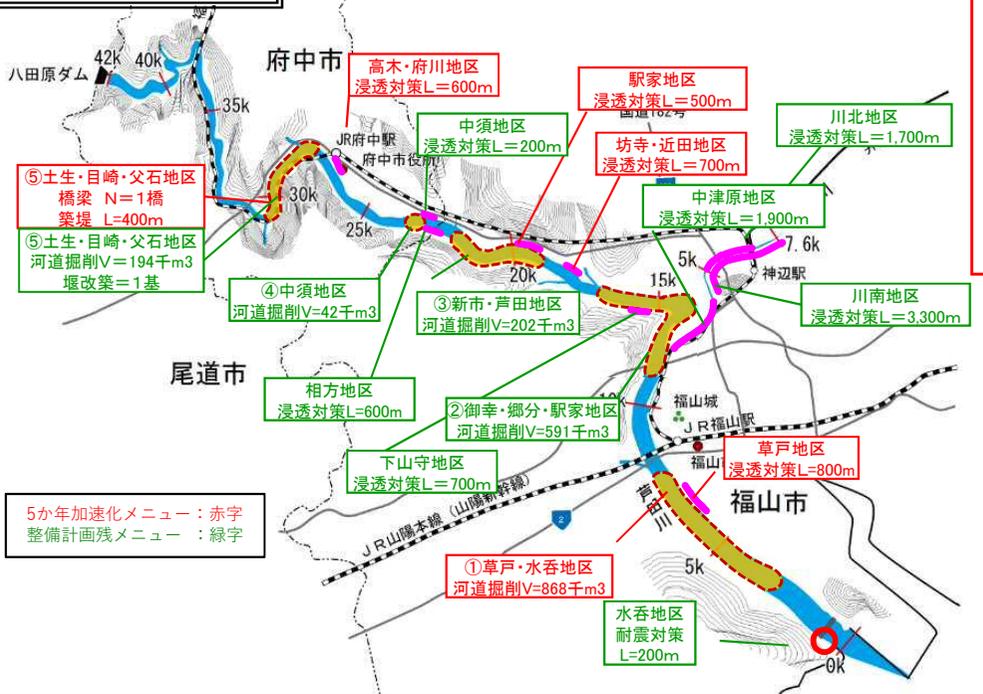


【短期整備完了時の進捗】

- ①草戸・水呑地区 河道掘削 0% → 100%
- ⑤土生・目崎・父石地区 橋梁改築・築堤・堰改築・河道掘削 0% → 18%
- 浸透対策・耐震対策 0% → 24%

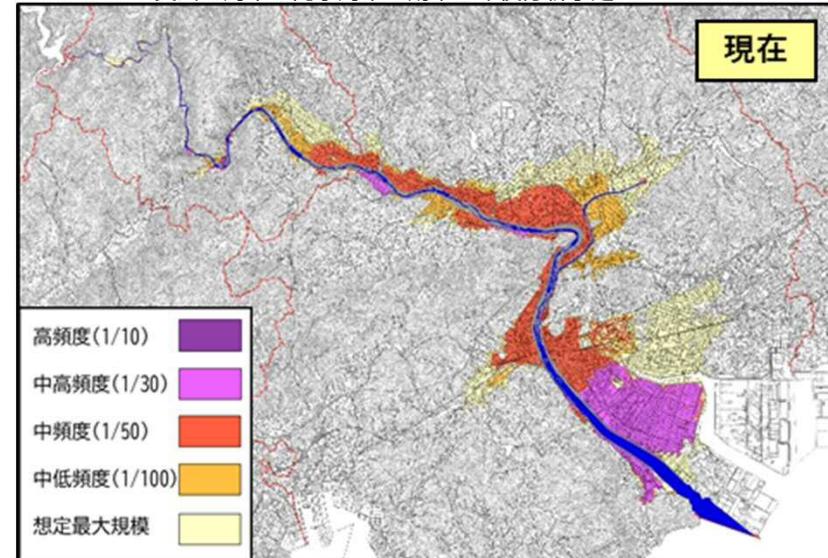

※芦田川・高屋川氾濫のみを想定したものであり、中小河川や下水等の内水氾濫を考慮した場合には浸水範囲の拡大や浸水深の増大が生じる可能性がある。

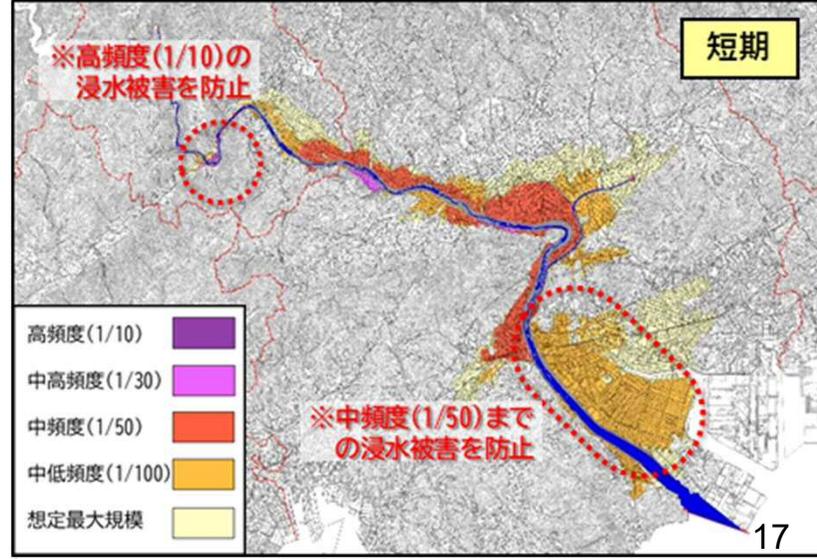

### 実施工程

区分	対策内容	区間	【5カ年加速化対策】		
			短期 (R3年度～R7年度)	中期 (R8年度～R15年度)	中長期 (R16年度～R32年度)
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 (国交省に関する部分抜き出し記載)	芦田川の中流部及び上流部の浸水被害を防ぐため、河道掘削及び護岸整備、浸透対策等	福山市街地等での浸水被害を防ぐため、下流部の河道掘削	下流部 概ね1/30→概ね1/60	府中市街地より下流 概ね1/30→概ね1/60	府中市街地より下流 概ね1/30→概ね1/60 府中市街地より上流 概ね1/30→概ね1/60
		①草戸・水呑地区	100%		
		②御幸・郷分・駅家地区		100%	
		③新市・芦田地区		100%	
		④中須地区		100%	
		⑤土生・目崎・父石地区	橋梁改築・築堤 18%		堰改築・河道掘削 100%
浸透対策・耐震対策	24%				

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある

# 芦田川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取り組み】

～備後地域の産業と暮らしを守る流域治水対策の推進～

戦後最大洪水等に対応した河川の整備（見込）



整備率：約65%  
（概ね5か年後）

農地・農業用施設の活用



3市町村  
（令和4年度末時点）

流出抑制対策の実施



3施設  
（令和3年度実施分）

山地の保水機能向上および土砂・流木災害対策



治山対策等の実施箇所 5箇所  
（令和4年度実施分）  
砂防関係施設の整備数 1施設  
（令和4年度完成分）  
※施工中 3施設

立地適正化計画における防災指針の作成



0市町村  
（令和4年12月末時点）

避難のためのハザード情報の整備



洪水浸水想定区域 79河川  
（令和4年9月末時点）  
※一部、令和4年3月末時点  
内水浸水想定区域 0団体  
（令和4年9月末時点）

高齢者等避難の実効性の確保



避難確保計画 洪水 958施設  
土砂 299施設  
（令和4年9月末時点）  
個別避難計画 3市町村  
（令和4年1月1日時点）

## 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

河道掘削（五入道川）（福山市）  
有地川の支川の河道掘削を行い、流下能力を向上させる。



古市排水ポンプ場3号ポンプ増設（広島県）

H30.7豪雨において、浸水被害のあった福山市神辺町周辺の天王前川の増水に対応するため、ポンプ増設を行い、排水能力を向上。




## 被害対象を減少させるための対策

止水板設置補助（福山市全域・府中市全域）  
住宅嵩上げ補助（府中市全域）

大雨による浸水被害を軽減するため、建築物内部に水が浸入することを防ぐ止水板の設置や住宅等の嵩上げ工事等を行う際に費用の一部を補助する制度を創設。



【止水板の設置例】



【嵩上げ工事のイメージ】

## 被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策

防災教育や防災知識の普及

命を守る優先した避難行動を促すための地区ごとのマイ・タイムライン作成の講習会や災害に対する心構えと避難に関する知識を養うための防災研修会を実施。

マイ・タイムライン作成講習会（府中市）



防災研修会（世羅町 伊尾・小谷地区）



芦田川流域の浸水対策に掛かる工程表

※グレー着色は完了箇所

区域	水系	本川・支川・水路・施設等		学区	町名	事業主体	対策内容	参考資料-2 記載番号※	予定工程			備考
		広島県管理	福山市・改良区管理						短期	中期	中長期	
芦田川・高屋川(国)	芦田川	-	-	-	-	国交省	樹木伐採・河道内掘削・堤防浸透対策	-	下流の掘削 浸透対策	中上流の掘削 浸透対策		(国交省の河川整備計画にも記載) 2021年6月末 樹木伐採約41万㎡・土砂搬去6万m3
芦田川中流域	砂川	砂川		旭	中須	府中市	排水機場整備		排水機場整備			中須排水区(新設)
	服部川	服部川		駅家	駅家	広島県	堤防浸透対策	2	浸透対策			対策検討結果及び他の対策箇所の完成状況などを踏まえ浸透対策を実施
				駅家西, 駅家東, 服部	駅家	広島県 福山市	総合的な治水対策の検討	-	事業検討			対策検討結果及び他の対策箇所の完成状況などを踏まえ事業着手を検討
			助元川	服部	駅家	福山市	河道掘削	3	河道掘削			2022年度完了
	西谷川	西谷川		宜山	駅家	広島県	河道掘削	6	河道掘削			
			大橋排水機場	宜山	駅家	福山市 土地改良区	排水機場整備	8	排水機場整備			ポンプオーバーホール(1号)(2号)2020年度完了
	有地川	有地川				広島県	河道掘削		河道掘削			
			五入道川	福相	芦田	福山市	河道掘削	12	河道掘削			2022年度完了
			掛上樋門	宜山	駅家	福山市	排水機場整備	13	排水機場整備			排水機場整備 2020年度完了
	神谷川	神谷川		新市, 綱引, 常金丸	新市	広島県	河道掘削	20	河道掘削			
			ため池(別所池)	新市	新市	福山市	雨水貯留施設整備 (流出抑制型)	21	雨水貯留施設整備			
	山田川	-	山田川	新市	新市	広島県 福山市	合流部の改善検討	26	改善検討			検討結果を踏まえた対策の実施 2021年度完了
			相方川	新市	新市	福山市	河川整備	27	河川整備			2020年度完了
	御調川	御調川				広島県	河道掘削・護岸整備		河道掘削・護岸整備			
芦田川	(上記を除く)	戸手ポンプ場	戸手	新市	福山市	福山市	排水機場整備	28	排水機場整備			ポンプ増設 2022年度完了
		出水1号雨水幹線	戸手	新市	福山市	福山市	水路改修	29	水路改修			2021年度完了
		山口谷樋門	宜山	駅家	福山市	福山市	ポンプ用排水管	30	排水管設置			ポンプ用排水管設置 排水機場整備と併せて実施中
		山口谷樋門	宜山	駅家	福山市	福山市	排水機場整備	31	排水機場整備			排水機場整備
		神谷川道路排水ポンプ	新市	新市	福山市	福山市	道路排水ポンプ更新・移設	33	ポンプ更新			道路排水ポンプの制御機体の移設 2019年度完了 道路排水ポンプの更新 2021年度完了
		国道486号 地下道排水ポンプ	戸手	新市, 芦田	福山市	福山市	道路排水ポンプ更新	153	ポンプ更新			道路排水ポンプの更新
		潜水橋	御幸, 宜山, 福相, 駅家西, 新市	御幸, 駅家, 新市	福山市	福山市	潜水橋の復旧・廃止	34	潜水橋の復旧・廃止			被災潜水橋の復旧検討結果を踏まえた対策の実施 暫定復旧, 廃止
		水路		駅家, 外	福山市	福山市	水路掘削	166	水路掘削			
芦田川上流域	芦田川	-			世羅町 西大田地区	広島県	ほ場整備	-	ほ場整備			
	御調川	御調川			尾道市 御調河内 第2地区	広島県	ほ場整備	-	ほ場整備			
高屋川流域	吉野川	吉野川		御幸, 駅家, 駅家東	駅家, 御幸	国交省 広島県 福山市	総合的な治水対策の検討	-	事業検討			対策検討結果及び他の対策箇所の完成状況などを踏まえ事業着手を検討
				御幸, 駅家	駅家, 御幸	広島県	堤防浸透対策	36	浸透対策			対策検討結果及び他の対策箇所の完成状況などを踏まえ浸透対策を実施
		水路	御幸	御幸	福山市	福山市	排水機場整備	37	調査・設計等	排水機場整備		森林ポンプ場及び森林1号雨水幹線整備
	新川(神辺)	新川(神辺)		神辺	神辺	国交省 広島県 福山市	総合的な治水対策の検討	-	事業検討			対策検討結果及び他の対策箇所の完成状況などを踏まえ事業着手を検討
			川南排水機場	神辺	神辺	神辺町 土地改良区	排水機場整備	40	排水機場整備			1号ポンプオーバーホール 2020年度完了
			川南排水機場	神辺	神辺	神辺町 土地改良区	排水機場整備	41	排水機場整備			2号ポンプオーバーホール 2021年度完了
			川南排水機場	神辺	神辺	神辺町 土地改良区	排水機場整備	43	排水機場整備			2号エンジン更新 2020年度完了
			ため池(豊田池)	神辺	神辺	福山市	雨水貯留施設整備 (流出抑制型)	44-1	雨水貯留施設整備			2021年度完了
			ため池(丙里池)	神辺	神辺	福山市	雨水貯留施設整備 (流出抑制型)	44-2	雨水貯留施設整備			2022年度完了
			ため池(平田池)	神辺	神辺	福山市	雨水貯留施設整備 (流出抑制型)	44-3	雨水貯留施設整備			2022年度完了
	加茂川	加茂川		加茂, 御幸, 道上	加茂, 御幸, 神辺	広島県	河道掘削	45	河道掘削			
	六反田川	六反田川		御幸, 神辺, 道上, 湯田	御幸, 神辺	国交省 広島県 福山市	総合的な治水対策の検討	-	事業検討			対策検討結果及び他の対策箇所の完成状況などを踏まえ事業着手を検討
			ため池(珠池)	道上, 湯田	神辺	福山市	雨水貯留施設整備 (流出抑制型)	52-1	雨水貯留施設整備			2020年度完了
			ため池(正藤池)	道上, 湯田	神辺	福山市	雨水貯留施設整備 (流出抑制型)	52-2	雨水貯留施設整備			2021年度完了
			ため池(才池)	道上, 湯田	神辺	福山市	雨水貯留施設整備 (流出抑制型)	52-3	雨水貯留施設整備			2022年度完了
			ため池(弘殿池)	道上, 湯田	神辺	福山市	雨水貯留施設整備 (流出抑制型)	52-4	雨水貯留施設整備			
			二ノ丁水路	道上	神辺	福山市	水路改修	53-1	水路改修			2020年度完了
			正藤池	道上	神辺	福山市	水路改修	53-3	水路改修			2020年度完了

芦田川流域の浸水対策に掛かる工程表

※グレー着色は完了箇所

区域	水系	本川・支川・水路・施設等		学区	町名	事業主体	対策内容	参考資料-2 記載番号※	予定工程			備考	
		広島県管理	福山市・改良区管理						短期	中期	中長期		
高屋川流域	天王前川	古市排水ポンプ場		神辺	神辺	広島県	排水機場整備(床上浸水対策)	55	排水機場整備			(広島県の河川整備計画にも記載) 排水機場増設(2.4m/s)、建屋防水対策 ポンプ増設工事継続	
	竹田川	竹田川	沼川	竹尋	神辺	福山市	排水機場整備 ポンプ増設	57	排水機場整備			八尋排水機場(併設)	
	高屋川	高屋川	水路	御野	神辺	福山市	排水機場整備 ポンプ増設	60	排水機場整備			下御領地区(新設)	
	(上記を除く)	井溝用水路	御幸排水機場	御幸	御幸	福山市	排水機場整備	61	排水機場整備			ポンプオーバーホール (No.1) 2019年度完了 (No.2) 2020年度完了	
			小山排水機場	御幸	御幸	福山市 土地改良区	排水機場整備	63	排水機場整備			ポンプオーバーホール・エンジン更新 (No.1) 2020年度完了 (No.2) 2020年度完了	
			千田ポンプ場	千田	御幸	福山市	排水機場整備	65	調査・設計等	排水機場整備		ポンプ増設	
高屋川流域	高屋川		水路	道上, 湯田, 神辺, 御野	神辺	福山市	内水排除対策検討	68				福山市流域圏連公共下水道事業計画変更外業務 調査概略設計 22年度実施概略設計 23年度事業計画確定及び公共下水道事業計画 案変更予定	
	(上記を除く)		水路	道上, 湯田, 神辺, 御野	神辺	福山市	浸水対策検討 (排水機場整備)	69	調査・設計等	排水機場整備		上記公共下水道事業計画変更に伴う浸水対策検討	
			水路	湯田	神辺	福山市	排水機場整備 ポンプ増設	70	排水機場整備			川北排水機場(併設)	
				牧谷道路排水ポンプ	御幸	御幸	福山市	道路排水ポンプ更新・移設	73	ポンプ更新			道路排水ポンプの制御盤の移設 2019年度完了 道路排水ポンプの更新 2021年度完了
			平成大橋東 地下道排水ポンプ	加茂	加茂	福山市	道路排水ポンプ更新	157	ポンプ更新			道路排水ポンプの更新	
			第2溝藤ポンプ	神辺	神辺	福山市	道路排水ポンプ更新	158	ポンプ更新			道路排水ポンプの更新	
			水路		神辺	福山市	水路掘削	167	水路掘削				
瀬戸川流域	瀬戸川	瀬戸川		西, 光, 瀬戸, 津之郷	佐波外	広島県	河道掘削	77	河道掘削			(広島県の河川整備計画にも記載)	
				西, 光	佐波, 草戸	広島県	河川改修	78	河川改修			(広島県の河川整備計画にも記載) 延長L=700m	
			水路	西	佐波	福山市	排水機場整備	79	調査・設計等	排水機場整備		ポンプゲート新設	
			水路	津之郷	津之郷	福山市	排水機場整備	80	調査・設計等	排水機場整備		ポンプゲート新設 小森・谷尻	
			水路	光	草戸	福山市	排水機場整備	81	排水機場整備			ポンプゲート新設 上ノ丁	
			水路	津之郷	津之郷	福山市	排水機場整備	84-2	調査・設計等	排水機場整備		排水機場整備(津之郷町・佐波町)	
				志田原川	瀬戸	瀬戸	福山市	河道掘削	85	河道掘削			2020年度完了
				光林寺川		熊野	福山市	河道掘削	159	河道掘削			2020年度完了
				水路		瀬戸, 外	福山市	河道掘削・修繕	160	河道掘削・修繕			
				ため池(稗田池)	瀬戸	瀬戸	福山市	雨水貯留施設整備 (流出抑制型)	86-1	雨水貯留施設整備			
				ため池	瀬戸	瀬戸	福山市	雨水貯留施設整備 (流出抑制型)	86-2	雨水貯留施設整備			
				津之郷道路排水ポンプ	西	津之郷	福山市	道路排水ポンプ更新・移設	87	ポンプ更新			道路排水ポンプの制御盤の移設 2019年度完了 道路排水ポンプの更新 2020年度完了
			福川		西, 山手, 泉	神島, 山手, 郷分	国交省 広島県 福山市	総合的な治水対策の検討	-	事業検討			対策検討結果及び他の対策箇所の完成状況などを踏まえ 事業着手を検討
					西	神島	広島県	排水機場整備	88	排水機場整備			(広島県の河川整備計画にも記載) 排水能力9.0m <sup>3</sup> /s 福川排水機場(仮称)
				西, 山手, 泉	神島, 山手, 郷分	広島県	河道掘削	90	河道掘削				
			水路	山手, 泉	山手, 郷分	福山市	内水排除対策検討	91	対策検討	内水排除対策		調査・基本計画中	
			ため池(南光池)	泉	山手	福山市	雨水貯留施設整備 (流出抑制型)	92	雨水貯留施設整備			2022年度完了	
			第一佐波排水機場	西	神島	福山市 土地改良区	排水機場整備	96	排水機場整備			エンジン更新ほか (No.1) (No.2) (除塵機) 2020年度完了	
			山手道路排水ポンプ	山手	神島	福山市	道路排水ポンプ更新・移設	97	ポンプ更新			道路排水ポンプの制御盤の移設 2019年度完了 道路排水ポンプの更新 2021年度完了	
			猪之子川	水路		瀬戸	福山市	排水機場整備	161	排水機場整備			
			河手川	水路	赤坂	赤坂	福山市	水路改修	104	水路改修			赤坂駅前
			青木川	水路	赤坂	赤坂	福山市	河道掘削	105	河道掘削			2020年度完了
			安井川	水路	赤坂	赤坂	福山市	河道掘削	106	河道掘削			2020年度完了
共通						国交省	防災ステーション整備		整備検討	防災ステーション整備			
						福山市 府中市	浸水対策補助制度の検討・創設					止水板設置補助2019年度から28年度までの10年を予定 (福山市) 止水板設置補助・住宅業工事等補助制度を2022年創設 (府中市)	
						広島県	森林整備事業(植栽, 保育, 間伐等)						
						広島県	治山事業(治山施設整備等)						
						広島県	砂防堰堤等の整備			砂防堰堤等の整備		砂防堰堤等の整備 (2021年度から2025年度までの対策は広島県の整備計 画「Qろしほ砂防アクションプラン2021」に記載) 参考資料「実施箇所一覧」参照	
						林野庁	森林整備(造林, 下刈, 除伐, 林道整備)			森林整備		計画期間 H29年度~R3年度 R4年度~R9年度	
						森林整備 センター	水源林造成事業: 除間伐等の適切な森林施策を推進						

※参考資料-2記載番号は「福山市域における浸水対策のとりまとめ」の位置図の番号を引用。
